

---

2023년 4분기 도지사 공약사업 추진상황 점검결과  
[ 2022. 7월 ~ 2023. 12월 ]

---

# 목 차

I. 공약사업 개요 .....	1
II. 추진상황 점검결과 .....	2
III. 분야별 추진상황 .....	3
IV. 사업추진 현황 .....	10
□ 이행완료(6개 사업) .....	10
□ 이행 후 계속추진(30개 사업) .....	11
□ 정상추진(88개 사업) .....	18
V. 향후 관리계획 .....	33


# I 공약사업 개요

## □ 사업 개요

- (대상사업) 5개 분야 124개 사업
  - (신규여부) 신규 95, 계속 29
  - (사업기간) 임기내 74, 임기후 계속 50
  - (재정투자) 예산 99, 비예산 25



- (총사업비) 16조 295억원(국비 91,030, 도비 11,201, 시군비 11,920, 기타 46,144)
  - (시기별) 기투자 1조 8,584억원(11.6%) / 임기내 8조 9,410억원(55.8%) / 임기후 5조 2,301억원(32.6%)
  - (재원별) 국비 56.8%, 도비 7.0%, 시군비 7.4%, 민자(기타) 28.8%

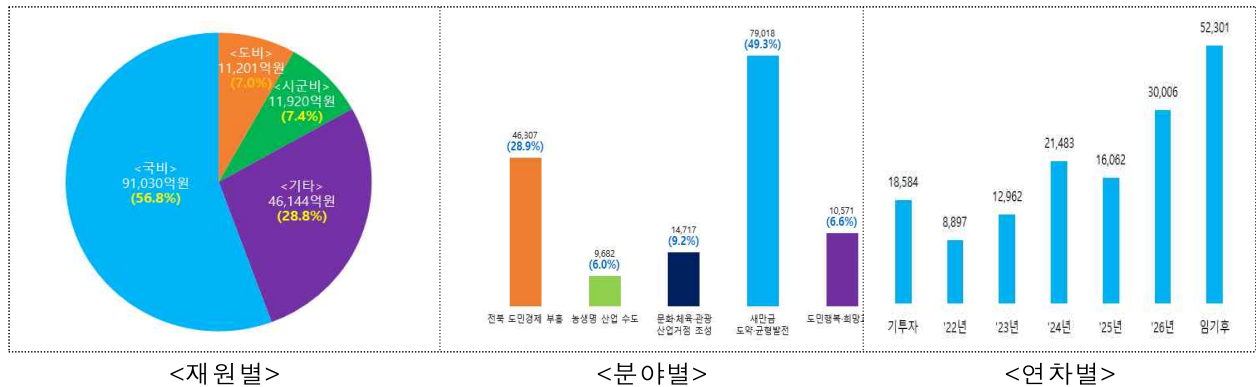

## □ 자원투자 계획

(단위 : 건, 억원)

구분	사업수			사업비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	기타
<b>합 계</b>	<b>124</b>	<b>99</b>	<b>25</b>	160,294.91	91,030.19	11,200.31	11,920.08	46,144.33
I. 전북 도민경제 부흥	23	19	4	46,306.54	11,635.87	2,955.14	2,957.90	28,757.63
II. 농생명 산업 수도	19	18	1	9,681.6	5,528	1,807.69	1,583.31	762.6
III. 문화·체육·관광 산업거점 조성	20	18	2	14,717.27	5,462.42	4,160.52	3,787.93	1,306.4
IV. 새만금 도약·균형발전	28	14	14	79,018	63,434	117.8	148.5	15,317.7
V. 도민행복·희망교육	34	30	4	10,571.5	4,969.9	2,159.16	3,442.44	0

## II 추진상황 점검결과

### □ 점검 개요

- (점검기준) 2023. 12월말 기준
- (점검대상) 5개 분야 124개 사업
- (점검근거) 전라북도지사 공약사항 관리조례 제10조(자체평가)
- (점검내용) 사업별 추진실적 및 공약 이행도, 도민소통 실적 등

< 공약 이행도 판단 기준(한국매니페스토실천본부 평가기준 준용) >

이행완료	◇ 공약이행이 완료되어 종료된 사업
이행 후 계속추진	◇ 공약(목표) 이행완료 후 추가목표를 세워 추진 중인 사업 ◇ 공약(목표) 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업
정상추진	◇ 내용이 정상적으로 추진 중이고, 임기종료 시점까지 완료가 예상되는 사업
일부추진	◇ 추진하고 있으나, 예상목표를 달성하지 못하고 있는 사업

(완료 세부기준) 입법 관련 공약 : 법, 조례 통과, 재정관련 공약 : 재정 확보

- 조성사업(산업단지 등) : 입법 및 재정확보 후 사업 개시 / - 건설사업(SOC 도로건설 등) : 입법 및 재정확보 후 사업 개시
- 시설유치 사업 : 입법 및 행정결정 등 완료 시 / - 자본유치 사업 : 양해각서에 그치지 않고 자본유입이 시작되었을 경우
- 건립 공약 : 완공되었을 경우(착공은 정상추진으로 분류) / - 재건축, 재개발 사업 : 입주가 시작되었을 경우(착공은 정상추진으로 분류)

### □ 점검 결과

- (이행률\*) 29%
  - 이행완료 6개, 이행 후 계속추진 30개, 정상추진 88개

계	달성		추진중	
	이행완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진
124	6	30	88	0

\* 이행률 = [(이행완료 공약수 + 이행 후 계속추진 공약수) / 전체 공약수] × 100


- (분야별 사업 이행상황)

분야별	사업비 (억원)	사업수 (개)	이행(추진)상황			
			이행완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진
5개 분야	160,294.91	124	6	30	88	0
I. 전북 도민경제 부흥	46,306.54	23	2	5	16	
II. 농생명 산업 수도	9,681.6	19		8	11	
III. 문화·체육·관광 산업거점 조성	14,717.27	20		2	18	
IV. 새만금 도약·균형발전	79,018	28	2	3	23	
V. 도민행복·희망교육	10,571.5	34	2	12	20	


### Ⅲ 분야별 추진상황

#### □ 연도별 이행률

< 구분 >	< '22 4분기 >	< '23 1분기 >	< '23 2분기 >	< '23 3분기 >	< '23 4분기 >
<b>이행률</b>	<b>0.8%</b>	<b>11.3%</b>	<b>15.3%</b>	<b>18%</b>	<b>29%</b>
이행완료	-	-	4개 사업	4개 사업	6개 사업
이행 후 계속추진	1개 사업	14개 사업	15개 사업	18개 사업	30개 사업
정상추진	122개 사업	108개 사업	103개 사업	100개 사업	88개 사업
일부추진	1개 사업	2개 사업	2개 사업	2개 사업	-

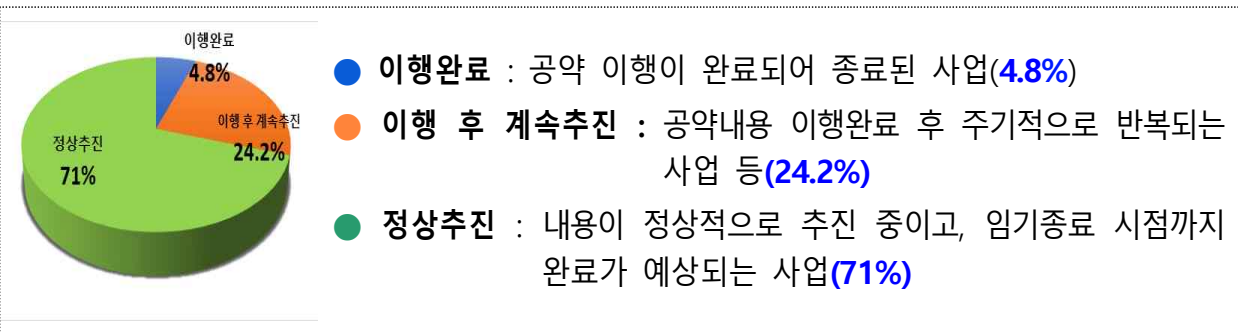

- (전북 도민경제 부흥) ① 대기업 계열사 5개 유치(두산, LG 화학, GEM 코리아, LSLnF, 삼성) ② 현대중공업 군산조선소 재가동('23.2.) ③ 수소 특화 국가산업단지 최종 후보지 선정('23.3.) ④ RIS(지자체-대학 협력기반 지역혁신사업) 신규지역 최종 선정('23.3.) ⑤ 탄소소재의료기기 개발지원 센터 개소('23.4.) ⑥ 새만금 신재생에너지산업 전문인력양성센터 준공('23.5.) 등 역동적인 전북 산업생태계 조성

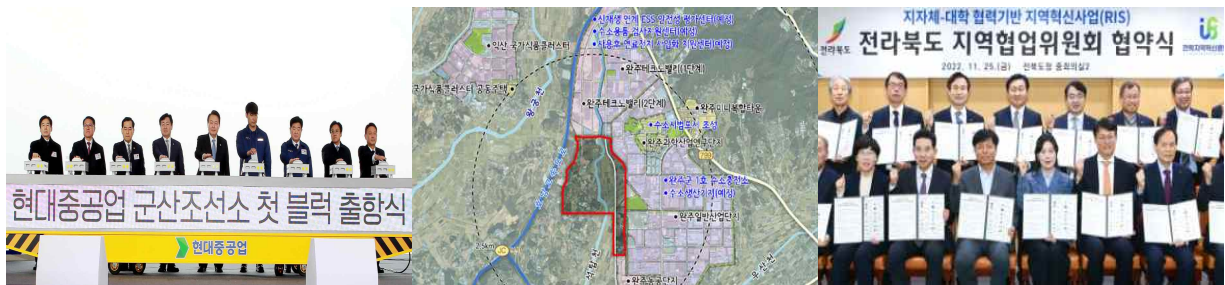

< 군산조선소 첫 블록 출항식 >

< 수소 특화 국가산업단지 최종 후보지 선정 >

< RIS 신규지역 최종 선정 >

- (농생명 산업 수도) ① 지역특화 임대형 스마트팜 및 농업스타트업 단지 공모 선정(김제, '23.1.) ② GMP기반 농축산용 미생물산업화 지원시설 구축(정읍, '22.~'24.) ③ 동물용 의약품 효능·안전성 평가센터

착공(익산, '22.~'23.) ④ 국가식품클러스터 2단계 국가첨단산업 후보지 선정('23.3.) 등 농생명 산업 수도로서의 전북 위상 강화



< GMP기반 농축산용 미생물산업화지원시설 >



< 동물용의약품 효능·안전성 평가센터 착공 >



< 국가식품클러스터 2단계 국가첨단산업 후보지 선정 >

- (문화·체육·관광 산업거점 조성) ① 문체부 '웰니스·의료관광 융복합 클러스터'('23.2.) 및 '콘텐츠원캠퍼스 구성운영 지원사업' 공모 선정('23.2.) ② 문체부 '가고 싶은 K관광 섬 육성사업' 선정('23.4.) ③ 완주군 종합 스포츠타운 족구장, 농구장, 풋살장 준공('23.6.) ④ 전주 월드컵 스포츠타운 육상경기장, 야구장 착공('23.6.) ⑤ '23년 국민체육센터(장애인형) 추가 공모 선정 2개소('23.4.) 등 문화·체육 인프라 확충 및 휴양·치유관광 등으로 사람과 자본(돈)이 모이는 거점 조성



< 웰니스·의료관광 융복합 클러스터 공모사업 선정 >




< 콘텐츠원캠퍼스 공모사업 선정 >



< 전주 월드컵 스포츠타운 육상경기장, 야구장 착공 >

- (새만금 도약·균형발전) ① 새만금 자율운송 상용차 실증지원 인프라 및 통합관제시스템 설계 착수('23.1.) ② 거점형 마리나 선정, 마리나항만 수정계획 용역 발주('23.2.) ③ 「전북특별자치도 설치 등에 관한 특별법」 제정안('22.12.) 및 「전북특별자치도 설치 및 글로벌 생명경제도시 조성을 위한 특별법」 전부개정안 국회 본회의 통과('23.12.)로 명실상부한 전북 특별자치도 출범 기반 마련 ④ 새만금 국제투자진흥지구 지정('23.6.28.) 등 새만금을 미래 신산업 중심지로 조성

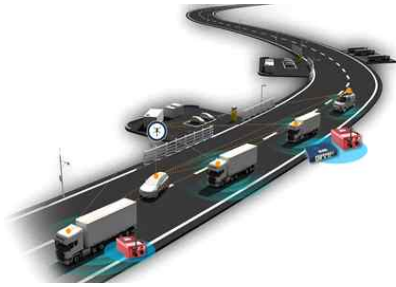

< 새만금 자율운송 상용차  
실증지원 인프라 >



< 전북특별자치도 설치 등에 관한  
특별법 통과 >



< 새만금 투자진흥지구 지정 >

- (도민행복·희망교육) ① 청소년스마트체험 활성화를 위한 협업체계 구축(23.7.18.) ② 공공산후조리원 건립 부지 매입 완료(23.4.) 및 조례 제정(23.5.) ③ 서해안 유네스코 세계지질공원 인증 확정(23.5.) 및 인증서 수령(23.9.) ④ 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE) 시범지역 선정(23.3.) 및 글로벌대학30 선정(23.11.)으로 글로벌대학 중심의 지역대학 공동혁신 기반 마련 등 도민이 행복한 전라북도 조성



< RIS 미래수송기기 사업단 >



< 서해안 유네스코 세계지질공원  
최종 인증 >



< 공공산후조리원 건립 >

## □ 예산확보 현황

- (총괄) 총액 대비 32.4%, 임기내 대비 48.1%, '24년 계획 대비 57.7% 확보  
(단위 : 억원, %)

재정계획			확보액				반영률		
총액 (a)	임기내 (b)	임기후 (c)	계 (d=e+g)	~'23년 (e)	'24년		총액 대비 (d/a)	임기내 대 비 (d/b)	'24년 대비 (g/f)
					계획(f)	확보(g)			
160,295	107,994	52,301	51,984	39,573	21,483	12,411	32.4	48.1	57.7

※ '23년 확보액 : 12,429억원(계획12,962억원 / 계획대비 95.8% 확보)

- ('24년) 분야별 확보 현황

- '24년도 필요예산은 2조 1,483억원으로 현재 확보액은 1조 2,411억을 확보하여 계획 대비 확보율 57.7%로 사업추진 예정임.

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	'24년 필요액	'24년 확보액					확보율 (%)
			계	국비	도비	시군비	기타	
합 계	160,294.91	21,483	12,411	5,885	2,010	1,754	2,762	57.7
I. 전북 도민경제 부흥	46,306.54	5,993	1,940	805	407	435	293	32.4
II. 농생명 산업 수도	9,681.60	1,308	884	176	309	220	179	67.6
III 문화체육관광 산업거점 조성	14,717.27	2,707	1,761	541	800	420	0	65.0
IV. 새만금 도약·균형발전	79,018	9,066	5,872	3,518	35	29	2,290	64.8
V. 도민행복·희망교육	10,571.5	2,409	1,954	845	459	650	0	81.1

## □ 도민소통 실적

- 도민소통 및 사업 추진을 위한 거버넌스 구축·운영 실적 705건

- '23 신재생에너지 박람회('23.9.), 도내 국제복합금융센터 건립 관련 투자 간담회('23.10.), 디지털헬스케어 시범사업 간담회('23.10.), 청소년 가족대상 치유농장 체험 운영('23.10.), 전라북도 체육진흥협의회 개최('23.11.), 완주 로컬푸드 참여농가 교육 및 간담회('23.12.) 등

(단위 : 건)

구 분	사업수	유형별 실적							
		합계	설명회, 토론회 등	만족도 조사	전문가 자문	언론/방송 보도	간담회	보고서 발간	기타
합 계	124	705	106	17	88	154	202	4	134
I. 전북 도민경제 부흥	23	166	24	6	14	42	56		24
II. 농생명 산업 수도	19	143	22		21	31	33		36
III. 문화·체육·관광 산업거점 조성	20	96	9	4	15	11	20	3	34
IV. 새만금 도약·균형발전	28	127	44	1	29	25	19		9
V. 도민행복·희망교육	34	173	7	6	9	45	74	1	31

## □ 예비타당성조사 대상사업 추진 현황(총 13개 사업)

예타 통과 0

신청준비·완료 3

기획 단계 10

관리번호	공약사업	예타대응 계획	비고
7	특수목적선 선진화단지 조성	◦ 항만기본계획 변경 및 예타대상 사업 선정 등 국가재정사업 반영 추진을 위한 활동 전개	기획단계
18	그린수소 생산클러스터 구축	◦ 예타대상사업 선정('21.8월) ◦ 예타 철회('23.11월) ◦ 재예타 사업기획('24년) 및 예타대상사업 신청('25년)	신청준비
19	수소특화 국가산업단지 조성	◦ 제안서 제출('22.10월) ◦ 국가산단업지 후보지 선정('23.3.15.) ◦ 사업시행자 선정('23.4.28.), ◦ 국가산단 성공추진 상생협약 체결('23.7.5.)	신청준비
26	국가식품클러스터 2단계 확장	◦ 1단계 성과분석 및 2단계 타당성 연구용역 및 검토('23.~'24) ◦ 예비타당성 신청 및 건의 활동 전개('25.~)	기획단계
44	국립해양문화시설 건립 기본구상	◦ 기본계획수립 및 타당성조사 연구용역 추진 중 ('23.4.~12., 해양수산부)	기획단계
73	새만금 남북3축 도로 건설	◦ 사전타당성 조사용역 시행 및 예타대상 선정을 위해 지속 건의	기획단계
83	국도13호선 위험구간(장수~천천) 개선	◦ 제6차 국도·국지도 건설계획('26.~'30) 반영 건의활동 전개 - 제6차 국도·국지도 건설계획 수요조사 제출('23.4.)	기획단계
86	전라선 고속화 추진	◦ 사전타당성조사 완료 후 예비타당성조사 대상사업 건의	기획단계
87	전주~김천간 동서횡단 철도 건설	◦ 사전타당성조사 완료 후 예비타당성조사 대상사업 건의	기획단계
88	국가식품클러스터 산업선 국가계획 반영	◦ 제5차 국가철도망 구축계획('26.~'35) 반영 건의활동 전개 - 전북권 철도망 구축계획 수립 용역 착수('23.6.)	기획단계
90	전주~대구간 고속도로 건설	◦ 무주~성주 구간 사전타당성 조사용역 추진 건의('23년)	기획단계
109	한국정원산업지원센터 조성 적극 지원	◦ 산림청 예비타당성 대상사업 선정을 위한 건의활동 전개	기획단계
114	산림치유 인프라(지덕권 친환경 산림고원 조성) 확충	◦ '24년 타당성용역비 국비 5억원 확보를 위한 건의활동 전개 - '24년 타당성용역비 국비 4억원 확보('23.9.)	기획단계

## □ 제도개선 추진 실적(총 17개 사업)

제도개선 완료 7(법률 2, 조례 5)

법률 제·개정 추진·준비중 10(법률 7, 조례 3)

관리 번호	공약사업	제도개선사항 추진상황 및 계획	비고
13	새만금 SK데이터센터 조속 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 새만금사업법 개정('22.12.8.)</li> <li>▣ 공유수면 점용료·사용료 면제감면 대통령령으로 개정 필요</li> </ul>	법률 개정
43	해양치유 거점단지 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 「전라북도 해양치유자원 관리 및 활용에 관한 조례」 제정 - 해양치유자원의 관리와 필요한 사항을 규정함으로써 치유산업 활성화</li> <li>▣ 조례 제정 완료('23.3.)</li> </ul>	조례 제정
46	지리산권 관광특구단지 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 지리산권 특별자치단체 설치 조례 제정('25년)</li> <li>▣ 5개 지자체(남원,구례,산청,함양,하동) 업무협약('22.12.)</li> </ul>	조례 제정
60	국제 태권도 사관학교 설립	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 태권도 진흥 및 태권도공원 조성등에 관한 법률 개정(24년 예정)</li> </ul>	법률 개정
63	새만금 국제투자진흥지구 지정	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 새만금사업법, 조세특례제한법 개정('22.12.8.,12.23.)</li> <li>◦ 새만금사업법 시행령 개정 및 시행('23.6.28.)</li> </ul>	법률 개정
66	국제학교 유치	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 내국인 입학제한이 없는 새만금 국제학교 설립을 위한 새만금사업법 개정(안) 제출('23. 2월) 및 전북특별자치도 특례조항 발굴('23. 2월~3월)</li> <li>◦ 국제학교 관련 토론회 개최('23.2.24., 3.15.)</li> <li>◦ 유관기관(도교육청, 전북연, 새만금개발청공사, 부안군) 업무협약(5회)</li> <li>◦ 국제학교 특례조항 관련 부처 협의(교육부/4회)</li> <li>▣ 새만금사업법 개정 및 전북특별자치도 특별법 제정을 위한 입법대응 추진</li> </ul>	법률 개정
74	전북특별자치도 설치	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 전북특별자치도 설치 등에 관한 특별법 제정</li> <li>▣ (발의) 안호영('22.4.12.), 한병도, 정운천('22.8.18.) (본회의 통과) '22.12.29.</li> <li>◦ 전북특별자치도법 전부개정안 국회 본회의 통과('23.12.)</li> </ul>	법률 제정
75	완주·전주 상생 협력추진 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 통합시법 제정('25년)</li> </ul>	법률 제정
96	글로벌 청소년 인재 양성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 「글로벌 청소년 리더센터 운영 관리 조례」 제정 예정('24.5.)</li> <li>▣ 글로벌 청소년 리더센터 운영 근거 마련</li> </ul>	조례 제정

관리 번호	공약사업	제도개선사항 추진상황 및 계획	비고
97	신혼부부·청년 임대주택 임대보증금 지원	◦「전라북도 저소득계층과 청년 및 신혼부부 주거 지원 조례」 개정 ▣ 조례 공포·시행('23.3.3.)	조례 개정
99	1인 가구 주거 안전 방문 지키미 사업	◦「전라북도 1인가구 지원 조례」 제정('22.11.) ▣ 1인가구 주거 안전 방문지킴이 지원사업 추진('23년~)	조례 제정
100	전라북도 일·생활 균형 지원	◦ 전라북도 일·생활 균형 지원에 관한 조례 제정 ▣ 공포 및 시행('23.10.4. 시행)	조례 제정
105	다문화가정 원스톱 지원 서비스 고도화	◦ 전라북도 영유아보육조례 개정('24년)	조례 제정
119	국립공공보건의료대학원 설립	◦ 국립의학전문대학원법 제정('24년) ▣ 국회 상임위 전체회의 통과('23.12.)	법률 제정
120	디지털 헬스케어 시범사업 추진	◦「디지털 헬스케어 진흥 및 보건의료데이터 활용 촉진에 관한 법률」 제정 - 디지털 헬스케어 사업 추진 및 활성화를 근거 마련 ▣ 발의('22.10.)	법률 제·개정
122	공공산후조리원 건립	◦ 전라북도 공공산후조리원 설치운영 등에 관한 조례 제정 완료('23.5.8) ▣ 공공산후조리원 건립 추진('24년~)	조례 제정
124	지역발전 생태계 조성을 위한 지역대학 경쟁력 제고	◦ 고등교육위원회 구성을 위한 지방대육성법 개정('23년) ▣ 준비중	법률 개정

# IV

## 사업추진 현황

### □ 이행완료 : 6개

관리번호	사업명	공약목표 및 추진상황
2	대기업 계열사 유치 추진 전담조직 구성 및 거버넌스 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 기업유치 전담조직 구성 및 거버넌스 구축</li> <li>▣ 도지사 직속으로 전문조직(기업유치, 기업지원, 애로해소) 구성·운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1사 1공무원 담당제 추진</li> </ul> </li> <li>▣ 기업유치 관련 위원회(11개) 활용계획 수립 및 전문가 세미나 개최</li> </ul>
8	현대중공업 군산조선소 재가동	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 현대중공업 군산조선소 재가동('23년)</li> <li>▣ 군산조선소 사내협력사 선정(13업체), 사내협력사 직원 모집('22.7~11), 군산조선소 재가동 선포식('22.10.28.)</li> <li>▣ 군산조선소 본격 가동으로 생산된 블록 출항식('23.2.10.)</li> </ul>
63	새만금 국제투자진흥지구 지정	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 글로벌 기업유치 등을 위한 인센티브 마련 등 국제투자 진흥지구 지정('26년)</li> <li>- (세제) 입주기업에 법인·소득세 등 감면</li> <li>- (입지) 장기임대용지 추가공급</li> <li>- (기업활동) 항만·공항 배후 산업단지 자유무역지역 지정 추진 및 규제개선</li> <li>▣ 새만금사업법, 조세특례제한법 개정('22.12.8.,12.23.)</li> <li>▣ 투자진흥지구 지정 관련 새만금사업법 시행령 개정 및 시행('23.6.28.)</li> <li>▣ 새만금투자진흥지구 지정('23.6.28.)</li> </ul>
81	익산시 구도심 도시재생사업 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 도시재생 뉴딜사업 성과평가 추진(완료 및 '23년 완료예정인 9개 사업 평가)</li> <li>◦ (목표) 익산시 중앙동 도시재생사업 완료('23년)</li> <li>- (HW) 거점시설 및 공공시설 준공</li> <li>- (SW) 창업지원 및 문화축제 등 공동체 활성화 지원</li> <li>▣ 도시재생 뉴딜사업 9개 사업 성과평가 완료('22년)</li> <li>▣ 중매서 커뮤니티라운지 및 문화주차장(1공구) 조성 등('22년 준공), 음식식품 교육문화원 조성 및 운영('23.7.~), 문화주차장(2공구) 준공('23.12.), 중앙동 도시재생사업 완료('23.12.), 거점시설 프로그램·축제 및 행사·도시재생대학 운영 추진('23년~)</li> </ul>
93	장애인 종합지원센터 건립	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 장애인종합지원센터 설치</li> <li>▣ 6개동(탈시설, 재활치료, 체험홈4) 리모델링 공사 완료('23.12.)</li> <li>▣ 운영주체 선정 및 위수탁 계약 체결('23.9.)</li> </ul>
108	전북 서해안 유네스코 세계 지질공원 인증	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 전북 서해안(고창, 부안군) 유네스코 세계지질공원 인증 1개소</li> <li>▣ 유네스코 심사위원 현장실사('22.9.30.~10.3.)</li> <li>▣ 세계지질공원 이사회 인증 권고(안) 확정('22.12.7.)</li> <li>▣ 유네스코 집행이사회 인증 최종 의결('23.5.18.)</li> </ul>

## □ 이행 후 계속추진 : 30개

관리번호	사업명	공약목표 및 추진상황
1	5개 대기업 계열사 유치로 양질의 일자리 확충	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 대기업 계열사 5개 유치</li> <li>▣ 5개사 유치 : 두산, 삼성, LG화학, LS-L&amp;nF배터리솔루션, LSMnM</li> </ul>
3	지방-산업-대학 연계형 인력양성 시스템 및 지원체계 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 지자체 전북지역 혁신플랫폼(50개 기관) 구축·운영</li> <li>◦ (목표) 기업수요 맞춤형 전문인력 양성(매년 1,100명 이상)</li> <li>▣ '23년 RIS 신규지역 공모 최종 선정(국비 1,500억원 확보) RIS 실행계획 최종 제출('23.7.18), RIS 대학교육 혁신본부 및 3개 사업단 조직(8월) RIS 지역혁신 자율과제 공모 선정(239), 사업단별 기업수요 맞춤형 MOU 체결('23.10~11)</li> <li>▣ 기업수요 맞춤형 인력양성 : ('22년) 1,231명, ('23년) 1,150명</li> </ul>
4	취업경쟁력 강화를 위한 청년인턴 확대	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 취업 경쟁력 강화를 위한 청년인턴 5,000명 확대</li> <li>- ('22년) 760명, ('23년) 850명, ('24년) 950명, ('25년) 1,100명, ('26년) 1,440명</li> <li>▣ 도 대학생 직무인턴 : ('22년) 262명, ('23년) 312명</li> <li>▣ 고용노동부 국민취업지원제도 활용 : ('22년) 500명, ('23년) 570명</li> </ul>
6	청년 생활안정 기반 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 전북형 청년수당 매월 30만원, 최대 12개월 지급</li> <li>- ('22년~'23년) 2,500명 → ('23년) 사회보장협약 → ('24년~'26년) 매년 3,000명</li> <li>◦ (목표) 전북형 청년활력수당 매월 50만원, 최대 6개월 지급</li> <li>- ('23년) 사회보장협약 → ('24년~'26년) 매년 2,000명</li> <li>◦ (목표) 전북청년 함께 두배적금 매월 최대 10만원, 최대 24개월 지원</li> <li>- ('23년) 사회보장협약 → ('24년) 500명 → ('25년~'26년) 매년 1,000명</li> <li>▣ 청년수당 지원('22년 2,410명, '23년 3,000명)</li> <li>▣ 청년활력수당 지원('23년 2,000명)</li> <li>▣ 청년 함께 두배적금 지원('23년 301명)</li> </ul>
22	금융공공기관 유치 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 타깃 공공기관 선정(토론회 5회)</li> <li>▣ 전라북도 금융도시 추진위원회 출범('23.2.) 한국투자공사 이전 촉구 성명(2회/'23.3월,6월) 한국투자공사 전북 이전 법개정안 대표발의(양경숙의원, '23.5.)</li> <li>▣ 금융 공공기관 이전 네트워크 활동 및 대내외 소통(5회)</li> <li>- 공공기관 이전 공감대 확산을 위한 토론회 참여(연1회 이상)</li> <li>- 금융도시추진위원회(위원장:도지사) 회의 개최(2회 / 2월·6월)</li> <li>- 정치권, 금융권 등 한국투자공사 이전 이행 촉구 공동 성명(6월)</li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
26	국가식품클러스터 2단계 확장	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦(목표) 국가식품클러스터 2단계 확장(302만㎡) 예비타당성 조사 신청 및 선정 건의</li> <li>▣ 국가식품클러스터 성과분석 및 발전방안 연구용역비 확보(5억원) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국가식품클러스터 성과분석 및 발전방안 용역 착수보고회('23.3.)</li> <li>- 연구용역 중간보고회('23.6.)</li> </ul> </li> <li>▣ 국토부 신규 국가산단 후보지 2단계 확장 선정('23.3.)</li> <li>▣ 연구용역 관계기관 워크숍('23.5.)</li> <li>▣ 농식품부 1단계 성과분석 및 발전방안 타당성 용역 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국가식품클러스터 성과분석 및 타당성 용역 킥오프 및 착수보고회('23.3.), 중간보고회('23.6.)</li> <li>- 농식품부 2단계 확장 정책결정 및 국클 활성화 방안 도출</li> </ul> </li> <li>▣ 국토부(LH) 국가식품클러스터 2단계 사전 타당성 용역 추진 중 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2단계 사전 타당성 용역 착수보고회('23.12)</li> </ul> </li> </ul>
30	애그테크 기반 연구	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦(목표) 애그테크 기반 연구를 통한 품종 및 기술개발 : 21품종, 28기술</li> <li>▣ 첨단육종 기술 활용 품종개발('22년 2품종, '23년 신품종 4종) <ul style="list-style-type: none"> <li>- ('22년) 파프리카 2품종(「미네르바 레드」, 「미네르바 골드」)</li> <li>- ('23년) 프리지아 2품종(스윗드림, 스노우보이즈) 국화(핑크윈드) 파프리카(레이골드)</li> </ul> </li> <li>▣ 스마트 정밀농업 기술개발('22년 2건, '23년 3건) <ul style="list-style-type: none"> <li>- ('22년) 파프리카 하우스 이중차광 조건 설정, 차광에 의한 환경개선 효과</li> <li>- ('23년) 파프리카 배양액 내 병원균 정보, 농업기상재해 조기경보 활용방법, 딸기 꽃눈분화 판별 기준</li> </ul> </li> <li>▣ 환경친화 기술개발('22년 1건, '23년 3건) <ul style="list-style-type: none"> <li>- ('22년) 콩 재배시 가축분퇴비 사용 토양탄소 증대 및 수량 확보 효과</li> <li>- ('23년) 농산부산물 발생 추정량 및 바이오차 생산 잠재량, 바이오차 성분특성 정보</li> </ul> </li> </ul>
31	K-스마트팜 확대 조성 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦(목표) 시설원예 스마트팜 면적 확대(매년 12ha)</li> <li>◦(목표) 자원순환형 에너지시설 지원(매년 4ha)</li> <li>▣ ('22년) 스마트팜 시설보완(9ha), 청년창업 스마트팜(3ha), 자원순환형 스마트팜(4ha) 조성</li> <li>▣ ('23년) 스마트팜 시설보완(10ha), 청년창업 스마트팜(4ha), 자원순환형 스마트팜(5ha) 조성</li> </ul>
33	부안 친환경 스마트 농업 확산	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦(목표) 시설원예 스마트팜 4ha 조성(매년 1ha, '23년~'26년)</li> <li>▣ '22년 스마트팜 환경(ICT기자재 지원) 1ha 조성</li> <li>▣ '23년 청년창업 스마트팜 패키지 지원사업 1개소 포함 1ha 조성</li> </ul>
37	반려동물 특화단지 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦(목표) 반려동물 지원센터 조성 1개소</li> <li>◦(목표) 반려동물 동반 국민여가캠핑장 조성 1개소</li> <li>◦(목표) 반려동물 산업단지(오수제2농공단지) 조성</li> <li>▣ 반려동물 지원센터 준공('23.12.)</li> <li>▣ 반려동물 동반 국민여가캠핑장(공정률 30%)</li> <li>▣ 반려동물 산업단지 조성 완료('23.9.)</li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
38	치유농업 기반 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 치유농장·마을, 목적형 농장 조성 등 치유농업 시범사업 70개소</li> <li>◦ (목표) 치유농업 연구개발 및 보급, 교육 등 치유농업센터 구축 1개소</li> <li>◦ (목표) 치유농업 서비스 제공 및 확산 전문인력 양성 400명</li> <li>▣ 치유농장 및 마을 등 기반 확대('22년 13개소/ '23년 18개소)</li> <li>▣ 치유농업 활용 기술개발('22년 4건, '23년 10건)</li> <li>▣ 치유농업 전문인력 양성('22년 90명, '23년 86명)</li> </ul>
41	완주 로컬푸드 활성화 적극 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 완주 로컬푸드 활성화 4년간('23년~'26년) 5.2억원 투자 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 농가조직화 2,100명, 생산자-소비자 교류활동 4회</li> </ul> </li> <li>▣ 완주 로컬푸드 활성화 지원 관련 사업지침 및 세부사업계획 수립('23.3.)</li> <li>▣ 로컬푸드 통합기획생산 협의체 회의('23.5.)</li> <li>▣ 참여농가 조직화(1,800명) 및 역량강화(13회), 기획생산 직원 역량강화(5회) <ul style="list-style-type: none"> <li>홍보책자 제작(5,000부), 순회수집차량 운영(매주), 로컬푸드 통합교육(15회), 소비자 모니터링 및 정기보고회(5회), 소비자 교육 등(9회)</li> </ul> </li> </ul>
42	전북 농수산물 가공식품 플랫폼 활성화	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 온라인 유통 혁신기업 협력사례 발굴 12건('23년~'26년, 매년 3건)</li> <li>◦ (목표) 온라인 몰 '전북생생장터' 입점업체 확대 60개점('23년~'26년, 매년 15개점)</li> <li>▣ 전자상거래 및 오픈마켓, 지역 농축수산물식품생산법인 등과 협업 사례 3건 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신규채널 발굴(지마켓, 옥션, 네이버 라이브커머스) 협업, 마켓경기 협업 프로모션</li> </ul> </li> <li>▣ 입점업체 확대('23년 66개) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 축·수산 8, 가공·건강식품 31, 과일·채소 21, 쌀 3, 전통장·김치 3</li> </ul> </li> <li>▣ 매출액 189억원(전년 대비 142% 증가) 및 회원 수 25,794명(전년 대비 34% 증가) <ul style="list-style-type: none"> <li>시군 연계 기획전 진행(6회), 유관기관 협업 한가위 큰장터 운영(1회)</li> </ul> </li> </ul>
55	대학 연계 문화예술 콘텐츠 교육 플랫폼 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 대학 연계 창의적 융합(인문+공학+디자인+예술) 인재양성 및 청년 인턴십/기업 연계 일자리 지원을 위한 교육 플랫폼 구축 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 창의인재 거버넌스 구축('23년), 인재교육 500명 및 취업지원 200명('23년~'26년)</li> </ul> </li> <li>▣ 문체부 공모사업 '콘텐츠원캠퍼스 구성운영 지원사업' 선정 (국비 2.5억원, 도비 3억원 반영)</li> <li>▣ K-컬처 공유협력대학 협의체 구성 MOU(호원대, 군산대, 원광대) 체결('23.8.)</li> <li>▣ 전북 창의인재육성 산·학·관 거버넌스 구축회의 개최('23.11.28.)</li> <li>▣ 콘텐츠원캠퍼스 성과전시회·토크콘서트 개최('23.12.13.)</li> <li>▣ '23년 인재교육 197명, 취업지원 58명</li> </ul>
61	체육·스포츠 재정 대폭 확대로 전 도민 체육복지 실현	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 체육·스포츠 재정 대폭 확대 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ('22년) 100% → ('23년) 120% → ('24년) 130% → ('25년) 140% → ('26년) 150%</li> </ul> </li> <li>◦ (목표) 공공스포츠 인프라 공급 확대 : 30개소(매년 6개소)</li> <li>▣ '23년 체육·스포츠 예산 확대(체육분야 예산 1,042억원 / 131.5%)</li> <li>▣ 공공스포츠 시설 설립 완료 : '22년 7개소/'23년 6개소</li> <li>▣ '23년 국민체육센터(장애인형) 추가 선정 2개소(국비 70억원 확보)</li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
64	대규모 복합테마파크 유치 기반 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 복합테마파크 유치계획 수립</li> <li>◦ (목표) 민관추진단 구성·운영(6회)</li> <li>▣ 새만금 대규모 테마파크 유치 구상 연구 완료(전북연, '22.6. ~'23.7.)</li> <li>▣ '22년 새만금워킹그룹 관광진흥분과 회의(5회, '22.7.~12.)</li> <li>▣ 잼버리부지 활용방안 관계기관 회의('22.7.18.)</li> <li>▣ 대규모 복합테마파크 선진지 방문(2회, '22.7.~'23. 9.)</li> <li>▣ '23년 새만금워킹그룹 관광진흥분과 회의(4회, '23. 5.~9.)</li> <li>▣ 테마파크 관심투자자·투자이익 기업 면담 및 설명(2회, '23.6.2.)</li> <li>▣ 새만금 관광레저용지(테마파크 등) 투자설명회 개최('23.11.6.)</li> <li>▣ 민관지원단 구성·운영 계획 수립('23.11.23.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 민관추진단 운영비 '23년 예산(20백만원) 확보('22.12.)</li> <li>- 민관추진단 구성·운영 관련 전문가 자문(2회, '23.3.~8.)</li> </ul> </li> <li>▣ 민관지원단 운영 활성화를 위한 사전회의('23.11.24.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 민관추진단 구성·운영(안) 협의(새만금개발청, '23.9.7.)</li> </ul> </li> <li>▣ 제1회 민관지원단 회의 개최 및 위원 위촉('23.12.22.)</li> </ul>
74	전북특별자치도 설치	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) "전북특별자치도 특별법" 제정</li> <li>▣ 국회 통과('22.12.29.)</li> <li>▣ 전북특별법 1차 개정('23.) 후 전북특별법 전부개정안 마련 (232개 조문)</li> <li>▣ 전북특별법 전부개정안 국회 본회의 통과('23.12.8.) (131개 조문/333개 특례)</li> <li>▣ 전북특별자치도 종합발전 방안 용역 추진('23.3.~'24.3.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도민의식 조사, 광역단위 특례 발굴, 법률 및 제도개선 사항 마련 등</li> </ul> </li> </ul>
75	완주·전주 상생협력 추진 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 완주군과 전주시의 상생협력 추진지원 및 향후 행정통합 추진 시 통합 비전 및 전략수립 등</li> <li>▣ 전주·완주 상생협력사업 발굴 및 협약 추진(9회) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 통합 공론의 장 조성('22년 2회, '23년 7회)</li> </ul> </li> </ul>
92	장애인 공공일자리 확대	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 재활, 돌봄, 자활 관련 공공일자리 창출 1,808명 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ('22) 1,678명, ('23) 1,737명, ('24) 1,755명, ('25) 1,773명, ('26) 1,808명</li> </ul> </li> <li>▣ ('22년) 5개 분야 1,678명 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일반형 513, 복지 764, 특화형 118, 지역맞춤형 273, 최종증 10</li> </ul> </li> <li>▣ ('23년) 5개 분야 1,948명 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일반형 575, 복지 825, 특화형 136, 지역맞춤형 336, 최종증 76</li> </ul> </li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
98	어르신 맞춤형 복지 서비스 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 노인일자리 시장형사업단 초기투자비 지원(20개소)</li> <li>◦ (목표) 맞춤형 노인돌봄서비스 확대 : ('22년) 33천명 → ('26년) 37천명</li> <li>◦ (목표) 전라북도 장기요양요원 지원센터 운영 : 1개소</li> <li>▣ '23년 예산 514.5억원 확보 및 사업계획 수립추진</li> <li>▣ 노인일자리 신규 시장형사업단 지원('23년 5개소)</li> <li>▣ 맞춤형 노인돌봄서비스 제공('22년 33,000명, '23년 36,000명)</li> <li>▣ '23년 장기요양요원지원센터 운영 및 사업계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>- '23년 장기요양요원지원센터 프로그램(힐링캠프 및 교육 등) 운영(800명)</li> </ul> </li> </ul>
99	1인 가구 주거 안전 방문 자킴 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 1인가구 대상 스마트기술을 활용한 안심장비 설치 지원 3,000가구 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ('23년) 400가구, ('24년) 700가구, ('25년) 900가구, ('26년) 1,000가구</li> </ul> </li> <li>▣ 전라북도 1인가구 지원 조례 제정('22.11.)</li> <li>▣ '23년 1인가구 주거 안전 방문자킴이 지원계획 수립('23.1.) 및 주거안전 장비설치 지원(482가구)</li> <li>▣ 시군 간담회('23.1./'23.3.)</li> </ul>
100	전라북도 일·생활 균형 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 문화확산 : 조직문화개선을 위한 컨설팅 200건 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ('23년) 40건, ('24년) 50건, ('25년) 50건, ('26년) 60건</li> </ul> </li> <li>◦ (목표) 기업지원 : 일·생활균형 선도 추진 기업 지원 45개사 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ('23년) 5개사, ('24년) 12개사, ('25년) 13개사, ('26년) 15개사</li> </ul> </li> <li>▣ 일·생활 균형 지원 관련 정책연구과제 추진(전북연구원/~'23.5.)</li> <li>▣ '23년 일·생활 균형 문화확산 지원사업계획 수립('23.3.)</li> <li>▣ 일·생활 균형 우수 지자체 벤치마킹('23.4.)</li> <li>▣ '23년 조직문화개선 등 컨설팅 추진 42건</li> <li>▣ '23년 일·생활 균형 선도추진 기업 7개사 지원</li> </ul>
102	전북 복지자원 통합관리 플랫폼 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 전라북도 복지정보 및 자원 ONE-STOP 시스템 구축('23년)</li> <li>◦ (목표) 플랫폼 이용자 확대 : ('24년) 1만명 → ('25년) 2만명 → ('26년) 4만명</li> <li>◦ (목표) 복지정보 시각화대 발굴 및 지원: ('24년) 50명 → ('25년) 100명 → ('26년) 150명</li> <li>▣ 복지자원 통합관리 플랫폼 구축 타당성 및 운영방안 연구용역 추진 ('22.11.~'23.5. 전북연구원)</li> <li>▣ 플랫폼 관련 우수지역 벤치마킹(세종 등/'23.3.~4.)</li> <li>▣ 플랫폼 구축 업체 선정('23.8~11.)</li> <li>▣ 플랫폼 조기 구축 및 시범 운영('23.12.)</li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
103	경로당 공용 와이파이 설치 및 운영비 개선	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 경로당 와이파이 설치 : 14개 시·군 경로당 4,967개소</li> <li>◦ (목표) 경로당 운영비 개선 : 6,358개소 → 6,857개소(전체 경로당으로 확대)</li> <li>▣ <b>경로당 와이파이 설치 및 운영비 지원 지침 통보 및 사업비 교부('23.1.)</b></li> <li>▣ <b>경로당 와이파이 설치('23년 1,490개소)</b></li> <li>▣ <b>경로당 운영비 개선 지원 완료('22년 6,358개소, '23년 6,857개소)</b></li> </ul>
104	전북형 무상보육 실현 등 돌봄 확대	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 어린이집 차액보육료(만3~5세아) : 전액 지원('23년~'26년)</li> <li>◦ (목표) 필요경비(만3~5세아) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 특별활동비, 특성화비용('23년~'26년), 차량운행비('24년~'26년)</li> <li>현장학습비('25년~'26년), 필요경비 전액 지원('26년)</li> </ul> </li> <li>▣ <b>보건복지부 사회보장제도 신설협의 완료('22.10.)</b></li> <li>▣ <b>'23년 어린이집 차액보육료 및 필요경비 지원</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 차액보육료 전액 지원(1인 월90천원)</li> <li>- 필요경비(특별활동비, 특성화비, 차량운행비 일부) 1인 월100천원</li> </ul> </li> </ul>
111	산악트레킹 코스 개발 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 역사와 문화가 있는 다양하고 쾌적한 산악트레킹 코스 개발 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 구봉산 등 4개 코스 80km 개발</li> </ul> </li> <li>▣ <b>숲길 조성계획 용역 수립('23.2.~6.)</b></li> <li>▣ <b>'23년 코스 1개소 20Km 조성 완료</b></li> </ul>
120	디지털 헬스케어 시범사업 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 1차 의료기관 중심의 디지털 헬스케어 기반 비대면 진료 추진</li> <li>▣ <b>'전라북도 비대면진료 추진 협의회' 발대식 및 심포지엄 개최('22.10.)</b></li> <li>▣ <b>전라북도 디지털헬스케어 추진협의회 개최('23.1.)</b></li> <li>▣ <b>'23년 마이헬스웨이 구축 시범사업 참여 10개소</b></li> <li>▣ <b>마이헬스웨이 구축 시범사업 추진상황 등 간담('23.6.)</b></li> <li>▣ <b>디지털헬스케어 시범사업 추진 간담('23.8.3. / 8.31.)</b></li> </ul>
121	전북형 노인결핵 검진 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 결핵발병 건강고위험군(65세 이상 고연령층, 노인집단시설 등) 대상 노인결핵 검진 지원('23년~'25년 매년 1만명)</li> <li>▣ <b>대한결핵협회 전북지부 사업추진 간담회('22.8.1./'23.10.5.)</b></li> <li>▣ <b>시·군 업무 담당자 간담회 및 의견수렴('22.9.2.)</b></li> <li>▣ <b>'23년 노인결핵 검진사업 위·수탁 계약('23.1.19.)</b></li> <li>▣ <b>전북형 노인결핵 검진사업 추진상황 현장점검('23.3.16, '23.12.13.)</b></li> <li>▣ <b>'23년 전북형 노인결핵 검진 12,348명</b></li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
123	전북형 난임부부 시술비 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 난임환자의 경제적 부담완화를 위한 시술비 추가 지원 : 200건               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 체외수정(신선배아, 동결배아), 인공수정 시술비 중 일부 및 본인부담금 지원</li> <li>- 1인 최대 2회</li> </ul> </li> <li>▣ 보건복지부 사회보장제도 신설·협약 완료('22.11.)</li> <li>▣ 전북형 난임 시술비 추가지원 방송 및 신문기사 보도('22.12.)</li> <li>▣ 「2023년 전북형 난임 시술비 추가 지원사업 안내」 시·군 시달('23.1.)</li> <li>▣ '23년 전북형 난임 시술비 지원 57건</li> </ul>
124	지역발전 생태계 조성을 위한 지역대학 경쟁력 제고	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 지·산·학 협력 강화와 지역특화인재 양성을 위한 지역인재 투자협약제도 추진, 거버넌스 및 교육협력 추진체계 구축</li> <li>▣ 전라북도 대학 상생발전 협의회 구성·운영('23.2.~)</li> <li>▣ RIS 및 RISE 공모 추진 및 선정('23.2.~3.)</li> <li>▣ 글로벌대학30 예비 지정 1개(전북대, '23.6.20.),</li> <li>▣ 전북테크노파크 내 JB지·산학협력단(전라북도 RISE센터) 설립('23.7.4.)</li> <li>▣ 글로벌대학30 전북대 선정('23.11.13)</li> </ul>

□ 정상추진 : 88개

관리번호	사업명	공약목표 및 추진상황
5	캠퍼스 혁신파크 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 산학연 혁신허브(기업종합지원센터) 건립공사 추진</li> <li>▣ 캠퍼스 혁신파크 조성사업 개발구상, 사업타당성조사 용역 추진중('23.)</li> </ul>
7	특수목적선 선진화단지 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 예비타당성 조사 통과('24년)</li> <li>◦ (목표) 단지조성, 기업입주기관 및 친환경기술 대응 시험연구센터 실시설계('25년)</li> <li>◦ (목표) 육상 및 해상공사, 친환경기술 대응 연구센터 시스템 발주('26년)</li> <li>▣ 국가재정사업으로 반영될 수 있도록 중앙부처(해수부, 산업부) 설득 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중앙부처 등(산업부, 해수부, 해군, 국회) 업무 협의(42회)</li> <li>- 국가선박 성능개량 등 수요예측 연구용역 발주('23.12.)</li> </ul> </li> </ul>
9	미래차 산업벨트 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 새만금 내 1~3단계 자율주행 상용차 원스톱 실증기반 구축</li> <li>◦ (목표) 김제 특장단지 기능 고도화를 위한 전문기술지원센터 구축</li> <li>◦ (목표) 완주 수소상용차 핵심부품 개발 및 시험평가인증 지원 전용플랫폼 구축</li> <li>▣ 자율주행 상용차 실증지원 도로 인프라 설계 완료('23.1.~9.)</li> <li>▣ 특장차 전문기술지원센터 2차년도 장비 2종 구축 추진</li> <li>▣ 수소상용차 전용플랫폼 고도화 연구센터 구축 공모 선정 및 사업추진('23.4.~)</li> </ul>
10	메타버스 융복합 산업 육성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 메타버스 플랫폼 구축 3건</li> <li>◦ (목표) 메타버스 콘텐츠 제작지원 20건</li> <li>▣ 메타버스 플랫폼 구축 2건 완료, 콘텐츠 제작 지원 20건 완료               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 새만금 잼버리 메타버스 서비스 제공('23.6.8.)</li> <li>- 한옥마을 메타버스 플랫폼 구축('23.12.)</li> <li>- 메타버스 활용 콘텐츠 제작 지원('22년 10건, '23년 10건)</li> </ul> </li> </ul>
11	새만금 도심항공교통(UAM) 버티포트 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 국토부 비수도권 지역특화 시범사업 공모 선정('26. 상반기)</li> <li>◦ (목표) 드론/UAM 전문가 포럼 4회(연 1회) 개최</li> <li>▣ 2022년 전주 국제 드론산업 박람회 추진('22.12.9.~12.10.)</li> <li>▣ 전라북도 UAM협의체 회의 운영('23.3.17./ 7.14.)</li> <li>▣ K-UAM 기술개발 경연대회 추진('23.10.6.~7.) 및 남원 세계드론제전 추진('23.10.6.~9.)</li> </ul>
12	서해안 데이터센터 집적지 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 데이터·AI 전문인력양성 2,000명</li> <li>◦ (목표) 새만금 스마트그린산단 착공</li> <li>◦ (목표) 주력산업 빅데이터 플랫폼 구축</li> <li>▣ '22년 데이터·AI 전문인력 양성 824명(계획 720명)</li> <li>▣ '23년 데이터·AI 전문인력 양성 668명(계획 720명)</li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
13	새만금 SK데이터센터 조속 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) SK 데이터센터 유치 지원(15회)</li> <li>◦ (목표) SK 창업클러스터 착공('24년)</li> <li>▣ '22년 데이터센터 유치 지원을 위한 실무협의체 운영(3회)</li> <li>▣ '23년 데이터센터 유치 지원을 위한 워킹그룹 운영(2회) 및 관련기관 동향 파악 및 포럼 참석 등('23.4.~6.)</li> <li>▣ 데이터센터 유치 지원을 위한 SK-해저케이블 관계자 업무협의('23.8.)</li> <li>▣ 데이터센터 지역 분산을 위한 산업부-관계부처 회의 참석('23.9.)</li> </ul>
14	생체적합성 탄소소재 의료기기 기술개발	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 탄소소재 의료기기 기술개발 지원 1건</li> <li>◦ (목표) 탄소소재 의료기기 실용화 역량강화 지원 7건</li> <li>▣ 탄소소재의료기기 개발지원센터 개소('23.4.)</li> <li>▣ '생체적합성 탄소소재 의료기기 기술개발' 사업 국가 과학기술 자문회의 심의 대응·추진('23.7.)</li> <li>▣ 국가예산 반영 대응 및 공모 선정 준비</li> </ul>
15	첨단의료산업 기반 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 제약산업 미래인력 양성센터 1개소 완공</li> <li>◦ (목표) 제약공정 장비 120종 구축</li> <li>▣ 센터 구축을 위한 설계 업체 선정 및 계약('23.9.), 설계착수('23.9.~)</li> </ul>
16	전북 화장품 시험검사 임상 센터 건립	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 화장품산업 육성을 위한 전북 화장품 시험검사 임상센터 건립</li> <li>▣ '23년 국가예산 확보(5.1억원) 및 도비 제2회 추경 확보(1.8억원) - 기본 및 실시설계 용역 조달 입찰·계약('23.6.)</li> </ul>
17	천연물 화이트바이오산업 생태환경 기반 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 화이트바이오 소재 융합산업센터 구축 추진</li> <li>◦ (목표) 기술경영인 양성 일자리 창출 30명('26년)</li> <li>▣ '24년 지방소멸대응기금 사업 선정(10억원 확보)</li> <li>▣ 융합산업 추진 용역 완료('22.12.~'23.7.)</li> </ul>
18	그린수소 생산클러스터 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 그린수소 생산클러스터 구축사업 예비타당성 조사 통과</li> <li>◦ (목표) 그린수소 생산클러스터 기본계획 수립</li> <li>◦ (목표) 수전해 설비 집적공간 기반 구축, 통합지원센터 건립 등 기본 및 실시설계 착수</li> <li>▣ 기업 설문(조세연, '22.10.)</li> <li>▣ 기재부 점검회의 3회('23.3.~10.), 예타 철회('23.11.)</li> <li>▣ 재예타 기획용역('24.), 예타대상사업 신청('25.)</li> </ul>
19	수소특화 국가산업단지 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 수소특화 국가산업단지 후보지 선정</li> <li>◦ (목표) 수소특화 국가산업단지 예비타당성 조사 통과</li> <li>◦ (목표) 수소특화 국가산업단지 계획 승인·지정</li> <li>▣ 수소특화 국가산업단지 후보지 종합평가(23.2.27.) 및 후보지 선정(23.3.15.)</li> <li>▣ 사업시행자 선정(23.4.28.), 국가산단 성공추진 상생협약 체결(23.7.5.)</li> <li>▣ 국토부 기업설명회 및 입주기업(2개) MOU 체결(23.11.28.)</li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
20	새만금 재생에너지 클러스터 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 신재생에너지 평가·인증센터 구축 5개소</li> <li>◦ (목표) 혁신 인프라 및 기반 구축 3개소</li> <li>◦ (목표) 태양광·해상풍력 전문인력 1,800명 육성(유지보수 1,600명, 석·박사 200명)</li> <li>▣ 신재생에너지 평가·인증센터 구축 3개소, 착공 1개소, 설계용역 추진 1개소 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고분자연료전지 신뢰성평가센터 준공('21.8.) 및 장비 구축(6종 10기, '22.12.)</li> <li>- 에너지산업융복합단지 종합지원센터 착공('22.1.)</li> <li>- 새만금 신재생에너지산업 전문인력양성센터 준공('23.5.)</li> <li>- 수상형태양광 종합평가센터 구축 완료('23.12.)</li> <li>- 해상풍력산업지원센터 설계용역 완료('23.12.)</li> </ul> </li> <li>▣ 혁신 인프라 및 기반 구축 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 새만금 스마트그린 국가시범산단 지정승인(국토교통부, '22.7.)</li> <li>- 조선기자재기업 신재생에너지 업종전환지원 협동화공장 비전 선포식('22.12.)</li> <li>- 재생에너지 국가종합실증연구단지 토목공사(연약지반 개량공사) 착공('23.9.)</li> <li>- 새만금 스마트그린 국가시범산단 정보화전략계획 수립 착수('23.12.)</li> </ul> </li> <li>▣ 태양광·해상풍력 유지보수 전문인력 육성('22년 615명, '23년 538명)</li> </ul>
21	자산운용 중심 특화 금융도시 육성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 자산운용사 등 금융관련 기관 집적화를 위한 인프라 개선</li> <li>◦ (목표) 금융혁신 생태계 육성(금융혁신기업 육성 40개사)</li> <li>▣ 전북 혁신도시 내 금융 혁신기업 집적화 공간 조성 완료('23.11.)</li> <li>▣ 금융혁신 스타트업 육성 활성화 추진('23년 연중) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 금융혁신 스타트업 육성('22년 12개사, '23년 12개사 / 기업당 5천만원 이내)</li> <li>- 금융혁신 빅데이터 활성화(역량교육, 경진대회, 데이터 안심구역 운영) 5억원</li> <li>- 과기부 공모 국가데이터안심구역 지정('23.1.)</li> <li>- 금융혁신 스타트업 선정 기업 간담회 개최('23.4.)</li> </ul> </li> <li>▣ 글로벌 금융기관 전주사무소 추가 개소 <ul style="list-style-type: none"> <li>- BNY멜론 자산운용그룹('23.7.), 프랭클린템플턴 자산운용사('23.8.), 블랙스톤('24년 개소 예정)</li> </ul> </li> </ul>
23	전북 국제금융센터(JIFC) 설립	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 전북 국제금융센터 건립('26년)</li> <li>▣ 전북국제금융센터 건립(안) 확정 및 건립추진단 구성('22.11.)</li> <li>▣ 전북국제금융센터 조성부지 매매계약 체결('23.3.)</li> <li>▣ 전북국제금융센터 건립사업 기본구상 수립용역 추진('23.4.~10.)</li> <li>▣ 전북국제복합금융센터 개발 업무협약 체결('23.11.)</li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
24	새만금 첨단농업 클러스터 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 새만금 청년농 스마트팜 창업특구 조성('26년)</li> <li>◦ (목표) 지능형 농기계 실증단지 구축 추진(기본 및 실시설계, 착공 및 기반공사 완료)</li> <li>▣ <b>임대형 스마트팜, 농업스타트업단지, 청년농촌 보금자리 조성사업 공모 선정('23.1.~2.)</b></li> <li>- 임대형 스마트팜 실시설계 및 시공사 선정(~'24.1.), 농업스타트업 단지 착공('23.8.), 청년농촌 보금자리 조성사업 기본계획 수립용역 착수('23.11)</li> <li>▣ <b>지능형 농기계 실증단지 조성계획 수립(농식품부, '23.3.)</b></li> <li>▣ <b>지능형 농기계 실증단지 구축 기본계획 수립용역 추진('23.10.)</b></li> </ul>
25	종자생명산업 혁신클러스터 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) (1단계) 종자산업진흥센터 첨단온실 구축, 입주기업 스마트 육종 설비(5개소)</li> <li>(2단계) 사업 타당성 용역 등 행정절차 추진</li> <li>▣ <b>김제공항부지 기본계획 폐지('22.11.), 실시계획 및 용도폐지 완료('23.1.)</b></li> <li>▣ <b>김제공항 관리전환(국토부→농식품부) 본격 논의('23.4.~)</b></li> <li>▣ <b>종자생명산업 혁신클러스터 사전 예비타당성 용역 착수('23.6.)</b></li> <li>- 종클 연계사업 종자가공처리센터 기본계획 수립 용역 추진</li> <li>* 기본계획 용역 착수('23.3.)→ 중간보고('23.6.) → 건축설계 용역 착수('23.10.)</li> </ul>
27	정읍 농축산용 미생물 산업화 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 농축산용 미생물 공유 인프라 구축</li> <li>- 공장형 개별 입주 공간 구축, 공동활용 장비 및 물류 보관창고 구축</li> <li>▣ <b>중앙재정투융자심사 신청('23.3.)</b></li> <li>▣ <b>부지매입 완료('23.9.) 및 실시설계 추진('23.11.)</b></li> </ul>
28	순창 전통장류 지역미생물 실증단지 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 지역별 전통장류 맞춤형 균주 및 생산공정 개발</li> <li>- 전국 9개 권역 전통장류 표준생산모델 5건, 표준균주 27균주 확보</li> <li>- 지역 전통장 복원 프리미엄 제품 10건</li> <li>▣ <b>농식품부 타당성 용역 추진(15억원/발효미생물산업진흥원/23.12~'24.5.)</b></li> </ul>
29	동물용의약품 클러스터 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 동물용의약품 효능·안전성 평가센터 구축('23년)</li> <li>(목표) 동물용의약품 시제품 생산시설 구축('24.~'25년)</li> <li>(목표) 동물용의약품 임상시험 지원센터 구축 1개소 국가예산 확보</li> <li>▣ <b>동물용의약품 효능·안전성 평가센터 착공('22.6.), 준공('23.12.)</b></li> <li>▣ <b>동물용의약품 시제품 생산시설 구축 국가예산 확보('22.12.), 기본 및 실시설계 용역 공고('23.8.~12.)</b></li> <li>▣ <b>동물용의약품 클러스터 관계기관 협의회('23.4.)</b></li> <li>▣ <b>동물용의약품 임상시험 지원센터 구축 관련 농식품부, 기재부 방문 예산 설명('23.5~9.)</b></li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
32	장수 임대형 스마트팜 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 임대형 스마트팜 4ha 조성</li> <li>▣ (1단계) 기본계획 수립 및 승인, 실시설계, 중앙투자심사 승인 등 사전 행정절차 이행완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실시설계 및 용역사 선정('22.)</li> <li>- 임대형 스마트팜 협의회 개최(3회), 사업 시행계획 승인 및 고시(5월)</li> </ul> </li> <li>· 실시설계 완료 및 기반조성 시공사 선정('23.7월)</li> <li>· 기반조성 공사 착공('23.7월) * 진척도 30%</li> <li>· 건축공사 업체 입찰공고 및 선정(12월말)</li> <li>▣ (2단계) 부지확보 및 기본계획 수립('23.7.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도 투용자심사 승인('23. 8.)</li> <li>- 동부권발전사업 승인 및 예산반영('23.12.)</li> </ul> </li> </ul>
34	순창 저탄소 친환경 생태농업 지원시설 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 친환경농자재 생산시설 구축(1개소)</li> <li>▣ 친환경농자재 시설 구축에 대한 설문조사 실시 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대상 : 친환경 농가, 친환경 자재업체, 담당공무원, 전문가 등(632명)</li> </ul> </li> <li>▣ 24년 도 균특예산 19억원 반영(농촌지도기반사업 시설 11억원 장비 8억원)</li> </ul>
35	임실 치즈 명소화	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 치즈산업 기반 확대 및 임실군 식품산업 고도화 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 식품 기업 2개소 추가 창업</li> <li>- 상품화 시설 건립 1개소, 제품 개발 및 특허 등록 20건</li> <li>- 임실N치즈 홍보마케팅 30회</li> </ul> </li> <li>▣ 상품화 시설 건립공사 준공('23.)</li> <li>▣ 임실N브랜드 홍보 및 마케팅 추진 28회</li> <li>▣ 제품 개발 및 특허 등록 8건</li> </ul>
36	섬진강 먹거리촌 구축 (섬진강 건강휴양단지 조성)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 소규모 HACCP 모델기반 등 장류 지식기반 공유 구축</li> <li>◦ (목표) 섬진강 유역을 중심으로 하는 건강 휴양도시 육성 및 콘텐츠 개발 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국지도 55호선(순창~구림) 확장 추진</li> <li>- 국도 24호선(순창~인계) 확장 : 제6차 국도-국지도 건설계획 반영</li> <li>- 자연휴양림 시설 보완(4회), 먹거리촌 조성(1개소)</li> </ul> </li> <li>▣ 국지도 55호선(순창~구림 간 9km) 확장 기본설계 완료('22.6.~'23.6.) 및 실시설계 용역 추진('22.10.~'24.6.)</li> <li>▣ 자연휴양림 시설 보완 2회, 먹거리체험존 조성 공정률 50%</li> </ul>
39	진안 홍삼 세계화	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 진안 홍삼 홍보 시설 구축 및 판매시설 집적화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 홍삼 플랫폼 센터 구축(카페, 콘텐츠 제작 공간 등)</li> <li>- 진안홍삼 홍보체험관 및 판매시설 조성</li> </ul> </li> <li>◦ (목표) 전라북도 관광자원과 연계한 진안 홍삼 홍보 50회</li> <li>▣ 홍삼 플랫폼 센터, 홍보 체험관, 판매시설 구축 건축기획 용역 완료('23.12)</li> <li>▣ 진안홍삼 홍보 26회 실시('22년 6회, '23년 20회)</li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
40	순창 전통장류 브랜드 파워 강화	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 장담그기, 장문화학교 연 30회 운영(총 150회)</li> <li>◦ (목표) 장독대 공원 조성('25년)</li> <li>◦ (목표) 발효아카데미 연 2회 운영(총 10회)</li> <li>▣ 장담그기, 장문화 학교 107회 운영('22년 47회, '23년 60회)</li> <li>▣ 장독대 공원 부지 확정</li> <li>▣ 발효아카데미 운영 8회 운영('22년 4회, '23년 4회)</li> </ul>
43	해양치유 거점단지 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 해양치유산업 활성화 기반 구축 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 해양치유 프로그램 발굴·운영, 해양치유지구 지정, 조례 제정 등</li> </ul> </li> <li>▣ 해양치유 프로그램 발굴 및 운영('22년 6회 129명)</li> <li>▣ 국가예산 확보활동(1회) 및 치유거점단지 현지방문(1회)</li> <li>▣ 해양치유자원 관리 및 활용 조례 제정('23.3.)</li> <li>▣ 해양치유지구 지정 관련 자료 제출(해수부, '23.10.)</li> <li>▣ 타시도 해양치유센터 벤치마킹(태안)('23.11.)</li> <li>▣ '23년 프로그램 체험 및 패키지 6회(체험 13일, 3,581명/ 패키지 7일 48명)</li> </ul>
44	국립해양문화시설 건립 기본구상	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 사전타당성 조사 완료('23년)</li> <li>◦ (목표) 예비타당성 조사 통과('26년)</li> <li>▣ '23년 국가예산 확보(3억원), 해수부 기본구상 및 타당성 조사용역 추진 ('23.4.~12./해수부) 및 대응</li> <li>▣ 용역 추진방향 협의('23.4.13./ 4.21./ 7.14.)</li> <li>▣ 전문가 세미나 개최('23.11.24.)</li> <li>▣ 해수부 기본구상 및 타당성 조사 용역 추진('23.4.~12.)</li> </ul>
45	내장산 트라이앵글 관광벨트 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 내장산~문화광장~용산호를 잇는 관광벨트 조성 <ul style="list-style-type: none"> <li>- (문화광장) 문화·관광·레저시설 5개 사업</li> <li>- (용산호) 복합힐링 공간 조성 3개 사업</li> </ul> </li> <li>▣ (문화광장) 문화광장 수상레저 체험존, 순환열차 설치('22./2개소), 메인주차장 및 상가, 미디어아트관, 동화마을 조성중('23.~'24./3개소)</li> <li>▣ (용산호) 미르샘 분수, 전망대 설치('22~'23/2개소) / 용산호 환경정비('24./1개소)</li> </ul>
46	지리산권 관광특구단지 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 지리산권 특별지방자치단체 설치를 위한 규약 승인 및 출범 <ul style="list-style-type: none"> <li>- (특별지자체) 6개 시·군 간 협의를 통해 특별지방자치단체 규약 승인 및 설치</li> <li>- (관광특구) 지리산권 대상지역(6개 시·군) 관광특구 타당성 조사 완료 및 진흥계획 수립 추진</li> </ul> </li> <li>▣ 지리산권관광개발조합 방문 협의('22.7.), 지리산권 특별자치단체 설치를 위한 5개 지자체장(남원, 구례, 산청, 함양, 하동) 협약('22.12.)</li> <li>▣ 특자체 순회 설명회 및 협의('22.10.~12.), 지리산권관광개발조합 추진단 구성 및 사무발굴 등 특자체 출범 준비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 특자체 설립 기본계획 수립용역('23.6.~'24.2.)</li> </ul> </li> <li>▣ 주관 지자체 선정 및 추진단 구성·사무발굴 추진('24.상반기)</li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
47	치유관광산업 육성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 전북 '특화 치유관광지' 기반시설 5개소 구축</li> <li>◦ (목표) '전북 치유관광지' 30개 선정 : 매년 10개 선정('23.~'25년)</li> <li>◦ (목표) 치유관광 상품 20개 개발 : 매년 5개 개발</li> <li>▣ 전북 치유(웰니스)관광 거점지역 육성 용역 추진('22.11.~'23.9.)</li> <li>▣ 문체부 '웰니스·의료관광 융복합 클러스터' 공모사업 선정('23.3.)</li> <li>▣ '23년 치유관광지 10개 선정 및 치유관광상품 7개 개발·운영</li> </ul>
48	전주-군산-익산 연계 역사·문화 관광벨트 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 역사문화관광벨트 조성을 위한 사업 추진(3개) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전주 지역관광거점도시 육성, 군산 달빛마루관광자원화 사업, 익산 이색교도소 조성</li> </ul> </li> <li>▣ 전주 지역관광거점도시사업 세부사업('22. 33개 완료/ '23.3. 9개 완료) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관광거점도시 육성사업 현장점검(23.2), 전주전통술박물관 리모델링 완료(23.9)</li> </ul> </li> <li>▣ 군산 달빛마루관광자원화 연계 사업(전망대) 디자인 재설계('23.6.)</li> <li>▣ 익산 이색교도소 조성사업 설계용역 공모('23.11.)</li> </ul>
49	전북 서해안권 새만금과 5개 시군 연계 해양관광벨트 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 시군별 관광자원 사업 추진(14개) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 군산시(2개), 정읍시(3개), 김제시(2개), 고창군(3개), 부안군(4개)</li> </ul> </li> <li>▣ 기본구상 연구용역 착수보고('22.12.) 및 전문가 자문회의 개최('23.1.) 기본구상 연구용역 준공('23.9.)</li> </ul>
50	무주 구천동 33경 관광명소화	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 둘레길 및 자전거 도로 조성, 테마별 체험 콘텐츠 도입</li> <li>▣ 기본구상 및 타당성조사 용역 추진('23.6.~12.)</li> </ul>
51	갯벌 치유센터 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 갯벌 치유센터 조성</li> <li>▣ '23년 서해안권 발전지원사업*(국토부)에 신규 반영하여 사업추진을 위한 1년차 용역사업비 국비 3억원 확보</li> <li>▣ 지방재정 도 투자심사 완료('23.4.)</li> <li>▣ '23년 지방비 3억원 추경 확보('23.6.)</li> <li>▣ 프로그램 개발 및 공공건축심의 용역 추진('23.9.~12.)</li> <li>▣ 기본 및 실시설계용역 발주 및 착수('23.12.)</li> </ul>
52	K-문화지원센터 건립	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) K-문화지원센터 건립</li> <li>▣ K-문화지원센터 건립 기본구상 연구용역 추진('23.1.~12.)</li> <li>▣ 문화콘텐츠 전문가 자문위원회 자문 2회('23.2~5.)</li> <li>▣ 국가예산 확보를 위한 문체부 6회, 국토부 2회 방문('23.2.~10.)</li> <li>▣ 국가예산 확보를 위한 기재부 10회, 의원실 6회 방문('23.6~12.)</li> <li>▣ 지원센터 건립 전북특별자치도 특례 반영('23.12.)</li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
53	금마역사체험마을 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 타당성 용역('23년) 및 부지매입('24년~'25년)</li> <li>◦ (목표) 기본 및 실시설계 용역(착수 : '25년 / 완료 : '26년)</li> <li>◦ (목표) 공사 발주('26년)</li> <li>▣ 익산 고도보존육성 기본계획 변경(문화재청 승인 '22.7.29, 변경 고시 '22.8.24)</li> <li>▣ '23년 국비 2억원 확보, 기본구상 및 타당성 용역 완료('23.1.~7.)</li> <li>▣ '24년 국비 29.75억원 확보 및 기본계획 용역 발주 의뢰('23.10.)</li> </ul>
54	동서화합 육십령 가야이음터 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 기본 및 실시설계용역('24년)</li> <li>◦ (목표) 육십령 가야 옛길 복원(1.45km) 1개소 착공('25년)</li> <li>▣ '23년 사전행정절차 이행(지방재정 투자심사, 도유림 사용허가 등)</li> <li>▣ 국가예산 확보 활동 추진('22년 6회, '23년 9회)</li> </ul>
56	폐공장 등 활용 문화적 도시재생 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 폐산업시설 문화재생 공간 조성 3개소, 소규모 문화예술공간 구축 2개소</li> <li>▣ '22년 폐산업시설문화재생 공간 조성 완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전주 서브컬처 복합문화공간 조성(남부시장 구.원예공판장)</li> </ul> </li> <li>▣ '23년 소규모 문화예술공간 사업지 공모 선정(군산, 익산, 남원) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도비 500백만원(군산 285, 익산 99, 남원 116) 지원</li> </ul> </li> <li>▣ '23년 소규모 문화예술공간 만족도 조사(2회/1, 12월)</li> <li>▣ '24년 폐교활용 유희공간 문화재생공간 조성 1개소(군특 15억) 지원('23.9.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 임실(구. 관촌 상월분교)</li> </ul> </li> </ul>
57	전북 글로벌 MICE 육성센터 설립·운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 전북 글로벌 MICE 육성센터 설립</li> <li>▣ 전북 글로벌 MICE 육성센터 설립 기본구상 용역 완료('22.12.~'23.5.) 착수보고('23.2.), 중간보고('23.4.), 용역 완료('23.5.)</li> <li>▣ '23년 전북 MICE 전문인력 양성(30명) 추진계획 수립('22.12.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- '23년 전북 MICE 전문인력 운영기관(전북마이스발전협의회) 선정('23.4.) 및 교육생 모집·홍보('23.6.)</li> <li>- '23년 전북 마이스 전문인력 양성(50명) 참가자 모집('23.9.)</li> </ul> </li> <li>▣ 전북 마이스 지원협의회 개최 및 육성센터 설립 자문 청취('23.9.)</li> <li>▣ 마이스 육성센터 설립 관련 전북문화관광재단 실무협의('23.9.)</li> <li>▣ 전북 글로벌 마이스 육성센터 설립(안) 보고('23.9.)</li> <li>▣ 재단내 육성센터 설립 위한 조직 신설 및 정원증원 예산과 협의('23.10.)</li> </ul>
58	전주 월드컵 스포츠타운 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 전주 월드컵 스포츠 타운 조성('27년 개관) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 육상경기장, 야구장, 실내체육관 건립 시행</li> </ul> </li> <li>▣ '23년 국가예산 확보(육상경기장 27억원, 야구장 30억원)</li> <li>▣ 육상경기장, 야구장, 실내체육관 설계용역 완료('22.12.)</li> <li>▣ 육상경기장 및 야구장 착공('23.6.)</li> <li>▣ '24년 국가예산 확보(육상경기장 36억원, 야구장 30억원)</li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
59	국립 전북 유소년 스포츠 콤플렉스 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 기본구상 및 타당성 조사용역('23년)</li> <li>◦ (목표) 유소년 스포츠 콤플렉스 건립 착공('25년)</li> <li>▣ (남원시) 유소년 스포츠 콤플렉스 기본사업계획 수립('22.10.)</li> <li>▣ '23년 국가예산 확보(타당성조사 및 설계용역비 5억원)</li> <li>- 타당성조사 및 기본계획 수립용역 추진('23.12.~'24.4.)</li> </ul>
60	국제 태권도 사관학교 설립	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 타당성 조사('24년), 기본계획 수립('25년), 관련 법률 제·개정('26년)</li> <li>◦ (목표) 조성공사 및 대학 설립 추진('27년 이후)</li> <li>▣ '23년 국제 태권도 사관학교 건립을 위한 타당성 조사 용역비 3억원 반영</li> <li>▣ 타당성 조사 용역 추진('23.10.~'24.4.)</li> </ul>
62	완주 종합 스포츠타운 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 축구장, 족구장, 농구장, 풋살장, 다목적체육관 건립 시행</li> <li>▣ '23년 다목적체육관 예산 확보(체육진흥시설 지원사업 8억원)</li> <li>▣ 축구장 준공('22.8.), 족구장·농구장·풋살장 준공('23.6.)</li> <li>▣ 다목적체육관 건축기획 용역 시행('23.8.)</li> </ul>
65	마리나 리조트 건설	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 마리나항만 사업계획 승인, 사업시행자 및 구역 지정(해수부)</li> <li>▣ 사업계획 수립 용역('21.5.~'22.11.)</li> <li>- 사업계획 승인신청 해수부 사전협의(2회, '23.3., '23.6.)</li> <li>- 마리나항만 수정계획 용역 착수('23.4.)</li> <li>▣ 민간사업자 제안서 제출(부안군, '23.7.)</li> <li>- 민간사업자 제안서 해양수산부 제출('23.8.)</li> </ul>
66	국제학교 유치	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 새만금 개발의 가속화 및 내실화를 위한 스마트 수변도시 내 새만금 국제학교 유치</li> <li>▣ 국제학교 유치 및 설립을 위한 업무협약 및 특례발굴 등 추진</li> <li>- 유관기관 업무협약(도교육청, 새만금개발청·공사, 부안군)('23.2.~3.)</li> <li>- 유치관련 업무협약(美드렉셀대, IL텍사스 등)('23.2.)</li> <li>- 전북특별자치도 국제학교 관련 특례조항 발굴('23.2.~3.)</li> <li>- 국제학교 관련 전문가 토론회 등('23.2.24., 3.15.)</li> <li>- 국제학교 유치 관련 벤치마킹(인천/'23.5.2.)</li> <li>- 전북특별자치도 국제학교 특례법안 협의(교육부/'23.5.10., 6.13.)</li> <li>- 국제학교 추진상황 점검 및 업무간담(교육청, 새만금청·공사/'23.5.26.)</li> <li>- 국제학교 설립·운영을 위한 특별법 신설 관련 협의('23.7.13., 9.12.)</li> <li>- 새만금 국제학교 설립 타당성조사 연구용역 완료('23.4.~12.)</li> </ul>
67	자율주행 스마트시범지구 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 군산시 자율주행차 규제 특례를 통한 유상 운송서비스 실증에 필요한 자율주행 실증 및 서비스 제공</li> <li>- 고군산군도 및 새만금방조제('24년), 군산2국가산업단지('25년)</li> <li>▣ 시범 운행지구 지정 고시(국토부 '22.6.) 및 시범 운행(고군산군도 및 새만금 L=41.6km)</li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
68	자율주행 통합관제센터 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 자율주행자동차 서비스 기술개발 및 사업 모델 고도화를 위한 통합관제센터 구축</li> <li>▣ 재정투자심사('22.8.~9.), '22년 도입장비 1종 구축('22.12.)</li> <li>▣ 자율운송 실증 인프라 및 통합관제시스템 설계 완료('23.1.~12.)</li> </ul>
69	새만금 국제물류 허브항 개발	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 부두 2선석 완공('25년) 및 개장('26년)</li> <li>◦ (목표) 새만금 신항 기본계획 변경 반영('25년) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2030년까지 계획된 1단계 부두 6선석을 2028년까지 단축</li> <li>- 민자로 계획된 부두 4선석과 배후부지의 기반시설을 재정사업으로 전환</li> </ul> </li> <li>▣ 기본계획 변경 용역('22.6.~'24.7./해수부), 부두 2선석 추진(공정률 47%) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 진입도로 및 복측 방파호안 축조공사 완공('23.4.)</li> </ul> </li> </ul>
70	새만금 국제공항 조기 착공	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 새만금 국제공항 조기 착공('24년)</li> <li>▣ 대형공사 입찰방법(턴키) 결정('22.9.), 건설공사 입찰 공고('23.3.)</li> <li>▣ 기본설계서 제출 및 가격입찰('23.8.) <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 새만금 SOC사업 적정성 검토연구 용역시행으로 행정절차 중단</li> </ul> </li> </ul>
71	새만금~전주 고속도로 건설	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 사업준공 및 개통('24년)</li> <li>▣ 토공 및 구조물 등 계속사업 추진(공정률 70.2%/'23.11.)</li> </ul>
72	새만금항 인입철도 건설	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 새만금항 인입철도 건설사업 기본 및 실시설계 완료('26년)</li> <li>▣ 기본계획 수립 추진('24년 완료 예정) <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 새만금 SOC사업 적정성 검토연구 용역시행으로 용역 일시정지</li> </ul> </li> </ul>
73	새만금 남북3축 도로 건설	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 예비타당성 조사 통과</li> <li>▣ 사전타당성 조사용역비 예산 확보를 위한 건의 활동('23.~)</li> </ul>
76	격포항 국가어항 확장 개발	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 격포항 내 부잔교·연결도교 설치(4개소)</li> <li>◦ (목표) 해경 함정 전용부두 설치 착공</li> <li>▣ '24년 국가예산 확보(기본 및 실시설계비 15.5억원) *'23년 기확보(10억원) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 격포항 확장 기본 및 실시설계 용역 착수(군산지방해수청, '23.6.)</li> <li>- 기본 및 실시설계 용역 착수보고회('23.8.29.)</li> </ul> </li> </ul>

관리번호	사업명	공약목표 및 추진상황
77	금란도 개발계획 수립	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 금란도 개발을 위한 항만재개발 기본계획 수립 추진</li> <li>◦ (목표) 상생협의체 운영(8회)</li> <li>▣ 기본구상 용역 추진('22.6.~'23.12./해수부)</li> <li>▣ 지역 상생협의체 회의 6회('22년 3,7,12월/'23년 3,6,12월)</li> </ul>
78	대한방직 부지 개발 행정적 협력 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 장기간 방치된 부지를 재생하여 전주의 랜드마크 마천루(타워) 조성 지원</li> <li>- 문화·관광·업무시설 향후 모악산 송신탑 이전 등 다양화된 공간수요에 대응하는 도시기본계획 변경 승인</li> <li>▣ 개발방안에 대한 사전협상 지침 마련 및 공포('22.3.~'23.9.)</li> <li>▣ 사전협상대상지 선정 신청서 제출(민간→전주시, '23.9.22)</li> </ul>
79	명사십리지구 연안 정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 해양수산부 제3차 연안정비 기본계획 변경('24년)</li> <li>◦ (목표) 기본계획 수립 용역('25년)</li> <li>▣ '23년 국기예산 확보(국민안심해안), 기본 및 실시설계 추진계획 수립('23.3.)</li> <li>- 재해위험이 높은 명사십리 지구에 완충구역 확보 및 연안정비 추진</li> <li>* 해수부 협의 결과, 연안정비 기본계획 변경 없이 사업 추진 가능</li> <li>▣ '23년 추가경정예산 반영, 기본 및 실시설계 추진 계획 수립('23.6.)</li> <li>▣ 기본 및 실시설계 원가심사('23.9.)</li> <li>▣ 기본 및 실시설계 용역 업체 선정 입찰공고 및 선정('23.12.)</li> </ul>
80	제2의 혁신도시 유치	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 전북도내 균형발전을 도모할 수 있는 제2의 혁신도시 조성을 위한 정부방침 결정 후 지속적인 공공기관 유치 활동 추진</li> <li>- 지속적인 공공기관 유치활동 추진</li> <li>- 정부방침 결정 후 제2의 혁신도시 입지 타당성 논리 개발</li> <li>▣ 지속적인 공공기관 유치활동 추진</li> <li>- 국토부 장관('22.11.25./12.26.), 국토부 혁신도시발전부단장('23.4.11.) 균형위원장('23.6.22.) 면담 등 공공기관 전북도 추가이전 건의</li> <li>- 공공기관 유치추진단 발족 및 제1~3차 회의('23.3.15./4.19./10.31.)</li> <li>- 공공기관 전북 추가이전을 위한 전라북도, 전북 여·야 국회의원 공동성명서 결의('23.3.17.)</li> <li>- 중점유치 대상기관 실·국별 유치 활동 전개('23.4./'23.10.)</li> <li>- 수도권 소재 150여개 공공기관, 부처 산하기관, 농수협 등 특수 민간기관 중 유치 대상 선정 및 전략 마련을 위한 용역 완료(~'23.6.)</li> </ul>

관리번호	사업명	공약목표 및 추진상황
82	지역소멸 대응 '인구·청년 지원연구센터' 설치	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 지역소멸 대응 '인구·청년 지원연구센터' 설치</li> <li>◦ (목표) 지역소멸 대응 선도사업 발굴 및 추진('24년~'26년, 연 1건)</li> <li>▣ 센터 설치 및 운영 전북연구원 업무협약('22.8.)</li> <li>- 전북연 조직 및 정원 신설 등 정책기획관, 예산과 업무협약('22.8.~10.)</li> <li>▣ '전북여성가족재단' 출범('23.9.)</li> <li>- '24년 전북연 출연 동의안(센터 설치 포함) 승인('23.10.)</li> </ul>
83	국도13호선 위험구간 (장수~천천) 개선	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 예비타당성 조사 통과 및 제6차 국도·국지도 5개년 계획(26~'30) 반영</li> <li>▣ 제6차 국도·국지도 건설계획 수요조사 반영 추진('23.4.~)</li> </ul>
84	전주 시외버스터미널 현대화 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 노후화된 전주시외버스 터미널의 현대화 사업 건축설계 추진</li> <li>▣ 터미널 신축에 따른 재정지원 방안 검토 및 현대화 사업 추진을 위한 사업시행자와 이해당사자 간 지속 협의</li> </ul>
85	군산 고속·시외버스터미널 현대화 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 고속·시외버스터미널 현대화 사업 기본계획 수립('25년)</li> <li>▣ 사업시행자 및 민간사업자와 터미널 운영방안에 대한 지속 협의</li> </ul>
86	전라선 고속화 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 전라선(익산~여수간) 고속화 예비타당성 조사 통과('26년)</li> <li>▣ 사전타당성조사 추진중('24.6. 완료 예정)</li> </ul>
87	전주~김천간 동서횡단 철도 건설	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 전주~김천간 철도사업 예비타당성 조사 통과('26년)</li> <li>▣ 사전타당성조사 추진중('24.6. 완료 예정)</li> </ul>
88	국가식품클러스터 산업선 국가계획 반영	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 제5차('26.~'35.) 국가철도망 구축계획 반영('26년)</li> <li>▣ 전북권 철도망 구축계획 수립용역 추진('23.6.~'24.5.)</li> <li>- 신규사업반영을 위한 사업추진 논리 마련 등 국가계획 대응</li> </ul>
89	부안~고창간 노을대교 조기 착공	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 해양관광권역 활성화 및 지역발전을 위해 신속한 사업 착공</li> <li>▣ 입찰방법을 변경(설계·시공 일괄입찰→설계·시공 분리, '23.1.), 기본설계 용역 완료('23.4.~12.)</li> <li>- 지역여론을 감안 4차로 대안을 검토할 수 있도록 국토부(익산청) 건의</li> </ul>
90	전주~대구간 고속도로 건설	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 전주~대구간 고속도로(무주~성주 구간) 예비타당성 조사 통과</li> <li>▣ 무주~성주 구간 사전타당성 조사용역 추진 건의('23.~)</li> <li>- 국토교통부 예산협의회 건의, 전북·경북 공동건의 추진 등</li> </ul>
91	장애인고용 교육연수원 건립	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 장애인고용 교육연수원 건립</li> <li>▣ 예정부지 건축물 철거·해체공사 완료('23.4.~11.)</li> <li>▣ 건축공사 2동 완료(탈시설종합지원센터, 재활치료센터)</li> <li>* 자립생활주택 4동 공사 완료(~'23.12.)</li> <li>▣ 기본계획 수립 및 공공건축기획 사전검토 심의(~'23.11.)</li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
94	시·군 청소년 복합문화센터 건립	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 청소년 복합문화센터 건립(기능 전환) 5개소               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ('24년) 2개소, ('25년) 3개소</li> </ul> </li> <li>▣ 전북 청소년복합문화센터 건립방향 연구, 수요자 요구조사 계획 수립('23.)</li> <li>▣ 전북 청소년복합문화센터 추진방향 연구용역('23.6.~10.)</li> <li>▣ 청소년 관계기관 요구조사 및 의견수렴('23.8.~9.)</li> <li>▣ 전북 청소년복합문화센터 건립 기본계획 수립('23.9.)</li> <li>▣ 전북 청소년복합문화센터 건립 자문회의('12.15.)</li> </ul>
95	청소년 스마트 체험 활성화	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 전라북도 청소년들에게 스마트 체험 활동을 제공하기 위해 교육청 등 관계기관 등과 협업 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교육청, 청소년 관련 기관 등과 협업체계 구축</li> <li>- 청소년 스마트 체험 활동 및 각종 프로그램 운영 지원</li> </ul> </li> <li>▣ 협업체계 구축·운영 및 체험 활성을 위한 교육청과 소통협의(2회)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교육행정협의회('22.10.28., '23.4.28.)</li> </ul> </li> <li>▣ 전북교육청, 관계기관 등 협업체계 구축('23.7.)</li> <li>▣ 청소년 스마트 체험활성화를 위한 간담(교육청/'23.8.)</li> <li>▣ 청소년 스마트 체험활성화 방안 추진계획 수립('23.11.)</li> <li>▣ '24년 도내 청소년 스마트체험 수요분석 완료('23.12.)</li> </ul>
96	글로벌 청소년 인재 양성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 글로벌 청소년 리더 센터 건립('24년)</li> <li>◦ (목표) 글로벌 마인드 함양을 위한 기초 소양 교육체임을 통해 글로벌 인재 양성               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 글로벌 청소년 인재 교육 : '24년~</li> </ul> </li> <li>▣ 글로벌 청소년 리더센터 건립공사 공정률 80%부대토목 및 조경공사 추진</li> <li>▣ 글로벌 청소년 리더센터 운영 기본계획 수립 용역 완료('23.6)</li> </ul>
97	신혼부부·청년 임대주택 임대보증금 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 신혼부부·청년 공공임대주택 임대보증금 지원 4,000가구('23년~'26년)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지원금액 : 임대보증금 최대 2,000만원(계약금 자부담 제외)</li> <li>- 지원기간 : 최대 10년(신혼부부·청년 6년, 1자녀 출산시 8년, 2자녀 이상 출산시 10년)</li> </ul> </li> <li>▣ 시·군 간담회 및 수요조사, 복지부 사회보장제도 신설 협의('22.10.~12.)</li> <li>▣ 실태조사 및 「전라북도 저소득계층과 청년 및 신혼부부 주거 지원 조례」 개정('23.3.)</li> <li>▣ 신혼부부 임대보증금 지원 325가구 지원('23.4.~12.)</li> </ul>
101	정읍시 어린이 기적의 놀이터 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 전국 최대 '기적의 놀이터' 조성</li> <li>▣ 공유재산 심의 및 관리계획 승인('22.12.), 지방재정투자심사 및 중기 지방재정계획 반영('22.12.)</li> <li>▣ 선진지 견학('23.2.6.) 및 기본 및 설계 용역 완료('23.3.~10.)</li> </ul>
105	다문화가정 원스톱 지원 서비스 고도화	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 광역가족센터 설치 1개소</li> <li>◦ (목표) 국적취득 비용 지원 : 매년 150건</li> <li>▣ 타 시·도 사례 조사 및 세부계획안 마련('22.11.~12.)</li> <li>▣ 국적취득 비용 지원 사회보장제도 신설 협의 및 추경예산 반영('23.2.~5.)</li> <li>▣ 국적취득 비용 지원 195건</li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
106	용담호 탐방길 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 용담호 생태탐방로(L=10km) 조성('25년)</li> <li>▣ 환경부 공모 선정('22.9.20.)</li> <li>▣ 기본계획 수립용역 완료('23.9.)</li> <li>▣ 실시설계 용역 착수('23.12.)</li> </ul>
107	옥정호 생태탐방 공간 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 옥정호 생태탐방로 및 편의시설 조성</li> <li>- (1단계) 탐방로 7.3km 조성('23년)/ (2단계) 탐방로 10.3km 조성 추진</li> <li>▣ (1단계) 공정률 100% 추진</li> <li>▣ (2단계) 환경부 공모 선정('22.9.) 및 지방재정투자심사('23.2.), 실시설계 용역 착수('23.12.~)</li> </ul>
109	한국정원산업지원센터 조성 적극 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 한국정원산업클러스터 조성사업 예비타당성 조사 대상사업 선정</li> <li>- 정원산업혁신존(기업지식산업센터 조성 - 기업입주센터, 공동연구단지) : 중기부</li> <li>- 정원식물 소재존, 정원 소재 유통, 정원박람회존, 정원휴양 및 관광존 : 산림청</li> <li>▣ 산림청 대상사업 선정을 위한 협의 및 부지매입 지속 추진</li> <li>- 총 사업면적 중 73% 매입 완료</li> </ul>
110	군립자연휴양림과 지방정원 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 기본 및 실시설계 수립('24년) 및 승인('25년), 사업 착공('26년)</li> <li>▣ 군립 자연휴양림 지정 고시(산림청, '23.4.)</li> <li>▣ 자연휴양림 조성계획 승인 후 국유림 교환 예정으로 기본 및 실시설계 수립 중</li> </ul>
112	산림복지단지 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 산림휴양·치유·교육 등 다양한 산림복지서비스를 종합적으로 제공하는 산림복지단지 조성</li> <li>- 실시계획 수립('23년), 실시계획 승인('24년), 조성공사('25년~'26년)</li> <li>▣ 무주 향로산 산림복지단지 실시설계용역 추진('22.12.~'24.6.)</li> </ul>
113	백두대간 산림정원 조성 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 행정절차 완료('25년) : 환경영향성 평가, 공유재산 심의</li> <li>◦ (목표) 기본 및 실시설계 착수('26년)</li> <li>▣ 대상지 확보를 위한 공유재산(도유림↔군유림) 교환 계획 수립</li> <li>▣ 공유재산 임야 교환계약 체결('23.11.)</li> </ul>
114	산림치유 인프라(지덕권 친환경 산림고원 조성) 확충	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 예비타당성 조사 대상사업 선정('26년)</li> <li>▣ 예비타당성 대비 기본구상 수립 연구용역 완료('22.4.~'23.4.)</li> <li>- '24년 사전 타당성 용역비 국비 5억원 확보를 위해 지속적 건의 활동 추진</li> <li>▣ 지덕권 산지약용식물 특화산업화 방안연구 4억원 확보('23.9.)</li> </ul>

관리번호	사업명	공약목표 및 추진상황
115	임실 관내 공공하수처리시설 증설	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 공공하수처리시설 증설 2개소(오수 '25년 착공, 임실 '26년 착공)</li> <li>▣ 오수 공공하수처리시설 증설 : 설계용역 착수('23.6.)</li> <li>▣ 임실 공공하수처리시설 증설 : '24년 국가예산 신규사업 반영</li> </ul>
116	무주군 친환경 에너지타운 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 타당성조사 용역('23년), 기본 및 실시설계 용역('24년), 조성공사 추진('25년~'26년)</li> <li>▣ 공모 신청('22.6.) 및 환경부 현지실사('22.7.), 공모 선정('22.8.)</li> <li>▣ 타당성조사 용역 완료('22.10.~'23.9.), 설계 발주준비(~'23.12.)</li> </ul>
117	만경강 친수공간 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 만경강 친수공간 조성사업 추진을 위해 국가계획(만경강 하천기본계획 등) 반영</li> <li>▣ 금강유역 수자원 관리계획 반영 용역 완료('20.2.~'23.12. 환경부)</li> <li>▣ 만경강 하천기본계획 반영 용역 추진 중('23.1.~'24.)</li> </ul>
118	탄소중립 실현을 위한 생태 문명원 건립	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 탄소중립 실현을 위한 생태문명 혁신활동 거점공간 조성 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 생태기술혁신센터, 생태문명 연구·교육센터</li> </ul> </li> <li>▣ 환경부 국비사업 연계를 위한 자연환경복원 시범사업 선정('23.5.)</li> <li>▣ 환경청, 전북도, 환경공단, 전문가 등 협의체 구성('23.7.)</li> <li>▣ 자연환경복원사업 원활한 추진을 위한 환경청 선행용역 착수('23.8.)</li> <li>▣ 협의체 현장답사('23.9.) 및 환경청 선행용역 중간보고회('23.12.)</li> </ul>
119	국립공공보건의료대학원 설립	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 국립공공보건의료대학원 설립(법안 국회 통과)</li> <li>▣ 국회 상임위 제2법안소위 법안심사('22.4.26.) 공청회 개최('22.12.9.)</li> <li>▣ '23년도 국비 3.9억원(설계비 등) 확보</li> <li>▣ 법안 국회 통과를 위한 활동 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 조규홍 보건복지부장관 면담('23.1.16.)</li> <li>- 중앙지방협력회의에서 대통령께 국립의전원 설립 건의('23.2.10.)</li> <li>- (민주당)김성환 정책위의장, 박홍근·박광은 원내대표 등 면담('23.1.~4.)</li> <li>- (국민의힘)김기현 대표, 윤재옥 원내대표, 박대출 정책위의장 등 면담('23.3.~4.)</li> <li>- 국민의힘 호남권 예산정책협의회 협조 요청('23.6.14.)</li> <li>- 청와대 안상훈 사회수석, 박대출 국민의힘 정책위의장 면담('23.6.19.)</li> <li>- 박대출 국민의힘 정책위의장 면담('23.9.12.)</li> </ul> </li> <li>▣ 국회 보건복지위 전체회의 통과('23.12.20.)</li> </ul>
122	공공산후조리원 건립	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 출산·산후조리 취약지역 및 사각지대를 연계하는 산후조리 인프라 구축을 위한 공공산후조리원 건립</li> <li>▣ 공공산후조리원 건립·운영 연구용역 추진('22.10.~'23.3.)</li> <li>▣ 공공산후조리원 건립 부지 남원시 공유재산 승인('22.11.)</li> <li>▣ 공공산후조리원 설립 추진 방향 검토('23.3.) 및 도 투자심사 완료('23.3.)</li> <li>▣ 공공산후조리원 건립 부지 매입 확보('23.4.)</li> <li>▣ 지방소멸대응기금 확보를 위한 신청서 제출 및 대응('23.4.)</li> <li>▣ 보건복지부 사회보장제도 신설·협의 완료('23.5.)</li> <li>▣ 「전라북도 공공산후조리원 설치·운영 등에 관한 조례」 제정('23.5.8.)</li> <li>▣ '24년 지방소멸대응기금 평가 대응('23.7.~9.) 9억원 확보('23.12.)</li> </ul>

# V

## 향후 관리계획

### □ 공약 목표

- (완료도 상향) 매년 이행 완료된 공약의 비율 지속적 상향  
- 연도별 완료 가능한 목표를 명확히 설정하여 목표 달성

연도별	2023	2024	2025	2026	2027 이후
달성 목표	20%	50%	80%	90%	100%

### □ 관리체계

- (실천계획 수립) 공약의 타당성, 실현 가능성, 재원확보 방안 등 종합검토
- (실천계획 이행) 실천계획에 따라 이행실적 관리(분기별)
- (실천계획 변경) 정책환경 변화 등 불가피한 사유 발생 시 변경
- (외부평가 대응) 평가기관의 평가매뉴얼에 맞춰 평가준비 및 대응(연 1회)

#### < 공약사업 관리 흐름도 >

추진단계	주요내용
공약실천계획 수립 (’22.6월~10월)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공약의 타당성, 실현 가능성, 투자재원의 조달방안 등을 종합적으로 검토 후 수립</li> <li>○ 「도민평가단」 평가 및 「자문평가단」 심의를 거쳐 확정</li> <li>○ 확정된 공약 실천계획은 도 누리집에 공개</li> </ul>
↓	
실천계획 이행 (’22.11월~’26.6월)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공약 실천계획에 따라 사업추진, 이행실적 관리</li> <li>○ 공약사업의 차질 없는 이행을 위한 거버넌스 추진 (제도개선, 업무협약, 주민소통 등 절차 이행)</li> </ul>
↓	
실천계획 변경 (필요시)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정책 환경의 변화 등 불가피한 사유가 발생하여 공약 이행이 어려운 경우</li> <li>○ 「도민평가단」 의견 수렴 후 「자문평가단」 심의·확정</li> <li>○ 변경절차, 변경된 내용 및 사유를 도 누리집에 공개</li> </ul>
↓	
이행상황 점검·평가 (분기별)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 분기별로 공약사업 실천계획상 추진계획 대비 이행실적 자체분석(주관부서)</li> <li>○ 종합 분석 평가 및 도 누리집 공개(정책기획관)</li> </ul>

### □ 금후계획

- 4분기 공약사업 추진상황 점검결과 누리집 공개 : ’24. 1월중
- 메니페스토 실천본부 공약사업 평가 대응 : ’24. 3월
- 1분기 공약사업 추진상황 점검 : ’24. 4월
