

---

2024년 도지사 공약사업 추진상황 점검결과(8월말)  
[ 2022. 7월 ~ 2024. 8월 ]

---

# 목 차

I. 공약사업 개요 .....	1
II. 추진상황 점검결과 .....	2
III. 분야별 추진상황 .....	3
IV. 사업추진 현황 .....	10
□ 이행완료(8개 사업) .....	10
□ 이행 후 계속추진(46개 사업) .....	12
□ 정상추진(70개 사업) .....	26
V. 향후 관리계획 .....	40

# I 공약사업 개요

## □ 사업 개요

- (대상사업) 5개 분야 124개 사업
  - (신규여부) 신규 95, 계속 29
  - (사업기간) 임기내 74, 임기후 계속 50
  - (재정투자) 예산 99, 비예산 25



- (총사업비) 16조 295억원(국비 91,030, 도비 11,201, 시군비 11,920, 기타 46,144)
  - (시기별) 기투자 1조 8,584억원(11.6%) / 임기내 8조 9,410억원(55.8%) / 임기후 5조 2,301억원(32.6%)
  - (재원별) 국비 56.8%, 도비 7.0%, 시군비 7.4%, 민자(기타) 28.8%



## □ 자원투자 계획

(단위 : 건, 억원)

구분	사업수			사업비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	기타
<b>합 계</b>	<b>124</b>	<b>99</b>	<b>25</b>	160,294.91	91,030.19	11,200.31	11,920.08	46,144.33
I. 전북 도민경제 부흥	23	19	4	46,306.54	11,635.87	2,955.14	2,957.90	28,757.63
II. 농생명 산업 수도	19	18	1	9,681.6	5,528	1,807.69	1,583.31	762.6
III. 문화·체육·관광 산업거점 조성	20	18	2	14,717.27	5,462.42	4,160.52	3,787.93	1,306.4
IV. 새만금 도약·균형발전	28	14	14	79,018	63,434	117.8	148.5	15,317.7
V. 도민행복·희망교육	34	30	4	10,571.5	4,969.9	2,159.16	3,442.44	-

## II 추진상황 점검결과

### □ 점검 개요

- (점검기준) 2024. 8월말 기준
- (점검대상) 5개 분야 124개 사업
- (점검근거) 전북특별자치도지사 공약사항 관리조례 제10조(자체평가)
- (점검내용) 사업별 추진실적 및 공약 이행도, 도민소통 실적 등

< 공약 이행도 판단 기준(한국매니페스토실천본부 평가기준 준용) >

이행완료	◦ 공약이행이 완료되어 종료된 사업
이행 후 계속추진	◦ 공약(목표) 이행완료 후 추가목표를 세워 추진 중인 사업 ◦ 공약(목표) 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업
정상추진	◦ 내용이 정상적으로 추진 중이고, 임기종료 시점까지 완료가 예상되는 사업
일부추진	◦ 추진하고 있으나, 예상목표를 달성하지 못하고 있는 사업

(완료 세부기준) 입법 관련 공약 : 법, 조례 통과, 재정관련 공약 : 재정 확보

- 조성사업(산업단지 등) : 입법 및 재정확보 후 사업 개시 / - 건설사업(SOC 도로건설 등) : 입법 및 재정확보 후 사업 개시
- 시설유치 사업 : 입법 및 행정결정 등 완료 시 / - 자본유치 사업 : 양해각서에 그치지 않고 자본유입이 시작되었을 경우
- 건립 공약 : 완공되었을 경우(착공은 정상추진으로 분류) / - 재건축, 재개발 사업 : 입주가 시작되었을 경우(착공은 정상추진으로 분류)

### □ 점검 결과

- (이행률\*) 43.5%
  - 이행완료 8개, 이행 후 계속추진 46개, 정상추진 70개

계	달성		추진중
	이행완료	이행 후 계속추진	정상추진
124	8	46	70

\* 이행률 = [(이행완료 공약수 + 이행 후 계속추진 공약수) / 전체 공약수] × 100


- (분야별 사업 이행상황)

분야별	사업비 (억원)	사업수 (개)	이행(추진)상황		
			이행완료	이행 후 계속추진	정상추진
5개 분야	160,294.91	124	8	46	70
I. 전북 도민경제 부흥	46,306.54	23	3	8	12
II. 농생명 산업 수도	9,681.6	19	-	12	7
III. 문화·체육·관광 산업거점 조성	14,717.27	20	-	7	13
IV. 새만금 도약·균형발전	79,018	28	3	5	20
V. 도민행복·희망교육	10,571.5	34	2	14	18

### Ⅲ 분야별 추진상황

#### □ 연도별 이행률

< 구 분 >	< '23 4분기 >	< '24 1분기 >	< '24 2분기 >	< '24. 8. >
<b>이행률</b>	<b>29%(+11)</b>	<b>35.5%(+6.5)</b>	<b>40.3%(+4.8)</b>	<b>43.5%(+3.2)</b>
이행완료	6개 사업	7개 사업	7개 사업	8개 사업(+1)
이행 후 계속추진	30개 사업	37개 사업	43개 사업	46개 사업(+3)
정상추진	88개 사업	80개 사업	74개 사업	70개 사업
일부추진	-	-	-	-



- **이행완료** : 공약 이행이 완료되어 종료된 사업(**6.5%**)
- **이행 후 계속추진** : 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업 등(**37.1%**)
- **정상추진** : 내용이 정상적으로 추진 중이고, 임기종료 시점까지 완료가 예상되는 사업(**56.4%**)

#### □ 주요성과

- (전북 도민경제 부흥) ① 대기업 계열사 6개 유치(두산, LG화학, GEM 코리아, LSLnF, 삼성, 한국미래소재), ② 글로벌 자산운용사 전주사무소 4개소 유치(BNY멜론자산운용그룹, 프랭클린템플턴, 낙티식스, 블랙스톤) ③ 재생에너지 국가종합실증 연구단지 실증연구동 착공('24.3.) ④ 호남권 AI융합 지능형 농업 생태계 구축 공모 선정('24.4) ⑤ 글로벌 혁신 의료기술 실증지원센터 공모 선정('24.5.) ⑥ 농식품분야 메타버스 기반 기술 실증 지원 공모선정('24.6.) 등 전북 산업활성화 및 기반 구축 ⑦ 금융산업 육성 협력을 위한 '도-우리금융그룹-국민연금공단' 협약 체결('24.6.)



< 한국미래소재 유치 >



< 재생에너지 국가종합실증 연구단지 실증연구동 착공 >



< 농식품분야 메타버스기반 기술실증 지원 공모 >

- (농생명 산업 수도) ① 치유농업 확산을 위한 치유농업센터 공모 선정(23~24) ② GMP기반 농축산용 미생물산업화지원시설 구축(정읍, '22~'24.) ③ 국가 식품클러스터 2단계 국가첨단산단 후보지 선정('23.3.) ④ 동물용 의약품 효능·안전성 평가센터 완공(익산, 24.1.) ⑤ '전북생성장터' 활성화(매출액 : 330억원, 입점업체 : 464개점) 등 농생명 산업 수도로서의 전북 위상 강화



< GMP기반 농축산용 미생물산업화지원시설 >



< 국가식품클러스터 2단계 국가첨단산단 후보지 선정 >



< 동물용 의약품 효능·안전성 평가센터 완공 >

- (문화·체육·관광 산업거점 조성) ① 완주군 종합 스포츠타운 족구장, 농구장, 풋살장 준공('23.6.) ②전주 월드컵 스포츠타운 육상경기장, 야구장 착공('23.6.) ③ 문화 예술 콘텐츠원캠퍼스 최우수사업 선정('24.2) ④ '24 전북형 치유관광지 10개소 선정('24.5.) 등 문화체육 인프라 확충 및 휴양치유관광 등으로 사람과 자본(돈)이 모이는 거점 조성 ⑤ 24년 콘텐츠원캠퍼스 3개 대학(호원대, 전주대, 우석대) 과제운영 협약체결('24.7.) ⑥ 전북 글로벌 마이스 육성센터 설립 및 마이스 비전선포식 개최를 통한 전북자치도 도시브랜드 제고('24.6., 8.)



< 전주 월드컵 스포츠타운 육상경기장, 야구장 착공 >



< 콘텐츠원캠퍼스 공모사업 선정 >



< '24 전북형 치유관광지 선정 >


- (새만금 도약·균형발전) ① 새만금 국제투자진흥지구 지정(23.6.) ② 전북특별자치도 설치 등에 관한 특별법」 제정안(22.12.) 및 「전북특별자치도 설치 및 글로벌 생명경제도시 조성을 위한 특별법」 전부개정안 국회 본회의 통과(23.12.)로 명실상부한 전북특별자치도 출범 기반 마련 ③ 인구청년지원연구센터 설치(24.1.) ④ 새만금 자율운송 상용차 실증지원 인프라 및 통합관제센터 설계 완료(24.1.) ⑤ 새만금 국제공항 실시설계 적격자 선정 및 실시설계 착수(24.6.) ⑥ 새만금 남북3축 간선도로망 연구용역 시행(24.6.) 등 새만금을 미래 신산업 중심지로 조성



< 새만금 투자진흥지구 지정 >



< 전북특별자치도 설치 등에 관한 특별법 통과 >

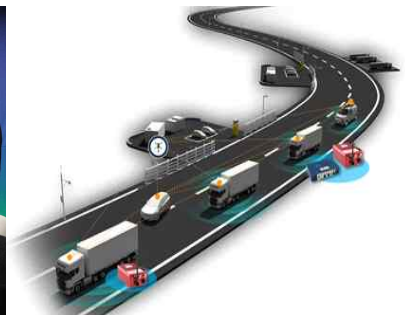

< 새만금 자율운송 상용차 실증지원 인프라 및 통합관제센터 >

- (도민행복·희망교육) ① 공공산후조리원 건립 부지 매입(23.4.) 및 조례 제정(23.5.) ② 서해안 유네스코 세계지질공원 인증 확정(23.5.) ③ 장애인 종합지원센터 설치 운영(24.1.) ④ '24 RIS 핵심분야 및 자율 과제 공모 선정(24.4.) ⑤ 남원 공공산후조리원 건립 공사 착공(24.7.) ⑥ '24 글로벌대학 30(원광대+원광보건대) 최종선정(24.8.) 등 도민이 행복한 전북특별자치도 조성



< 공공산후조리원 건립 >



< 서해안 유네스코 세계지질공원 인증 >



< 장애인종합지원센터 개소 >

## □ 예산확보 현황

○ (총사업비) 16조 295억원

(단위 : 억원, %)

재정계획			확보액				반영률	
총액	임기내 (a)	임기후 (b)	계 (c=d+f)	~'23년 (d)	'24년		임기내 대비 (c/a)	'24년 대비 (f/e)
					계획(e)	확보(f)		
160,295	107,994	52,301	52,953	40,259	21,483	12,694	49	59.1

○ ('24년) 분야별 확보 현황

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	'24년 필요액	'24년 확보액					확보율 (%)
			계	국비	도비	시군비	기타	
합 계	160,294.91	21,483	12,694	6,006	2,204	1,892	2,592	59.1
I. 전북 도민경제 부흥	46,306.54	5,993	1,908	863	461	467	117	31.8
II. 농생명 산업 수도	9,681.60	1,308	888	176	311	222	179	67.9
III. 문화체육관광 산업거점 조성	14,717.27	2,707	1,823	564	837	422	-	67.3
IV. 새만금 도약·균형발전	79,018	9,066	5,872	3,518	35	29	2,290	64.8
V. 도민행복·희망교육	10,571.5	2,409	2,203	885	560	752	6	91.4

## □ 도민소통 실적

○ 도민소통 및 사업 추진을 위한 거버넌스 구축·운영 실적 1,032건

- 전북자치도 항공산업 얼라이언스 UAM협의체 간담회('24.5., 7.), 바이오 생태환경기반조성 사업추진을 위한 전문가 회의('24.6.), 제1회 NPS포럼 협력 증권학회 등 공동심포지엄 개최('24.7.), 치유관광지 맞춤형 컨설팅 설명회('24.7.), 전주~대구 고속도로 건설 대통령 민생토론회 개최('24.7.), 자동차 부품기업·뿌리기업 상생협력 간담회 개최('24.8.), 전북자치도 마이스 활성화 포럼·비전 선포식 개최('24.8.), 전북자치도 복지자원 통합관리 플랫폼 개통식('24.8.)

(단위 : 건)

구 분	사업수	유형별 실적							
		합계	설명회, 토론회 등	만족도 조사	전문가 자문	언론/방송 보도	간담회	보고서 발간	기타
합 계	124	1,032	132	23	115	264	286	4	208
I. 전북 도민경제 부흥	23	273	35	12	23	78	87	-	38
II. 농생명 산업 수도	19	202	30	-	23	43	54	-	52
III. 문화·체육·관광 산업거점 조성	20	153	8	4	19	41	24	3	54
IV. 새만금 도약·균형발전	28	158	45	1	37	34	21	-	20
V. 도민행복·희망교육	34	246	14	6	13	68	100	1	44

## □ 예비타당성조사 대상사업 추진 현황(총 13개 사업)

예타 통과 0

신청준비·완료 1

기획 단계 12

관리번호	공약사업	예타대응 계획	비고
7	특수목적선 선진화단지 조성	◦ 항만기본계획 변경 및 예타대상 사업 선정 등 국가재정사업 반영 추진을 위한 활동 전개	기획단계
18	그린수소 생산클러스터 구축	◦ 예타대상사업 선정('21.8월) ◦ 예타 철회('23.11월) ◦ 예타 재기획용역('24.3.~'25.6.) 및 예타대상사업 신청('26년)	기획단계
19	수소특화 국가산업단지 조성	◦ 제안서 제출('22.10월) ◦ 국가산단업지 후보지 선정('23.3.15.) ◦ 사업시행자 선정('23.4.28.), ◦ 국가산단 성공추진 상생협약 체결('23.7.5.) ◦ 사전타당성 용역 착수('23.12., LH) ◦ 기본협약 체결('24.6.)	신청준비
26	국가식품클러스터 2단계 확장	◦ 1단계 성과분석 및 발전방안 연구용역 추진('23) ◦ 예비타당성 신청 및 입주수요 활동 전개('24~) ◦ 입주수요 조건완화 부처(행안부, 기재부) 건의('24.3.28) ◦ 입주수요 개선건의 부처(행안부, 기재부) 건의('24.4.2~3)	기획단계
44	국립해양문화시설 건립 기본구상	◦ 기본구상 및 사전 타당성 조사 용역 완료 ('23.4.~'24.6., 해양수산부) ◦ 국립해양생명과학관 설립 타당성 사전평가 ('24.9.~'24.11., 과기부)	기획단계
73	새만금 남북3축 도로 건설	◦ 예타 대상사업 선정 신청을 위해 연구용역 시행('24.6.)	기획단계
83	국도13호선 위험구간(장수~천천) 개선	◦ 제6차 국도·국지도 건설계획('26.~'30.) 반영 건의활동 전개 - 제6차 국도·국지도 건설계획 수요조사 제출('23.4.)	기획단계
86	전라선 고속화 추진	◦ 사전타당성조사 완료 후 예비타당성조사 대상사업 건의	기획단계
87	전주~김천간 동서횡단 철도 건설	◦ 사전타당성조사 완료 후 예비타당성조사 대상사업 건의	기획단계
88	국가식품클러스터 산업선 국가계획 반영	◦ 제5차 국가철도망 구축계획('26.~'35.) 반영 건의활동 전개 - 전북권 철도망 구축계획 수립 용역 착수('23.6.)	기획단계
90	전주~대구간 고속도로 건설	◦ 무주~성주 구간 사전타당성 조사용역 추진 건의('24년)	기획단계
109	한국정원산업지원센터 조성 적극 지원	◦ 산림청 예비타당성 대상사업 선정을 위한 건의활동 전개	기획단계
114	산림치유 인프라(지덕권 친환경 산림고원 조성) 확충	◦ '24년 사전타당성용역 추진(산림청) - 전북도 기본용역 내용 반영 및 예타 반영을 위한 지속적 협의	기획단계

## □ 제도개선 추진 실적(총 17개 사업)

제도개선 완료 8(법률 3, 조례 5)

법률 제·개정 추진·준비중 9(법률 6, 조례 3)

관리 번호	공약사업	제도개선사항 추진상황 및 계획	비고
13	새만금 SK데이터센터 조속 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 새만금사업법 개정('22.12.8.)</li> <li>◦ 새만금사업법 시행령 개정 및 시행('23.6.28.)</li> </ul>	법률 개정
43	해양치유 거점단지 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 「전북특별자치도 해양치유자원 관리 및 활용에 관한 조례」 제정 - 해양치유자원의 관리와 필요한 사항을 규정함으로써 치유산업 활성화</li> <li>▣ 조례 제정 완료('23.3.)</li> </ul>	조례 제정
46	지리산권 관광특구단지 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 지리산권 특별자치단체 설치 조례 제정('25년)</li> <li>▣ 5개 지자체(남원,구례,산청,함양,하동) 업무협약('22.12.)</li> </ul>	조례 제정
60	국제 태권도 사관학교 설립	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 태권도 진흥 및 태권도공원 조성등에 관한 법률 개정('26년)</li> <li>▣ 타당성 조사 용역 진행중(문체부)</li> </ul>	법률 개정
63	새만금 국제투자진흥지구 지정	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 새만금사업법, 조세특례제한법 개정('22.12.8.,12.23.)</li> <li>◦ 새만금사업법 시행령 개정 및 시행('23.6.28.)</li> </ul>	법률 개정
66	국제학교 유치	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 내국인 입학제한이 없는 새만금 국제학교 설립을 위한 새만금사업법 개정(안) 제출('23. 2월) 및 전북특별자치도 특례조항 발굴('23. 2월~3월)</li> <li>◦ 국제학교 관련 토론회 개최('23.2.24., 3.15.)</li> <li>◦ 유관기관(도교육청, 전북연, 새만금개발청공사, 부안군) 업무협약(5회)</li> <li>◦ 국제학교 특례조항 관련 부처 협의(교육부/5회)</li> <li>▣ 전북특별자치도 특별법 제정을 위한 입법대응 추진</li> <li>◦ 새만금개발청, 새만금개발공사 협의(2회)</li> <li>▣ 새만금사업법 개정 입법대응 추진</li> <li>◦ 제22대 국회 새만금사업법 개정 발의('24.6.5)</li> <li>◦ 새만금사업법 개정안 국회 국토위 상정('24.8.21)</li> </ul>	법률 개정
74	전북특별자치도 설치	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 전북특별자치도 설치 등에 관한 특별법 제정</li> <li>▣ (발의) 안호영('22.4.12.), 한병도, 정운천('22.8.18.) (본회의 통과) '22.12.29.</li> <li>◦ 전북특별자치도법 전부개정안 국회 본회의 통과('23.12.)</li> </ul>	법률 제정
75	완주·전주 상생 협력추진 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 통합시법 제정('25년)</li> </ul>	법률 제정

관리 번호	공약사업	제도개선사항 추진상황 및 계획	비고
96	글로벌 청소년 인재 양성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 「글로벌 청소년 리더센터 운영 관리 조례」 제정 예정(24하반기)</li> <li>▣ 글로벌 청소년 리더센터 운영 근거 마련</li> <li>▣ 청소년수련시설 설치 및 운영 조례안 입법예고(24.7.19~8.8)</li> </ul>	조례 제정
97	신혼부부·청년 임대주택 임대보증금 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 전북특별자치도 저소득계층과 청년 및 신혼부부 주거 지원 조례 개정</li> <li>▣ 조례 공포·시행('23.3.3.)</li> </ul>	조례 개정
99	1인 가구 주거 안전 방문 지키미 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 「전북특별자치도 1인가구 지원 조례」 제정('22.11.)</li> <li>▣ 1인가구 주거 안전 방문지킴이 지원사업 추진('23년~)</li> </ul>	조례 제정
100	전라북도 일·생활 균형 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 전라북도 일·생활 균형 지원에 관한 조례 제정</li> <li>▣ 공포 및 시행('23.10.4. 시행)</li> </ul>	조례 제정
105	다문화가정 원스톱 지원 서비스 고도화	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 전북특별자치도 광역가족센터 운영 지원 조례 제정('24년)</li> <li>▣ 개정 준비중</li> </ul>	조례 제정
119	국립공공보건의료대학원 설립	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 국립의학전문대학원법 제정('24년)</li> <li>▣ 국회 복지위 제2법안소위 안건 상정 및 심사('24.8.23.)</li> </ul>	법률 제정
120	디지털 헬스케어 시범사업 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 「디지털 헬스케어 진흥 및 보건의료데이터 활용 촉진에 관한 법률」 제정</li> <li>- 디지털 헬스케어 사업 추진 및 활성화를 근거 마련</li> <li>▣ 발의('22.10.)</li> </ul>	법률 제·개정
122	공공산후조리원 건립	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 전북특별자치도 공공산후조리원 설치·운영 등에 관한 조례 제정 완료('23..5.8.)</li> <li>▣ 공공산후조리원 건립 추진('24년~)</li> </ul>	조례 제정
124	지역발전 생태계 조성을 위한 지역대학 경쟁력 제고	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 고등교육위원회 구성을 위한 지방대육성법 개정('24년)</li> <li>▣ 준비중</li> </ul>	법률 개정

# IV

## 사업추진 현황

### □ 이행완료 : 8개

관리번호	사업명	공약목표 및 추진상황
2	대기업 계열사 유치 추진 전담조직 구성 및 거버넌스 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 기업유치 전담조직 구성 및 거버넌스 구축</li> <li>▣ 도지사 직속으로 전문조직(기업유치, 기업지원, 애로해소) 구성·운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1사 1공무원 담당제 추진</li> </ul> </li> <li>▣ 기업유치 관련 위원회(11개) 활용계획 수립 및 전문가 세미나 개최</li> </ul>
8	현대중공업 군산조선소 재가동	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 현대중공업 군산조선소 재가동('23년)</li> <li>▣ 군산조선소 사내협력사 선정(13업체), 사내협력사 직원 모집(22.7.~11.)</li> <li>    군산조선소 재가동 선포식('22.10.28.)</li> <li>    군산조선소 본격 가동으로 생산된 블록 출항식('23.2.10.)</li> </ul>
10	메타버스 융복합 산업 육성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 메타버스 플랫폼 구축 3건</li> <li>◦ (목표) 메타버스 콘텐츠 제작지원 20건</li> <li>▣ 메타버스 플랫폼 구축 2건 완료, 콘텐츠 제작 지원 20건 완료               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 새만금 잼버리 메타버스 서비스 제공('23.6.8.)</li> <li>- 한옥마을 메타버스 플랫폼 구축('23.12.)</li> <li>- 메타버스 활용 콘텐츠 제작 지원('22년 10건, '23년 10건)</li> </ul> </li> <li>▣ 전주-익산 도서관 여행 메타버스 구축사업 중간평가('24.4.)</li> <li>▣ 한옥마을 메타버스 플랫폼 구축 홍보회의('24. 6.)</li> <li>▣ 한옥마을 메타버스 플랫폼 서비스 오픈('24. 8.1.)</li> </ul>
63	새만금 국제투자진흥지구 지정	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 글로벌 기업유치 등을 위한 인센티브 마련 등 국제투자 진흥지구 지정('26년)</li> <li>- (세제) 입주기업에 법인·소득세 등 감면</li> <li>- (입지) 장기임대용지 추가공급</li> <li>- (기업활동) 항만·공항 배후 산업단지 자유무역지역 지정 추진 및 규제개선</li> <li>▣ 새만금사업법, 조세특례제한법 개정('22.12.8.,12.23.)</li> <li>    투자진흥지구 지정 관련 새만금사업법 시행령 개정 및 시행('23.6.28.)</li> <li>    새만금투자진흥지구 지정('23.6.28.)</li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
74	전북특별자치도 설치	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) “전북특별자치도 특별법” 제정</li> <li>▣ 국회 통과('22.12.29.)</li> <li>▣ 전북특별법 1차 개정('23.) 후 전북특별법 전부개정안 마련 (232개 조문)</li> <li>▣ 전북특별법 전부개정안 국회 본회의 통과('23.12.8.) (131개 조문/333개 특례)</li> <li>▣ 전북특별자치도 종합발전 방안 용역 추진('23.3.~'24.3.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도민인식 조사, 광역단위 특례 발굴, 법률 및 제도개선 사항 마련 등</li> </ul> </li> </ul>
81	익산시 구도심 도시재생사업 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 도시재생 뉴딜사업 성과평가 추진(완료 및 '23년 완료예정인 9개 사업 평가)</li> <li>◦ (목표) 익산시 중앙동 도시재생사업 완료('23년) <ul style="list-style-type: none"> <li>- (HW) 거점시설 및 공공시설 준공</li> <li>- (SW) 창업지원 및 문화축제 등 공동체 활성화 지원</li> </ul> </li> <li>▣ 도시재생 뉴딜사업 9개 사업 성과평가 완료('22년)</li> <li>▣ 증매서 커뮤니티라운지 및 문화주차장(1공구) 조성 등('22년 준공), 음식식품 교육문화원 조성 및 운영('23.7.~), 문화주차장(2공구) 준공('23.12.), 중앙동 도시재생사업 완료('23.12.), 거점시설 프로그램·축제 및 행사·도시재생대학 운영 추진('23년~)</li> </ul>
93	장애인 종합지원센터 건립	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 장애인종합지원센터 설치</li> <li>▣ 6개동(탈시설, 재활치료, 체험홈4) 리모델링 공사 완료('23.12.)</li> <li>▣ 운영주체 선정 및 위수탁 계약 체결('23.9.)</li> <li>▣ '24년 공공기관 위탁 심의 및 의회 동의('23.10.)</li> <li>▣ '24년 운영 위수탁 협약 체결(도·사회서비스원) ('23.12.)</li> <li>▣ 직원 채용(10명)및 개소 준비(환경구성, 물품구입 등)('23.10.~'24.3.)</li> <li>▣ 장애인종합지원센터 개소식('24.4.16)</li> <li>▣ 타 시도 벤치마킹('24.6.7)</li> </ul>
108	전북 서해안 유네스코 세계 지질공원 인증	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 전북 서해안(고창, 부안군) 유네스코 세계지질공원 인증 1개소</li> <li>▣ 유네스코 심사위원 현장실사('22.9.30.~10.3.)</li> <li>세계지질공원 이사회 인증 권고(안) 확정('22.12.7.)</li> <li>유네스코 집행이사회 인증 최종 의결('23.5.18.)</li> </ul>

## □ 이행 후 계속추진 : 46개

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
1	5개 대기업 계열사 유치로 양질의 일자리 확충	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 대기업 계열사 5개 유치</li> <li>▣ 6개사 유치 : 두산, 삼성, LG화학, LS-L&amp;nF배터리솔루션, LSMnM, 한국미래소재</li> </ul>
3	지방-산업-대학 연계형 인력양성 시스템 및 지원체계 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 지자체 전북지역 혁신플랫폼(50개 기관) 구축·운영</li> <li>◦ (목표) 기업수요 맞춤형 전문인력 양성(매년 1,100명 이상)</li> <li>▣ '23년 RIS 신규지역 공모 최종 선정(국비 1,500억원 확보) RIS 실행계획 최종 제출('23.7.18), RIS 대학교육 혁신본부 및 3개 사업단 조직(8월) RIS 지역혁신 자율과제 공모 선정(239), 사업단별 기업수요 맞춤형 MOU 체결(23.10~11)</li> <li>▣ 기업수요 맞춤형 인력양성 : ('22년) 1,231명, ('23년) 1,150명</li> <li>▣ JST 공유대학 학생모집(262명) 개강(3.4)</li> <li>▣ RIS 핵심분야 45개 소과제 추진('23.8~'24.2)</li> <li>▣ 시군 현안해결형 자율과제(31개) 발굴 및 추진('23.9~'24.2)</li> <li>▣ '24년 대학 산학관 커플링 15개 사업단 선정('24.1)</li> <li>▣ 'JST 공유대학' 학생모집 홍보 및 선발(265명)('24.1~2월)</li> <li>▣ RIS 핵심분야 1차 과제공모(2~3월) 및 선정(22개 77억원)('24.4.19)</li> <li>▣ RIS 핵심분야 2차 과제공모(5월) 및 선정(87개 139억원)('24.6.21)</li> <li>▣ 'JST 공유대학' 2학기 추가모집(36명 추가, 총287명)('24.8.7)</li> </ul>
4	취업경쟁력 강화를 위한 청년인턴 확대	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 취업 경쟁력 강화를 위한 청년인턴 5,000명 확대</li> <li>- ('22년) 760명, ('23년) 850명, ('24년) 950명, ('25년) 1,100명, ('26년) 1,440명</li> <li>▣ 도 대학생 직무인턴 : ('22년) 262명, ('23년) 312명, ('24년) 320명</li> <li>▣ 고용노동부 국민취업지원제도 활용 : ('22년) 500명, ('23년) 570명 ('24년) 334명</li> </ul>
6	청년 생활안정 기반 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 전북형 청년수당 매월 30만원, 최대 12개월 지급</li> <li>- ('22년~'23년) 2,500명 → ('23년) 사회보장협의를 → ('24년~'26년) 매년 3,000명</li> <li>◦ (목표) 전북형 청년활력수당 매월 50만원, 최대 6개월 지급</li> <li>- ('23년) 사회보장협의를 → ('24년~'26년) 매년 2,000명</li> <li>◦ (목표) 전북청년 함께 두배적금 매월 최대 10만원, 최대 24개월 지원</li> <li>- ('23년) 사회보장협의를 → ('24년) 500명 → ('25년~'26년) 매년 1,000명</li> <li>▣ 청년수당 지원('22년 2,410명, '23년 3,000명 '24년 3,000명)</li> <li>▣ 청년활력수당 지원('23년 2,000명, '24년 2,000명)</li> <li>▣ 청년 함께 두배적금 지원('23년 301명, '24년 1,000명)</li> <li>▣ '24년 전북청년 지역정착 지원사업 참여자 만족도 조사('24.7.~8.)</li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
11	새만금 도심항공교통(UAM) 버티포트 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 국토부 비수도권 지역특화 시범사업 공모 선정('26. 상반기)</li> <li>◦ (목표) 드론/UAM 전문가 포럼 4회(연 1회) 개최</li> <li>▣ 2022년 전주 국제 드론산업 박람회 추진('22.12.9.~12.10.)</li> <li>▣ 남원시 항공산업(드론-UAM) 클러스터 조성 연구용역('22.10~'23.1.)</li> <li>▣ 전주 드론-UAM 산업 육성 기본계획 수립 연구용역 진행중('23.7.~'24.6.)</li> <li>▣ 전라북도 UAM협의체 회의 운영('23.3.17./ 7.14. 24. 5.23)</li> <li>▣ UAM 실증 서비스 기반 구축 및 관련산업 육성방안 연구용역 수행('24.4.~'24.12.)</li> <li>▣ UTK 핵심참여기관 승격('24. 3.)</li> <li>▣ 도·새만금개발청·K-UAM드림팀 업무협약 체결('24. 4.15.)</li> <li>▣ 항공얼라이언스 UAM 협의체 간담회('24.5./'24.7.)</li> <li>▣ UTK 사업모델 워킹그룹 참여('24.5)</li> <li>▣ UAM 실증사업 참여 인원 UAM협의체 위원 추가위촉('24. 9.)</li> </ul>
20	새만금 재생에너지 클러스터 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 신재생에너지 평가·인증센터 구축 5개소</li> <li>◦ (목표) 혁신 인프라 및 기반 구축 3개소</li> <li>◦ (목표) 태양광·해상풍력 전문인력 1,800명 육성(유지보수 1,600명, 석박사 200명)</li> <li>▣ 신재생에너지 평가·인증센터 구축(완료 4개소, 설계용역 완료 1개소) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고분자연료전지 신뢰성평가센터 준공('21.8.) 및 장비 구축(42종 83기, '24.6.)</li> <li>- 새만금 신재생에너지산업 전문인력양성센터 준공('23.5.)</li> <li>- 수상형태양광 종합평가센터 구축 완료('23.12.)</li> <li>- 해상풍력산업지원센터 설계용역 재개('24.5.)</li> <li>- 새만금 에너지산업융복합단지 종합지원센터 준공('24.6.)</li> </ul> </li> <li>▣ 혁신 인프라 및 기반 구축(완료 1개소, 구축중 1개소, 설계용역 추진 1개소) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 새만금 스마트그린 국가시범산단 지정승인(국토교통부, '22.7.)</li> <li>- 재생에너지 국가종합실증연구단지 토목공사(연약지반 개량공사) 착공('23.9.)</li> <li>- 새만금 스마트그린 국가시범산단 정보화전략계획 수립 완료('23.12.)</li> <li>- 재생에너지 국가종합실증연구단지 실증연구동 착공('24.3.)</li> <li>- 조선기자재기업 신재생에너지 업종전환지원 사업 완료('24.6.)</li> </ul> </li> <li>▣ 태양광·해상풍력 유지보수 전문인력 육성('22년 618명, '23년 645명, '24년 133명)</li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
21	자산운용 중심 특화 금융도시 육성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 자산운용사 등 금융관련 기관 집적화를 위한 인프라 개선</li> <li>◦ (목표) 금융혁신 생태계 육성(금융혁신기업 육성 40개사)</li> <li>▣ 전북 혁신도시 내 금융 혁신기업 공유오피스 조성 완료('23.11.)</li> <li>▣ 금융혁신 스타트업 육성 활성화 추진('24년 연중) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전북 혁신도시 내 금융 혁신기업 공유오피스 조성 완료('23.11월)</li> <li>- 금융혁신 스타트업 육성('19년~, 월12개사 / 기업당 5천만원 이내)</li> <li>- 금융혁신 빅데이터 활성화(역량교육, 경진대회, 데이터 안심구역 운영) 5억원, 국가데이터안심구역 지정(과기부), 통계데이터센터 구축(통계청) 등 연계 기반 마련</li> </ul> </li> <li>▣ 글로벌 자산운용사 전주사무소 추가 개소('22년 이후 4개소) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 나티시스('23.6월), BNY멜론 자산운용그룹('23.7.), 프랭클린템플턴('23.8.), 블랙스톤('24.1월)</li> </ul> </li> <li>▣ 금융산업 육성 협력을 위한 '도-우리금융그룹-국민연금공단' 협약 체결(24. 6) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국민연금 빅데이터 활용 新사업 발굴, 핀테크기업 디노랩 설치, 금융교육 등</li> </ul> </li> <li>▣ 금융산업 육성 특례(5개 조항) 반영에 따른 후속절차 이행 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 특례 구체화를 위한 계획수립 및 조례 개정 추진(24.7월~)</li> </ul> </li> <li>▣ 도민 금융역량 강화를 위한 금융교육 추진('24.4) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도민맞춤형 실용금융교육 추진('24.4~), 글로벌대학 과제 발굴('24.7월)</li> </ul> </li> </ul>
22	금융공공기관 유치 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 타깃 공공기관 선정(토론회 5회)</li> <li>▣ 전라북도 금융도시 추진위원회 출범('23.2.) <ul style="list-style-type: none"> <li>한국투자공사 이전 촉구 성명(2회/'23.3월,6월)</li> <li>한국투자공사 전북 이전 법개정안 대표발의(양경숙의원, '23.5.)</li> </ul> </li> <li>▣ 금융 공공기관 이전 네트워크 활동 및 대내외 협력 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공공기관 이전 공감대 확산을 위한 토론회 개최(연1회 이상)</li> <li>- 금융도시추진위원회(위원장:도지사) 회의 개최(2회 / '23.2월·6월)</li> <li>- 22대 총선 여야 공통 공약 반영(한국투자공사 및 7대 공제회 이전)('24.4월)</li> <li>- 금융 공공기관 유치를 위한 新금융모델 구체화 연구용역(~'24.9.)</li> </ul> </li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
26	국가식품클러스터 2단계 확장	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 국가식품클러스터 2단계 확장(302만m) 예비타당성 조사 신청 및 선정 건의</li> <li>▣ 국가식품클러스터 성과분석 및 발전방안 연구용역비 확보(5억원) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국가식품클러스터 성과분석 및 발전방안 용역 착수보고회('23.3.)</li> <li>- 연구용역 중간보고회('23.6.)</li> </ul> </li> <li>▣ 국토부 신규 국가산단 후보지 2단계 확장 선정('23.3.)</li> <li>▣ 연구용역 관계기관 워크숍('23.5.)</li> <li>▣ 농식품부 1단계 성과분석 및 발전방안 타당성 용역 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국가식품클러스터 성과분석 및 타당성 용역 킷오프 및 착수보고회('23.3.), 중간보고회('23.6.)</li> <li>- 농식품부 2단계 확장 정책결정 및 국클 활성화 방안 도출('23.8)</li> </ul> </li> <li>▣ 국토부(LH) 국가식품클러스터 2단계 사전 타당성 용역 추진 중(23.11~'25.10) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2단계 사전 타당성 용역 착수보고회('23.12)</li> </ul> </li> <li>▣ 예비 타당성 조사 신청을 위한 입주수요 조건원화 부처(행안부, 기재부) 건의(24.3)</li> <li>▣ 입주수요 개선건의 부처(행안부, 기재부) 건의('24.4.2~3)</li> <li>▣ 신규 국가산업단지 범정부 추진지원단 회의(국토부)('24.5.22)</li> <li>▣ 국토도시실장 현장점검(국토부, 도, 익산시, LH)(24.6.12)</li> <li>▣ 국토정책관 현장방문(국토부, 도, 익산시, LH)(24.7.23)</li> </ul>
28	순창 전통장류 지역미생물 실증단지 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 지역별 전통장류 맞춤형 균주 및 생산공정 개발 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전국 9개 권역 전통장류 표준생산모델 5건, 표준균주 27균주 확보</li> <li>- 지역 전통장 복원 프리미엄 제품 10건</li> </ul> </li> <li>▣ 농식품부 타당성 용역 추진(15억원/발효미생물산업진흥원/'23.12~'24.5.)</li> <li>▣ 기재부, 국회에 국가예산 건의 추진('24.5~)</li> <li>▣ '25년 국비 확보를 위한 국비확보('24.9.5, 예산정책협의회)</li> </ul>
30	애그테크 기반 연구	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 애그테크 기반 연구를 통한 품종 및 기술개발 : 21품종, 28기술</li> <li>▣ 첨단육종 기술 활용 품종개발('22년 2품종, '23년 신품종 4종) <ul style="list-style-type: none"> <li>- ('22년) 파프리카 2품종(「미네르바 레드」, 「미네르바 골드」)</li> <li>- ('23년) 프리지아 2품종(스윗드림, 스노우보이즈) 국회(핑크윈드) 파프리카(레이골드)</li> </ul> </li> <li>▣ 스마트 정밀농업 기술개발('22년 2건, '23년 3건) <ul style="list-style-type: none"> <li>- ('22년) 파프리카 하우스 이중차광 조건 설정, 차광에 의한 환경개선 효과</li> <li>- ('23년) 파프리카 배양액 내 병원균 정보, 농업기상재해 조기경보 활용방법, 딸기 꽃눈분화 판별 기준</li> </ul> </li> <li>▣ 환경친화 기술개발('22년 1건, '23년 3건) <ul style="list-style-type: none"> <li>- ('22년) 콩 재배시 가축분퇴비 사용 토양탄소 증대 및 수량 확보 효과</li> <li>- ('23년) 농산부산물 발생 추정량 및 바이오차 생산 잠재량, 바이오차 성분특성 정보</li> </ul> </li> <li>▣ '24년 애그테크 기반 신규과제 발굴(5과제) 및 계획수립(31과제) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신규과제: 상추 생육관리 모델(2과제), 수박 신품종 육종(2과제), 버섯 등 5과제</li> <li>- 계획수립·선정: 첨단육종 7과제, 스마트정밀 12과제, 환경친화 10과제</li> </ul> </li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
31	K-스마트팜 확대 조성 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 시설원예 스마트팜 면적 확대(매년 12ha)</li> <li>◦ (목표) 자원순환형 에너지시설 지원(매년 4ha)</li> <li>▣ ('22년) 스마트팜 시설보완(9ha), 청년창업 스마트팜(3ha), 자원순환형 스마트팜(4ha) 조성</li> <li>▣ ('23년) 스마트팜 시설보완(10ha), 청년창업 스마트팜(4ha), 자원순환형 스마트팜(5ha) 조성</li> <li>▣ ('24년) 스마트팜 시설보완(10ha), 청년창업 스마트팜(4ha), 자원순환형 스마트팜(5ha) 사업대상자 선정</li> </ul>
32	장수 임대형 스마트팜 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 임대형 스마트팜 4ha 조성</li> <li>▣ (1단계) 기본계획 수립 및 승인, 실시설계, 중앙투자심사 승인 등 사전 행정절차 이행완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실시설계 및 용역사 선정('22.)</li> <li>- 임대형 스마트팜 협의회 개최(4회), 사업 시행계획 승인 및 고시(23. 5월)</li> <li>- 실시설계 완료 및 기반조성 착공(23.7월)</li> <li>- 건축공사 시공사 선정 및 착공(24. 3월)</li> </ul> </li> <li>▣ (2단계) 부지확보 및 기본계획 수립('23.7.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도 투융자심사 승인(23. 8.)</li> <li>- 동부권발전사업 승인 및 예산반영('23.12.)</li> <li>- 실시설계 및 용역사 선정('24.3월)</li> <li>- 저탄소에너지 공동이용시설 지원 공모 선정('24.4월)</li> <li>- 시행계획 승인 및 고시('24.5월)</li> </ul> </li> </ul>
33	부안 친환경 스마트 농업 확산	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 시설원예 스마트팜 4ha 조성(매년 1ha, '23년~'26년)</li> <li>▣ '22년 스마트팜 환경(ICT기자재 지원) 1ha 조성</li> <li>▣ '23년 청년창업 스마트팜 패키지 지원사업 1개소 포함 1ha 조성</li> <li>▣ '24년 청년창업 스마트팜 패키지 지원사업 2개소 포함 1ha 대상자 선정</li> </ul>
35	임실 치즈 명소화	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 치즈산업 기반 확대 및 임실군 식품산업 고도화 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 식품 기업 2개소 추가 창업</li> <li>- 상품화 시설 건립 1개소, 제품 개발 및 특허 등록 20건</li> <li>- 임실N치즈 홍보마케팅 30회</li> </ul> </li> <li>▣ 상품화 시설 건립공사 준공('23.)</li> <li>▣ 임실N브랜드 홍보 및 마케팅 추진 28회</li> <li>▣ 제품 개발 및 특허 등록 8건</li> <li>▣ 임실N치즈클러스터사업단 운영, 유가공업체 시설개선지원 등 사업추진(241~)</li> <li>▣ 동부권 식품클러스터 육성 실무위원회('24.3.)</li> <li>▣ 유가공업체 시설 지원('24.2.~6.)</li> </ul>
37	반려동물 특화단지 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 반려동물 지원센터 조성 1개소</li> <li>◦ (목표) 반려동물 동반 국민여가캠핑장 조성 1개소</li> <li>◦ (목표) 반려동물 산업단지(오수제2농공단지) 조성</li> <li>▣ 반려동물 지원센터 준공('23.12.)</li> <li>▣ 반려동물 동반 국민여가캠핑장(공정률 85%)</li> <li>▣ 반려동물 산업단지 조성 완료('23.9.)</li> <li>▣ 반려동물 지원센터 운영('24.7.~) 및 국민여가캠핑장 공사 추진('24.9.~)</li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
38	치유농업 기반 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 치유농장·마을, 목적형 농장 조성 등 치유농업 시범사업 70개소</li> <li>◦ (목표) 치유농업 연구개발 및 보급, 교육 등 치유농업센터 구축 1개소</li> <li>◦ (목표) 치유농업 서비스 제공 및 확산 전문인력 양성 400명</li> <li>▣ 치유농장 및 마을 등 기반 확대('22년 13개소/ '23년 18개소)</li> <li>* 치유농업 기반조성을 위한 사업대상자 심사 및 선정(16개소)</li> <li>▣ 치유농업 활용 기술개발('22년 4건, '23년 10건)</li> <li>* 곤충활용 치유프로그램 적용을 위한 치유농업 연구개발(5건)</li> <li>▣ 치유농업 전문인력 양성('22년 90명, '23년 86명)</li> <li>* 치유농업사 지원(4~7월), 품질인증 대비 농장주교육(7~8월), 보수교육(4회)</li> <li>※ ('24년 8월말 기준 추진상황)</li> <li>- 전북형 치유농업 확산을 위한 치유농업센터 공사 설계용역('24.7.~)</li> <li>- 치유농업 서비스 품질 향상을 위한 치유 전문인력 양성* : 2과정</li> <li>* 치유농업사 양성 및 활성화 지원(4~7월, 23명/ 8월, 22명), 치유농장 브랜드 교육(4~5월, 68명)</li> </ul>
40	순창 전통장류 브랜드 파워 강화	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 장담그기, 장문화학교 연 30회 운영(총 150회)</li> <li>◦ (목표) 장독대 공원 조성('25년)</li> <li>◦ (목표) 발효아카데미 연 2회 운영(총 10회)</li> <li>▣ 장담그기, 장문화 학교 172회 운영('22년 47회, '23년 60회, '24년 65회)</li> <li>▣ 장독대 공원 부지 확정</li> <li>▣ 발효아카데미 운영 10회 운영('22년 4회, '23년 4회, '24년 2회)</li> <li>▣ 발효테마파크 조경·경관개선 마스터플랜 수립용역 착수('24. 1~7.)</li> <li>▣ 장독대공원 조성 기본계획 수립 및 설계용역 공모('24. 8~11.)</li> </ul>
41	완주 로컬푸드 활성화 적극 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 완주 로컬푸드 활성화 4년간('23년~'26년) 5.2억원 투자</li> <li>- 농가조직화 2,100명, 생산자-소비자 교류활동 4회</li> <li>▣ ('23년 추진결과)</li> <li>- 기획생산 경쟁력 강화 : 농가조직화 14회 및 직원 역량강화 4회</li> <li>- 관계시장 확대 : 홍보책자 5000부 제작, 관계시장 교류사업 31회, 안전성검사 18회</li> <li>- 로컬푸드 조직화 : 순회수집차량 운영 2개소, 통합교육 416명(6회)</li> <li>- 생산소비 교류확대 : 모니터단 회의(6회), 농사체험(6회), 요리교실(6회), 식농·식생활 교육(9회, 196명)</li> <li>▣ ('24년 8월말 기준 추진상황)</li> <li>- 기획생산 경쟁력 강화 : 거버넌스 회의 (2회) 로컬푸드 참여농가 역량강화 교육(2회) 저장농산물 간담회(1회)</li> <li>- 관계시장 확대 : 운영주체 실무협의(2회), 친환경농산물 안전성검사(64건)</li> <li>- 로컬푸드 조직화 : 순회수집차량 운영(4월~), 생산자 통합교육 136명(3회)</li> <li>- 생산소비 교류확대 : 모니터단 발대식(1회), 모니터단 정기회의(1회), 식농교육 (44명/3회)</li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
42	전북 농수산물 가공식품 플랫폼 활성화	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 온라인 유통 혁신기업 협력사례 발굴 12건('23년~'26년, 매년 3건)</li> <li>◦ (목표) 온라인 몰 '전북생생장터' 입점업체 확대 60개점('23년~'26년, 매년 15개점)</li> <li>▣ 전자상거래 및 오픈마켓, 지역 농축수산물식품생산법인 등과 협업 사례 3건 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신규채널 발굴(지마켓, 옥션) 네이버 라이브커머스 협업, 마켓경기 협업 프로모션</li> </ul> </li> <li>▣ 입점업체 확대('23년 66개) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 축·수산 8, 가공·건강식품 31, 과일·채소 21, 쌀 3, 전통장·김치 3</li> </ul> </li> <li>▣ 매출액 189억원(전년 대비 142% 증가) 및 회원 수 25,794명(전년 대비 34% 증가) <ul style="list-style-type: none"> <li>시군 연계 기획전 진행(6회), 유관기관 협업 한가위 큰장터 운영(1회)</li> </ul> </li> <li>▣ 시·군 연계 프로모션(전북맛보고가게) 추진(김제시 2회, 고창군 1회)</li> <li>▣ 전북생생장터 외부채널 프로모션 추진(쿠팡 4회, 우체국 4회, 11번가 2회)</li> <li>▣ 온라인 유통 혁신기업 협력사례 발굴 2건 : 신규채널 발굴 및 협업 프로모션(8G 배반)</li> </ul>
47	치유관광산업 육성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 전북 '특화 치유관광지' 기반시설 5개소 구축</li> <li>◦ (목표) '전북 치유관광지' 30개 선정 : 매년 10개 선정('23.~'25년)</li> <li>◦ (목표) 치유관광 상품 20개 개발 : 매년 5개 개발</li> <li>▣ 전북 치유(웰니스)관광 거점지역 육성 용역 추진('22.11.~'23.9.)</li> <li>▣ 문체부 '웰니스·의료관광 융복합 클러스터' 공모사업 선정('23.3.)</li> <li>▣ '23년 치유관광지 10개 선정 및 치유관광상품 8개 개발·운영</li> <li>▣ '24년 치유관광지 10개 선정('24.5.)</li> <li>▣ 임실군 치유관광지 기반조성사업 재정투자심사 통과('24.6.)</li> <li>▣ 정읍시 치유관광지 기반조성사업 재정투자심사 재의뢰 준비('24.4.~'12.)</li> <li>▣ '24년 치유·의료관광 융복합 클러스터 사업 추진('24.9.~)</li> </ul>
55	대학 연계 문화예술 콘텐츠 교육 플랫폼 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 대학 연계 창의적 융합(인문+공학+디자인+예술) 인재양성 및 청년 인턴십/기업 연계 일자리 지원을 위한 교육 플랫폼 구축 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 창의인재 거버넌스 구축('23년), 인재교육 500명 및 취업지원 200명('23년~'26년)</li> </ul> </li> <li>▣ 문체부 공모사업 '콘텐츠원캠퍼스 구성운영 지원사업' 선정 (국비 2.5억원, 도비 3억원 반영)</li> <li>▣ K-컬처 공유험력대학 협의회 구성 MOU(호원대, 군산대, 원광대) 체결('23.8.)</li> <li>▣ 전북 창의인재육성 산·학·관 거버넌스 구축회의 개최('23.11.28.)</li> <li>▣ 콘텐츠원캠퍼스 성과전시회·토크콘서트 개최('23.12.13.)</li> <li>▣ '23년 인재교육 197명, 취업지원 58명</li> <li>▣ 문체부 공모사업 '콘텐츠원캠퍼스 구축운영 지원사업' 연속선정 (국비 2.4억원, 도비 2.4억원 반영)</li> <li>▣ 2024 콘텐츠원캠퍼스 참여대학 사업운영 회의('24.5.22./6.20.)</li> <li>▣ 2024 콘텐츠원캠퍼스 3개대학(호원대, 전주대, 우석대) 협약체결('24.7.)</li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
56	폐공장 등 활용 문화적 도시재생 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 폐산업시설 문화재생 공간 조성 3개소, 소규모 문화예술공간 구축 2개소</li> <li>▣ '22년 폐산업시설문화재생 공간 조성 완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전주 서브컬처 복합문화공간 조성(남부시장 구.원예공판장)</li> </ul> </li> <li>▣ '23년 소규모 문화예술공간 사업지 공모 선정(군산, 익산, 남원) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도비 500백만원(군산 285, 익산 99, 남원 116) 지원</li> </ul> </li> <li>▣ '23년 소규모 문화예술공간 만족도 조사(2회/1, 12월)</li> <li>▣ '24년 폐교활용 유휴공간 문화재생공간 조성 1개소(군특 15억) 지원('23.9) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 임실(구. 관촌 상월분교)</li> </ul> </li> <li>▣ '24년 임실 폐교활용 유휴공간 문화재생공간 현지실사 등 점검('24.3)</li> <li>▣ 사업 현장 지도점검(군산시·익산시)('24.6.)</li> <li>▣ 소규모 문화예술공간 사업 추진현황 점검('24.8., 남원)</li> <li>▣ 소규모 문화예술공간 사업 설계 및 예산 변경('24.8., 익산)</li> </ul>
57	전북 글로벌 MICE 육성센터 설립·운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 전북 글로벌 MICE 육성센터 설립</li> <li>▣ 전북 글로벌 MICE 육성센터 설립 기본구상 용역 완료('22.12.~'23.5.) <ul style="list-style-type: none"> <li>착수보고('23.2.), 중간보고('23.4.), 용역 완료('23.5.)</li> </ul> </li> <li>▣ '23년 전북 MICE 전문인력 양성(30명) 추진계획 수립('22.12.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- '23년 전북 MICE 전문인력 운영기관(전북마이스발전협의회) 선정('23.4.) 및 교육생 모집·홍보('23.6.)</li> <li>- '23년 전북 마이스 전문인력 양성(50명) 참가자 모집('23.9.)</li> </ul> </li> <li>▣ 전북 마이스 지원협의회 개최 및 육성센터 설립 자문 청취('23.9.)</li> <li>▣ 마이스 육성센터 설립 관련 전북문화관광재단 실무협의('23.9.)</li> <li>▣ 전북 글로벌 마이스 육성센터 설립(안) 보고('23.9.)</li> <li>▣ 재단내 육성센터 설립 위한 조직 신설 및 정원증원 예산과 협의('23.10.)</li> <li>▣ 마이스 육성센터 운영 인건비 '24년 예산 반영(의회 전액삭감) ('23. 12.)</li> <li>▣ 재단내 육성센터 설립 위한 조직신설 및 정원증원 협의 요청(예산과) (24. 3.)</li> <li>▣ 육성센터 인건비(재단 출연금) 추경 확보 사전활동 전개(예산과, 의회) (24. 3.)</li> <li>▣ 재단 정원 증원 및 조직 신설('24. 6.)</li> <li>▣ 전북특별자치도 마이스 비전선포식 개최('24. 8.)</li> </ul>
58	전주 월드컵 스포츠타운 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 전주 월드컵 스포츠 타운 조성('27년 개관) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 육상경기장, 야구장, 실내체육관 건립 시행</li> </ul> </li> <li>▣ '23년 국가예산 확보(육상경기장 27억원, 야구장 30억원)</li> <li>▣ 육상경기장, 야구장, 실내체육관 설계용역 완료('22.12.)</li> <li>▣ 육상경기장 및 야구장 착공('23.6.)</li> <li>▣ '24년 국가예산 확보(육상경기장 36억원, 야구장 30억원)</li> <li>▣ 육상경기장 및 야구장 건립 공정률 10%('24.3.)</li> <li>▣ 육상경기장 및 야구장 건립 공사착공('23.6)</li> <li>▣ 실내체육관 건립 공사착공('24.4)</li> <li>▣ 육상경기장 및 야구장, 실내체육관 건립('24.8., 공정률 28%)</li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
61	체육·스포츠 재정 대폭 확대로 전 도민 체육복지 실현	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 체육·스포츠 재정 대폭 확대 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ('22년) 100% → ('23년) 120% → ('24년) 130% → ('25년) 140% → ('26년) 150%</li> </ul> </li> <li>◦ (목표) 공공스포츠 인프라 공급 확대 : 30개소(매년 6개소) <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ '23년 체육·스포츠 예산 확대(체육분야 예산 1,042억원 / 131.5%)</li> <li>▣ 공공스포츠 시설 설립 완료 : '22년 7개소/'23년 6개소</li> <li>▣ '23년 국민체육센터(장애인형) 추가 선정 2개소(국비 70억원 확보)</li> <li>▣ '24년 체육·스포츠 예산 확대(체육분야 예산 970억원 / 122%)</li> <li>▣ '24년 국민체육센터 건립 추진 2개소 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정읍 체육트레이닝센터('24.3.), 남원 테니스장('24.4.)</li> </ul> </li> <li>▣ '24년 1회 추경 예산확보(1,015.74억원) * 본예산대비 52억 증가</li> </ul> </li> </ul>
62	완주 종합 스포츠타운 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 축구장, 족구장, 농구장, 풋살장, 다목적체육관 건립 시행 <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ '23년 다목적체육관 예산 확보(체육진흥시설 지원사업 8억원)</li> <li>▣ 축구장 준공('22.8.), 족구장·농구장·풋살장 준공('23.6.)</li> <li>▣ 다목적체육관 건축기획 용역 시행('23.8.)</li> <li>▣ 다목적체육관 공공건축심의 및 건축기획용역 완료(~'24.4.)</li> <li>▣ 다목적 체육관 공공건축 심의 완료('24.8.)</li> </ul> </li> </ul>
64	대규모 복합테마파크 유치 기반 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 복합테마파크 유치계획 수립</li> <li>◦ (목표) 민관지원단 구성·운영(6회) <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ 새만금 대규모 테마파크 유치 구상 연구 완료(전북연, '22.6. ~'23.7.)</li> <li>▣ '22년 새만금워킹그룹 관광진흥분과 회의(5회, '22.7. ~12.)</li> <li>▣ 잼버리부지 활용방안 관계기관 회의('22.7.18.)</li> <li>▣ 대규모 복합테마파크 선진지 방문(4회, '22.5.~'24. 3.)</li> <li>▣ '23년 새만금워킹그룹 관광진흥분과 회의(4회, '23. 5.~9.)</li> <li>▣ '23년 테마파크 관심투자 기업 면담·설명(2개사, 2회, '23.6.2.)</li> <li>▣ 새만금 관광레저용지(테마파크 등) 투자설명회 개최('23.11.6.)</li> <li>▣ 민관지원단 구성·운영 계획 수립('23.11.23.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 민관지원단 운영비 '23년 예산(20백만원) 확보('22.12.)</li> <li>- 민관지원단 구성·운영 관련 전문가 자문(2회, '23.3.~8.)</li> </ul> </li> <li>▣ 민관지원단 운영 활성화를 위한 사전회의('23.11.24.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 민관지원단 구성·운영(안) 협의(새만금개발청, '23.9.7.)</li> </ul> </li> <li>▣ 제1회 민관지원단 회의 개최 및 위원 위촉('23.12.22.)</li> <li>▣ '24년 테마파크 등 관심투자 기업 면담·설명(2개사, 4회, '24.2.~5.)</li> <li>▣ '24년 새만금워킹그룹 정책기획·관광분과 회의(3회, '24.3.~5.)</li> <li>▣ 대규모 복합테마파크 벤치마킹 지원용역 착수('24.5.27.)</li> <li>▣ 제2회 민관지원단 회의 개최('24.6.14.)</li> <li>▣ 대규모 복합테마파크 글로벌 벤치마킹('24.6.25.~29.)</li> </ul> </li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
67	자율주행 스마트시범지구 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦(목표) 군산시 자율주행차 규제 특례를 통한 유상 운송서비스 실증에 필요한 자율주행 실증 및 서비스 제공</li> <li>- 고군산군도 및 새만금방조제('24년), 군산2국가산업단지('25년)</li> <li>▣ 시범 운행지구 지정 고시(국토부 '22.6.) 및 시범 운행(고군산군도 및 새만금 L=41.6km)</li> <li>▣ 군산 선유도 내 관광형 자율주행셔틀(1대) 서비스 제공('24.10~)</li> </ul>
75	완주·전주 상생협력 추진 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦(목표) 완주군과 전주시의 상생협력 추진지원 및 향후 행정통합 추진 시 통합 비전 및 전략수립 등</li> <li>▣ 전주·완주 상생협력사업 발굴 및 협약 추진(9차)</li> <li>- 통합 공론의 장 조성('22년 2회, '23년 7회)</li> <li>▣ 전주·완주 상생협력사업 발굴 및 협약(10.11차) 추진('24.1~4월)</li> </ul>
80	제2의 혁신도시 유치	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦(목표) 전북도내 균형발전을 도모할 수 있는 제2의 혁신도시 조성을 위한 정부방침 결정 후 지속적인 공공기관 유치 활동 추진</li> <li>- 지속적인 공공기관 유치활동 추진</li> <li>- 정부방침 결정 후 제2의 혁신도시 입지 타당성 논리 개발</li> <li>▣ 지속적인 공공기관 유치활동 추진</li> <li>- 국토부 장관('22.11.25./12.26.), 국토부 혁신도시발전부단장('23.4.11.) 균형위원장('23.6.22.) 면담 등 공공기관 전북도 추가이전 건의</li> <li>- 공공기관 유치추진단 발족 및 제1~3차 회의('23.3.15./4.19./10.31.)</li> <li>- 공공기관 전북 추가이전을 위한 전라북도, 전북 여·야 국회의원 공동성명서 결의('23.3.17.)</li> <li>- 중점유치 대상기관 실·국별 유치 활동 전개('23.4./'23.10.)</li> <li>- 수도권 소재 150여개 공공기관, 부처 산하기관, 농수협 등 특수 민간기관 중 유치 대상 선정 및 전략 마련을 위한 용역 완료(~'23.6.)</li> <li>- 혁신도시 지정 신청 및 공공기관 이전 관련 특례 반영 활동('23.7.~10.)</li> <li>- 이전공공기관 및 종사자 지원 방안 연구용역('24.1.~5.)</li> <li>- 중점유치 대상기관 실·국별 유치 활동 전개('24.2./'24.5.)</li> </ul>
82	지역소멸 대응 '인구·청년 지원연구센터' 설치	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦(목표) 지역소멸 대응 '인구·청년 지원연구센터' 설치</li> <li>◦(목표) 지역소멸 대응 선도사업 발굴 및 추진('24년~'26년, 연 1건)</li> <li>▣ 센터 설치 및 운영 전북연구원 업무협약('22.8.)</li> <li>- 전북연 조직 및 정원 신설 등 정책기획관, 예산과 업무협약('22.8.~10.)</li> <li>▣ '전북여성가족재단' 출범('23.9.)</li> <li>- '24년 전북연 출연 동의안(센터 설치 포함) 승인('23.10.)</li> <li>▣ 전북연 조직개편, 인구·청년지원연구센터 개소('24.1.)</li> <li>▣ 중장기 연구계획 수립(상반기) 및 개별 연구과제(6건)* 수행</li> <li>* 기초과제 2, 미래전략 과제 1, 정책과제 2, 현안과제 1 등</li> <li>▣ 중장기 연구계획 수립 중간보고회('24.6.)</li> <li>▣ 중장기 연구계획 수립 최종보고회('24.7.)</li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
92	장애인 공공일자리 확대	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 재활, 돌봄, 자활 관련 공공일자리 창출 1,808명</li> <li>- ('22) 1,678명, ('23) 1,737명, ('24) 1,755명, ('25) 1,773명, ('26) 1,808명</li> <li>▣ ('22년) 5개 분야 1,678명</li> <li>- 일반형 513, 복지 764, 특화형 118, 지역맞춤형 273, 최종증 10</li> <li>▣ ('23년) 5개 분야 1,948명</li> <li>- 일반형 575, 복지 825, 특화형 136, 지역맞춤형 336, 최종증 76</li> <li>▣ ('24년) 4개 분야 1,891명</li> <li>- 일반형 588, 복지 1,007, 특화형 156, 최종증 140</li> <li>▣ '24 최종증장애인 공공일자리 수행기관 간담회('24.6.)</li> <li>▣ 최종증장애인 공공일자리 관련 단체 의견수렴('24.7.)</li> <li>▣ 장애인 공공일자리 수행기관 현장방문('24.7.)</li> </ul>
95	청소년 스마트 체험 활성화	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 전라북도 청소년들에게 스마트 체험 활동을 제공하기 위해 교육청 등 관계기관 등과 협업 추진</li> <li>- 교육청, 청소년 관련 기관 등과 협업체계 구축</li> <li>- 청소년 스마트 체험 활동 및 각종 프로그램 운영 지원</li> <li>▣ 협업체계 구축·운영 및 체험 활성을 위한 교육청과 소통·협업(2회)</li> <li>- 교육행정협의회('22.10.28., '23.4.28.)</li> <li>▣ 전북교육청, 관계기관 등 협업체계 구축('23.7.)</li> <li>▣ 청소년 스마트 체험활성화를 위한 간담(교육청/'23.8.)</li> <li>▣ 청소년 스마트 체험활성화 방안 추진계획 수립('23.11.)</li> <li>▣ '24년 도내 청소년 스마트체험 수요분석 완료('23.12.)</li> <li>▣ '24년 도내 청소년 스마트체험 현장학습 코스* 개발 및 운영('24.3.~)</li> <li>* 새만금 메타버스체험관, 신재생에너지테마파크, 새만금간척박물관</li> <li>※ '24년 8월말 스마트체험 운영실적 : 23개교 1,662명</li> </ul>
98	어르신 맞춤형 복지 서비스 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 노인일자리 시장형사업단 초기투자비 지원(20개소)</li> <li>◦ (목표) 맞춤형 노인돌봄서비스 확대 : ('22년) 33천명 → ('26년) 37천명</li> <li>◦ (목표) 전라북도 장기요양요원 지원센터 운영 : 1개소</li> <li>▣ '23년 예산 514.5억원 확보 및 사업계획 수립추진</li> <li>▣ 노인일자리 신규 시장형사업단 지원('23년 5개소)</li> <li>▣ 맞춤형 노인돌봄서비스 제공('22년 33,000명, '23년 36,000명)</li> <li>▣ '23년 장기요양요원지원센터 운영 및 사업계획 수립</li> <li>- '23년 장기요양요원지원센터 프로그램(힐링캠프 및 교육 등) 운영(800명)</li> <li>▣ '24년 예산 560.3억원 확보 및 사업계획 수립추진</li> <li>▣ 노인일자리 신규 시장형사업단 지원('24년 5개소)</li> <li>▣ 맞춤형 노인돌봄서비스 제공('23년 36,000명, '24년 37,173명)</li> <li>▣ '24년 장기요양요원지원센터 운영 및 사업계획 수립</li> <li>- '23년 장기요양요원지원센터 프로그램(상담·교육·캠페인 등) 운영(142건)</li> <li>▣ '24년 수행기관 사회복지사 역량강화교육 실시('24.6.~7.)</li> <li>▣ '24년 장기요양요원지원사업 추진(상담·교육·캠페인 등 69건 444명, 8월 기준)</li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
99	1인 가구 주거 안전 방문 자킴 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 1인가구 대상 스마트기술을 활용한 안심장비 설치 지원 3,000가구               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ('23년) 400가구, ('24년) 700가구, ('25년) 900가구, ('26년) 1,000가구</li> </ul> </li> <li>▣ 전라북도 1인가구 지원 조례 제정('22.11.)</li> <li>▣ '23년 1인가구 주거 안전 방문자킴이 지원계획 수립('23.1.) 및 주거안전 장비설치 지원(479가구)</li> <li>▣ 시군 간담회('23.1./'23.3.)</li> <li>▣ '24년 1인가구 주거 안전 방문자킴이 지원계획 수립('24.1.)</li> <li>▣ '24년 3분기 지원실적 : 387가구</li> </ul>
100	전라북도 일·생활 균형 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 문화 확산 : 조직문화개선을 위한 컨설팅 200건               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ('23년) 40건, ('24년) 50건, ('25년) 50건, ('26년) 60건</li> </ul> </li> <li>◦ (목표) 기업지원 : 일·생활균형 선도 추진 기업 지원 45개사               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ('23년) 5개사, ('24년) 12개사, ('25년) 13개사, ('26년) 15개사</li> </ul> </li> <li>▣ 일·생활 균형 지원 관련 정책연구과제 추진(전북연구원/~'23.5.)</li> <li>▣ '23년 일·생활 균형 문화 확산 지원사업계획 수립('23.3.)</li> <li>▣ 일·생활 균형 우수 지자체 벤치마킹('23.4.)</li> <li>▣ (23년 추진실적) 조직문화개선 컨설팅 추진 42건 / 선도추진 기업 지원 7개사</li> <li>▣ '24년 조직문화개선 등 컨설팅 추진 49건</li> <li>▣ '24 일·생활균형 문화 확산 협의체 구성 및 회의('24.4.)</li> </ul>
101	정읍시 어린이 기적의 놀이터 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 전국 최대 '기적의 놀이터' 조성</li> <li>▣ 공유재산 심의 및 관리계획 승인('22.12.), 지방재정투자심사 및 중기 지방재정계획 반영('22.12.)</li> <li>▣ 선진지 견학('23.2.6.) 및 기본 및 설계 용역 완료('23.3.~10.)</li> <li>▣ 놀이터 실시계획 용역 최종보고회 개최('24.2)</li> <li>▣ 도 감사위원회 원가 심사('24.7)</li> <li>▣ 놀이터 조성 공사 착공('24.8)</li> </ul>
102	전북 복지자원 통합관리 플랫폼 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 전라북도 복지정보 및 자원 ONE-STOP 시스템 구축('23년)</li> <li>◦ (목표) 플랫폼 이용자 확대 : ('24년) 1만명 → ('25년) 2만명 → ('26년) 4만명</li> <li>◦ (목표) 복지정보 시각화대 발굴 및 지원 : ('24년) 50명 → ('25년) 100명 → ('26년) 150명</li> <li>▣ 복지자원 통합관리 플랫폼 구축 타당성 및 운영방안 연구용역 추진 ('22.11.~'23.5. 전북연구원)</li> <li>▣ 플랫폼 관련 우수지역 벤치마킹(세종 등/'23.3.~4.)</li> <li>▣ 플랫폼 구축 업체 선정('23.8~11.)</li> <li>▣ 플랫폼 조기 구축 및 시범 운영('23.12.)</li> <li>▣ 시군 및 민간기관 복지자원 조사('24. 1~2월)</li> <li>▣ 사용자 및 전문가 의견 수렴, 반영('24. 2~3월)</li> <li>▣ 플랫폼 시스템 보완('24. 5~6월)</li> <li>▣ 플랫폼 본격 운영 및 도민 홍보('24. 7월)</li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
103	경로당 공용 와이파이 설치 및 운영비 개선	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 경로당 와이파이 설치 : 14개 시·군 경로당 4,967개소</li> <li>◦ (목표) 경로당 운영비 개선 : 6,358개소 → 6,857개소(전체 경로당으로 확대)</li> <li>▣ 경로당 와이파이 설치 및 운영비 지원 지침 통보 및 사업비 교부('23.1.)</li> <li>▣ 경로당 와이파이 설치('23년 1,490개소)</li> <li>▣ 경로당 운영비 개선 지원 완료('22년 6,358개소, '23년 6,857개소)</li> <li>▣ 경로당 와이파이 설치 및 운영비 지원 지침 통보 및 사업비 교부('24.1.)</li> <li>▣ 경로당 와이파이 설치 수요조사('24년 2,664개소)</li> <li>▣ 경로당 운영비 개선 지원 완료('22년 6,358개소, '23년 6,857개소, '24년 6,899개소)</li> <li>▣ 경로당 와이파이 설치시설 현장 확인 및 점검 : ('24.6월)</li> <li>▣ '25년 경로도아 공용 와이파이 추가 설치 수요조사('24.8.)</li> </ul>
104	전북형 무상보육 실현 등 돌봄 확대	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 어린이집 차액보육료(만3~5세아) : 전액 지원('23년~'26년)</li> <li>◦ (목표) 필요경비(만3~5세아) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 특별활동비, 특성화비용('23년~'26년), 차량운영비('24년~'26년)</li> <li>현장학습비('25년~'26년), 필요경비 전액 지원('26년)</li> </ul> </li> <li>▣ 보건복지부 사회보장제도 신설협의 완료('22.10.)</li> <li>▣ '23년 어린이집 차액보육료 및 필요경비 지원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 차액보육료 전액 지원(1인 월82천원)</li> <li>- 필요경비(특별활동비, 특성화비, 차량운영비 일부) 1인 월100천원</li> </ul> </li> <li>▣ '24년 어린이집 차액보육료 및 필요경비 지원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 차액보육료 전액 지원(1인 월평균 95천원)</li> <li>- 필요경비(6개항목* 전체 지원) 1인 월138천원</li> </ul> </li> </ul> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">*6개항목 : 특별활동비, 특성화비, 차량운영비, 현장학습비, 입학금, 행사비</p>
111	산악트레킹 코스 개발 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 역사와 문화가 있는 다양하고 쾌적한 산악트레킹 코스 개발 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 구봉산 등 4개 코스 80km 개발</li> </ul> </li> <li>▣ 숲길 조성계획 용역 수립('23.2.~6.)</li> <li>▣ '23년 1년차 코스 1개소 20Km 조성 완료</li> <li>▣ '24년 2년차 실시설계 용역 착수('24.1~4.)</li> <li>▣ '24년 2년차 사업 추진('24.5.~9.)</li> </ul>
120	디지털 헬스케어 시범사업 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 1차 의료기관 중심의 디지털 헬스케어 기반 비대면 진료 추진</li> <li>▣ '전라북도 비대면진료 추진 협의회' 발대식 및 심포지엄 개최('22.10.)</li> <li>▣ 전라북도 디지털헬스케어 추진협의회 개최('23.1.)</li> <li>▣ '23년 마이헬스웨이 구축 시범사업 참여 10개소</li> <li>▣ 마이헬스웨이 구축 시범사업 추진상황 등 간담('23.6.)</li> <li>▣ 디지털헬스케어 시범사업 추진 간담('23.8.3. / 8.31.)</li> <li>▣ 1차의료기관 건강정보고속도로 연계사업 참여 간담('23.10.19.)</li> <li>▣ 정부 비대면진료 시범사업 전체 의료기관 전면 시행('24.2.23.)</li> <li>▣ 정부 비대면진료 시범사업 지역보건의료기관 한시적 허용('24.4.3.)</li> <li>▣ 전북특별자치도 디지털헬스케어 추진협의회 개최('24.6.3.)</li> <li>▣ 전북특별자치도 디지털헬스케어 추진 위한 분과 운영('24.8.16.)</li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
121	전북형 노인결핵 검진 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 결핵발병 건강고위험군(65세 이상 고연령층, 노인집단시설 등) 대상 노인결핵 검진 지원('23년~'25년 매년 1만명)</li> <li>▣ 대한결핵협회 전북지부 사업추진 간담회('22.8.1./'23.10.5./'24.1.12,8,29)</li> <li>▣ 시·군 업무 담당자 간담회 및 의견수렴('22.9.2.)</li> <li>▣ '23년 노인결핵 검진사업 위·수탁 계약('23.1.19.)</li> <li>▣ 전북형 노인결핵 검진사업 추진상황 현장점검('23.3.16, '23.12.13.'24.2.27)</li> <li>▣ '23년 전북형 노인결핵 검진 12,348명</li> <li>▣ 전북형 노인결핵 검진 7,103명('24.8.)</li> </ul>
123	전북형 난임부부 시술비 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 난임환자의 경제적 부담완화를 위한 시술비 추가 지원 : 200건 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 체외수정(신선배아, 동결배아), 인공수정 시술비 중 일부 및 본인부담금 지원</li> <li>- 1인 최대 2회</li> </ul> </li> <li>▣ 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 완료('22.11.)</li> <li>▣ 전북형 난임 시술비 추가지원 방송 및 신문기사 보도('22.12./'23.12.)</li> <li>▣ 「2023년 전북형 난임 시술비 추가 지원사업 안내」 시·군 시달('23.1.)</li> <li>▣ 전북형 난임 시술비 지원 57건('23년)/12건('24년 1분기)</li> <li>▣ 「2024년 전북형 난임 시술비 추가 지원사업 안내」 시·군 시달('23.12.)</li> <li>▣ 전북형 난임 시술비 추가지원 실적 등 성과조사('24.5)</li> </ul>
124	지역발전 생태계 조성을 위한 지역대학 경쟁력 제고	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 지·산·학 협력 강화와 지역특화인재 양성을 위한 지역인재 투자협약제도 추진, 거버넌스 및 교육협력 추진체계 구축</li> <li>▣ 전라북도 대학 상생발전 협의회 구성·운영('23.2.~)</li> <li>▣ RIS 및 RISE 공모 추진 및 선정('23.2.~3.)</li> <li>▣ 글로벌대학30 예비 지정 1개(전북대, '23.6.20.),</li> <li>▣ 전북테크노파크 내 JB지·산학협력단(전라북도 RISE센터) 설립('23.7.4.)</li> <li>▣ 글로벌대학30 전북대 선정('23.11.13)</li> <li>▣ '24년 글로벌대학30 등 대학상생 간담회('24.2.20)</li> <li>▣ '24년 글로벌대학30 공모 신청(4개, '24.3.22)</li> <li>▣ 전북특별자치도 라이즈 계획수립위원회 구성 및 전체회의('24.4.2)</li> <li>▣ 글로벌대학 예비지정 대면평가 참여('24.4.9/4.11)</li> <li>▣ 도·원광대, 본지정 준비 실무TF 구성 등 대응회의('24.4.23)</li> <li>▣ 전북대 글로벌대학 지역상생사업 도 수요과제 발굴('24.4~6월)</li> <li>▣ 전북특별자치도 라이즈계획수립위원회 총괄분과위 회의('24.5.16)</li> <li>▣ 원광대 글로벌대학 본지정 대응 협업회의(도·익산시·원광대 등)(3회)</li> <li>▣ 원광대 글로벌대학 육성을 위한 지역 국회의원 간담회('24.7.8)</li> <li>▣ 라이즈 계획 수립 호남권 현장소통 간담회('24.8.23)</li> <li>▣ 원광대 글로벌대학 최종선정('24.8.28)</li> <li>▣ 라이즈계획수립 위원회 총괄분과위원회 개최('24.8.30)</li> </ul>

□ 정상추진 : 70개

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
5	캠퍼스 혁신파크 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 산학연 혁신허브(기업종합지원센터) 건립공사 추진</li> <li>▣ 캠퍼스 혁신파크 조성사업 추진상황 논의('23.12.)</li> <li>▣ 캠퍼스 혁신파크 조성사업 개발구상, 사업타당성조사 용역 추진중('23.)</li> <li>▣ 캠퍼스 혁신파크 조성사업 조성 관계기관 업무협약('24.2./4.)</li> </ul>
7	특수목적선 선진화단지 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 예비타당성 조사 통과('24년)</li> <li>◦ (목표) 단지조성, 기업입주기관 및 친환경기술 대응 시험연구센터 실시설계('25년)</li> <li>◦ (목표) 육상 및 해상공사, 친환경기술 대응 연구센터 시스템 발주('26년)</li> <li>▣ 국가재정사업으로 반영될 수 있도록 중앙부처(해수부, 산업부) 설득 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중앙부처 등(산업부, 해수부, 해군, 국회) 업무 협의(42회)</li> <li>- 국가선박 성능개량 등 수요예측 연구용역 발주('23.12.)</li> <li>- 국가선박 성능개량 등 수요예측 연구용역 결과 제출 및 설명('23.12~'24.3)</li> <li>- 도지사-해수부 장관 면담('24.4.)</li> <li>- 이원택 국회의원실 방문 건의활동('24.7., '24.9.)</li> </ul> </li> </ul>
9	미래차 산업벨트 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 새만금 내 1~3단계 자율주행 상용차 원스톱 실증기반 구축</li> <li>◦ (목표) 김제 특장단지 기능 고도화를 위한 전문기술지원센터 구축</li> <li>◦ (목표) 완주 수소상용차 핵심부품 개발 및 시험평가인증 지원 전용플랫폼 구축</li> <li>▣ 자율주행 상용차 실증지원 도로 인프라 설계 완료('23.1.~'24.7.)</li> <li>▣ 자율주행 상용차 실증지원 도로 인프라 착공('24. 8. ~ )</li> <li>▣ 자율주행 통합관제센터 구축 설계 진행중('24.3.~ )</li> <li>▣ 특장차 전문기술지원센터 2차년도 장비 4종 구축 추진</li> <li>▣ 자동차품질인증부품 25건 신규개발('23.1.~12.)</li> <li>▣ 수소상용차 실차기반 신뢰 내구성 검증기반 구축사업 설계 추진(~ '23.7)</li> <li>▣ 수소상용차 실차기반 신뢰 내구성 검증기반 구축관련 자체장비 심의회 개최('24.5.)</li> <li>▣ 수소상용차 실차기반 신뢰 내구성 검증기반 센터 착공('24.9.)</li> </ul>
12	서해안 데이터센터 집적지 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 데이터·AI 전문인력양성 2,000명</li> <li>◦ (목표) 새만금 스마트그린산단 착공</li> <li>◦ (목표) 주력산업 빅데이터 플랫폼 구축</li> <li>▣ 데이터·AI 전문인력양성 '22년 824명(계획 720명), '23년 668명(계획 720명)</li> <li>▣ 새만금 스마트그린산단 통합관제센터 구축 설계 용역착수('23.12.)</li> <li>▣ 플랫폼 구축을 위해 '24년 국가예산 확보에 따른 사업 공모대응 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- AI융합 지능형 농업 생태계 구축사업 공모 선정('24년 935억원/전북 358억원)</li> <li>- 농식품 분야 메타버스기반 기술실증 지원사업 공모 선정('24년 13억원)</li> </ul> </li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
13	새만금 SK데이터센터 조속 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) SK 데이터센터 유치 지원(15회)</li> <li>◦ (목표) SK 창업클러스터 착공('24년)</li> <li>▣ '22년 데이터센터 유치 지원을 위한 실무협의체 운영(3회)</li> <li>▣ '23년 데이터센터 유치 지원을 위한 워킹그룹 운영(2회) 및 관련기관 동향 파악 및 포럼 참석 등('23.4.~6.)</li> <li>▣ 데이터센터 유치 지원을 위한 SK-해저케이블 관계자 업무협의('23.8.)</li> <li>▣ 데이터센터 지역 분산을 위한 산업부-관계부처 회의 참석('23.9.)</li> <li>▣ 데이터센터 유치 지원을 위한 SK 관계자 업무협의('24.4.)</li> </ul>
14	생체적합성 탄소소재 의료기기 기술개발	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 탄소소재 의료기기 기술개발 지원 1건</li> <li>◦ (목표) 탄소소재 의료기기 실용화 역량강화 지원 7건</li> <li>▣ 탄소소재의료기기 개발지원센터 개소('23.4.)</li> <li>▣ '생체적합성 탄소소재 의료기기 기술개발' 사업 국가 과학기술 자문회의 심의 대응·추진('23.7.)</li> <li>▣ 국가예산 반영 대응 및 공모 선정 준비</li> <li>▣ '글로벌 혁신의료기술 실증지원센터' 공모 선정('24.5.)</li> <li>▣ '탄소소재 기술진흥 기본구상 연구용역' 완료('24.6.~8.)</li> <li>▣ 혁신의료기기 개발을 위한 전주기 실증 기업지원 추진('24.7.~)</li> </ul>
15	첨단의료산업 기반 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 제약산업 미래인력 양성센터 1개소 완공</li> <li>◦ (목표) 제약공정 장비 120종 구축</li> <li>▣ 센터 구축을 위한 설계 업체 선정 및 계약('23.9.), 설계착수('23.9.~), 설계 완료('24. 8.), 건축 조달 발주 추진('24. 8.~)</li> <li>▣ '24년 한국보건산업진흥원 장비도입심의위원회 완료('24.8.)</li> </ul>
16	전북 화장품 시험검사 임상 센터 건립	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 화장품산업 육성을 위한 전북 화장품 시험검사 임상센터 건립</li> <li>▣ '24년 국가예산 확보(40억원) 및 도비 확보(12억원)</li> <li>▣ 설계공모 시행 및 기본 및 실시설계 계약('23.6.), 설계 완료('24.3.)</li> <li>▣ 시공업체 입찰조달('24.6.), 건축허가('24.8.), 건설공사 착공('24.8.)</li> </ul>
17	천연물 화이트바이오산업 생태환경 기반 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 화이트바이오 소재 융합산업센터 구축 추진</li> <li>◦ (목표) 기술경영인 양성 일자리 창출 30명('26년)</li> <li>▣ 융합산업 추진 용역 완료('22.12.~'23.7.)</li> <li>▣ 바이오소재 산업 육성 기술협력 교류('23.4.)</li> <li>▣ '24년 지방소멸대응기금 사업 선정(남원시비 5.66억원 확보)</li> <li>▣ 남원시-남원시바이오산업연구원 사업대행 협약 체결('24.7.)</li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
18	그린수소 생산클러스터 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 그린수소 생산클러스터 구축사업 예비타당성 조사 통과</li> <li>◦ (목표) 그린수소 생산클러스터 기본계획 수립</li> <li>◦ (목표) 수전해 설비 집적공간 기반 구축, 통합지원센터 건립 등 기본 및 실시설계 착수</li> </ul> <p> <b>▶ 기업 설문(조세연, '22.10.)</b>  <b>▶ 기재부 점검회의 3회('23.3.~10.), 예타 철회('23.11.)</b>  <b>▶ 예타 재기획용역('24.3.~'25.6.), 예타대상사업 신청('26.)</b> </p>
19	수소특화 국가산업단지 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 수소특화 국가산업단지 후보지 선정</li> <li>◦ (목표) 수소특화 국가산업단지 예비타당성 조사 통과</li> <li>◦ (목표) 수소특화 국가산업단지 계획 승인·지정</li> </ul> <p> <b>▶ 수소특화 국가산업단지 후보지 종합평가(23.2.27.) 및 후보지 선정(23.3.15.)</b>  <b>▶ 사업시행자 선정(23.4.28.), 국가산업단 성공추진 상생협약 체결(23.7.5.)</b>  <b>▶ 국토부 기업설명회 및 입주기업(2개) MOU 체결('23.11.28.)</b>  <b>▶ 사업타당성조사 용역 착수('23.12., LH)</b>  <b>▶ 기본협약 체결('24.6.)</b> </p>
23	전북 국제금융센터(JIFC) 설립	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 전북 국제금융센터 건립('26년)</li> </ul> <p> <b>▶ 전북국제금융센터 건립(안) 확정 및 건립추진단 구성('22.11.)</b>  <b>▶ 전북국제금융센터 조성부지 매매계약 체결('23.3.)</b>  <b>▶ 전북국제금융센터 건립사업 기본구상 수립용역 완료('23.4.~10.)</b>  <b>▶ 전북국제복합금융센터 개발 업무협약 체결('23.11.)</b>  <b>▶ 지역활성화 투자펀드 대상사업 선정[도 선정위원회] ('24.3.)</b>  <b>▶ 전북국제금융센터 건립 특수목적법인(SPC) 설립 ('24.8.)</b> </p>
24	새만금 첨단농업 클러스터 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 새만금 청년농 스마트팜 창업특구 조성('26년)</li> <li>◦ (목표) 지능형 농기계 실증단지 구축 추진(기본 및 실시설계, 착공 및 기반공사 완료)</li> </ul> <p> <b>▶ 임대형 스마트팜, 농업스타트업단지 공모 선정('23.1.~2.)</b>  - 임대형 스마트팜 실시설계('24.4.), 농업스타트업단지 공사준공(~'23.12.), 임대형 스마트팜 토목공사 시행사 선정 및 공사 착수('24.하반기)  <b>▶ 지능형 농기계 실증단지 조성계획 수립(농식품부, '23.3.)</b>  <b>▶ 지능형 농기계 실증단지 구축 기본계획 수립용역 추진('23.12.~'24.4.)</b>  <b>▶ 지반조사, 측량 및 소규모 환경영향평가 용역('24.3.)</b>  <b>▶ 지능형농기계 실증단지 구축사업 국비 확보(28.6억원)</b>  <b>▶ 임대형 스마트팜 사업 실시설계(~'24.9.)</b> </p>
25	종자생명산업 혁신클러스터 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) (1단계) 종자산업진흥센터 첨단온실 구축, 입주기업 스마트 육종 설비(5개소) (2단계) 사업 타당성 용역 등 행정절차 추진</li> </ul> <p> <b>▶ 김제공항부지 기본계획 폐지('22.11.), 실시계획 및 용도폐지 완료('23.1.)</b>  <b>▶ 김제공항 관리전환(국토부→농식품부) 본격 논의('23.4.~)</b>  <b>▶ 종자생명산업 혁신클러스터 사전 예비타당성 용역 착수('23.6.)</b>  - 종클 연계사업 종자가공처리센터 기본계획 수립 용역 추진  * 기본계획 용역 착수('23.3.)→ 중간보고('23.6.) → 건축설계 용역 착수('23.10.)  <b>▶ 종자생명산업 혁신클러스터 농식품부 간담회 2회('24.2.~6.)</b> </p>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
27	정읍 농축산용 미생물 산업화 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 농축산용 미생물 공유 인프라 구축</li> <li>- 공장형 개별 입주 공간 구축, 공동활용 장비 및 물류 보관창고 구축</li> <li>▣ 중앙재정투융자심사 신청('23.3.)</li> <li>▣ 부지매입 완료('23.9.) 및 실시설계 추진('24.1.)</li> <li>▣ 기본실시설계 완료(~'24.7.)</li> <li>▣ 건축공사 입찰('24.8.)</li> </ul>
29	동물용의약품 클러스터 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 동물용의약품 효능·안전성 평가센터 구축('23년)</li> <li>(목표) 동물용의약품 시제품 생산시설 구축('24.~'25년)</li> <li>(목표) 동물용의약품 임상시험 지원센터 구축 1개소 국가예산 확보</li> <li>▣ 동물용의약품 효능·안전성 평가센터 착공('22.6.), 준공('23.12.)</li> <li>▣ 동물용의약품 시제품 생산시설 구축 국가예산 확보('22.12.), 기본 및 실시설계 용역 선정 및 용역 추진('24.3.~11.)</li> <li>▣ 동물용의약품 클러스터 관계기관 협의회('23.4., '24.3.)</li> <li>▣ 농식품부 동물용의약품 임상시험 지원센터 구축 타당성 조사 연구용역 추진('24.3.~9.)</li> </ul>
34	순창 저탄소 친환경 생태농업 지원시설 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 친환경농자재 생산시설 구축(1개소)</li> <li>▣ 친환경농자재 시설 구축에 대한 설문조사 실시</li> <li>- 대상 : 친환경 농가, 친환경 자재업체, 담당공무원, 전문가 등(632명)</li> <li>▣ 24년 도 균특예산 19억원 반영(농촌지도기반사업 시설 11억원, 장비 8억원)</li> <li>▣ '24년 사업 보조금교부결정 및 송금('24.3.5.)</li> <li>▣ 도(농산유통과, 농업기술원), 순창군 현장 합동점검('24.4.2.)</li> <li>▣ 기본 및 실시설계 용역(건축, 기계 분야) 추진('24.4.~8.4.)</li> </ul>
36	섬진강 먹거리촌 구축 (섬진강 건강휴양단지 조성)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 소규모 HACCP 모델기반 등 장류 지식기반 공유 구축</li> <li>◦ (목표) 섬진강 유역을 중심으로 하는 건강 휴양도시 육성 및 콘텐츠 개발</li> <li>- 국지도 55호선(순창~구림) 확장 추진</li> <li>- 국도 24호선(순창~인계) 확장 : 제6차 국도·국지도 건설계획 반영</li> <li>- 자연휴양림 시설 보완(4회), 먹거리촌 조성(1개소)</li> <li>▣ 국지도 55호선(순창~구림 간 9km) 확장 기본설계 완료('22.6.~'23.6.) 및 실시설계 용역 추진('22.10.~'24.6.)</li> <li>▣ 제6차 국도 국지도 건설계획(26~30) 국도 24호선 4차선 확장 반영 건의(24.4)</li> <li>▣ 자연휴양림 시설 보완 2회, 먹거리체험존 조성 공정률 50%</li> <li>▣ 전통장류산업화 기술개발 사업타당성 조사용역 실시('24.1~)</li> <li>▣ 국지도 55호선 건설공사 기재부 예산반영(2억원) ('24.8)</li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
39	진안 홍삼 세계화	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 진안 홍삼 홍보 시설 구축 및 판매시설 집적화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 홍삼 플랫폼 센터 구축(카페, 콘텐츠 제작 공간 등)</li> <li>- 진안홍삼 홍보체험관 및 판매시설 조성</li> </ul> </li> <li>◦ (목표) 전북자치도 관광자원과 연계한 진안 홍삼 홍보 50회 <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ 홍삼 플랫폼 센터, 홍보 체험관, 판매시설 구축 건축기획 용역 완료('23.12.)</li> <li>▣ 진안홍삼 홍보 30회 실시('22년 6회, '23년 20회, '24년 4회)</li> <li>▣ 유통·판매시설 기본 및 실시설계 용역추진('24.1~)</li> <li>▣ 행정·유관기관 정례회의 개최(2회/ '24.3.~5.))</li> <li>▣ 명품홍삼 집적화단지 기본 구상안 및 시설배치 용역('24.4.~)</li> <li>▣ 동부권 식품클러스터 육성 추진협의회 개최(1차, '24.7.)</li> </ul> </li> </ul>
43	해양치유 거점단지 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 해양치유산업 활성화 기반 구축 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 해양치유 프로그램 발굴·운영, 해양치유지구 지정, 조례 제정 등</li> </ul> </li> <li>▣ 해양치유 프로그램 발굴 및 운영('22년 6회 192명)</li> <li>▣ 국가예산 확보활동(1회) 및 치유거점단지 현지방문(1회)</li> <li>▣ 해양치유자원 관리 및 활용 조례 제정('23.3.)</li> <li>▣ 해양치유지구 지정 관련 자료 제출(해수부, '23.10.)</li> <li>▣ 타시도 해양치유센터 벤치마킹(태안)('23.11.)</li> <li>▣ '23년 프로그램 체험 및 패키지 9회(체험 13일, 3,581명/ 패키지 7일 48명)</li> <li>▣ '24년 해양치유지구지정 및 공모추진 계획 논의(3회<sup>4~6월</sup>, 해수부)</li> <li>※ ('24년 9월 초 기준 추진상황) <ul style="list-style-type: none"> <li>- '24년 해양치유 프로그램* 발굴 및 운영중(2회 / 945명)</li> <li>* 생명존중 해양체험(1회 / 45명) 및 고창갯벌 마린힐링 체험 교육(1회 /900명)</li> </ul> </li> </ul>
44	국립해양문화시설 건립 기본구상	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 사전타당성 조사 완료('23년)</li> <li>◦ (목표) 예비타당성 조사 통과('26년)</li> <li>▣ 용역 추진을 위한 국가예산(3억원) 확보('23.12.)</li> <li>▣ 해수부 기본구상 및 사전 타당성 조사 용역 착수('23.4.)</li> <li>▣ 용역 착수보고회('23.4.13.) 및 자문회의('23.5.24.)</li> <li>▣ 전문가 세미나 개최('23.11.24.) 및 용역 중간보고회('23.12.15.)</li> <li>* 선진지 벤치마킹 3회 추진(서천 국립해양생물자원관2, 서울 국립민속박물관1)</li> <li>▣ 사업 부지 사용협의 및 부지매입 확보 마련(농식품부, '24.7.)</li> <li>* 새만금 기본계획 부합 및 「농어촌정비법」에 따라 매각절차 추진 후 부지 사용 가능</li> </ul>
45	내장산 트라이앵글 관광벨트 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 내장산~문화광장~용산호를 잇는 관광벨트 조성 <ul style="list-style-type: none"> <li>- (문화광장) 문화·관광·레저시설 5개 사업</li> <li>- (용산호) 복합힐링 공간 조성 3개 사업</li> </ul> </li> <li>▣ (문화광장) 문화광장 수상레저 체험존, 순환열차 설치('22./2개소), 메인주차장 및 상가, 미디어아트관, 동화마을 조성중('23.~'24./3개소)</li> <li>▣ (용산호) 미르샘 분수, 전망대 설치('22~'23/2개소) / 용산호 환경정비('24./1개소)</li> <li>▣ '24 상반기 사업 추진현황 점검('24.5.)</li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
46	지리산권 관광특구단지 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 지리산권 특별지방자치단체 설치를 위한 규약 승인 및 출범               <ul style="list-style-type: none"> <li>- (특별지자체) 6개 시·군 간 협의를 통해 특별지방자치단체 규약 승인 및 설치</li> <li>- (관광특구) 지리산권 대상지역(6개 시·군) 관광특구 타당성 조사 완료 및 진흥계획 수립 추진</li> </ul> </li> <li>▣ 지리산권관광개발조합 방문 협의('22.7.), 지리산권 특별자치단체 설치를 위한 5개 지자체장(남원, 구례, 산청, 함양, 하동) 협약('22.12.)</li> <li>▣ 특자체 순회 설명회 및 협의('22.10.~12.), 지리산권관광개발조합 추진단 구성 및 사무발굴 등 특자체 출범 준비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 특자체 설립 기본계획 수립용역('23.6~'24.6.)</li> </ul> </li> <li>▣ 주관 지자체 선정 및 추진단 구성·사무발굴 추진('24.상반기)</li> <li>▣ 특별지방자치단체 설치에 따른 인센티브 반영 건의(계속)</li> </ul>
48	전주-군산-익산 연계 역사·문화 관광벨트 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 역사문화관광벨트 조성을 위한 사업 추진(3개)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전주 지역관광거점도시 육성, 군산 달빛마루관광자원화 사업, 익산 이색교도소 조성</li> </ul> </li> <li>▣ 전주 지역관광거점도시사업 세부사업('22. 33개 완료/ '23.3. 9개 완료)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전주전통술박물관 리모델링 완료(23.9), 관광거점도시 육성사업 현장점검(24.2)</li> </ul> </li> <li>▣ 군산 달빛마루관광자원화 연계 사업(전망대) 디자인 재설계('23.6.)</li> <li>▣ 익산 이색교도소 조성사업 설계용역 공모('24.3.)</li> <li>▣ 전주역 통합관광센터 공사 추진('24.4~'25.7.)</li> </ul>
49	전북 서해안권 새만금과 5개 시군 연계 해양관광벨트 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 시군별 관광자원 사업 추진(14개)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 군산시(2개), 정읍시(3개), 김제시(2개), 고창군(3개), 부안군(4개)</li> </ul> </li> <li>▣ 기본구상 연구용역 착수보고('22.12.) 및 전문가 자문회의 개최('23.1.)               <ul style="list-style-type: none"> <li>기본구상 연구용역 준공('23.9.)</li> </ul> </li> <li>▣ 관광자원개발사업 상반기 추진상황 점검('24.5.)</li> <li>▣ 기본 및 실시설계용역 완료 3개소, 추진중 3개소('24.7월)</li> </ul>
50	무주 구천동 33경 관광명소화	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 둘레길 및 자전거 도로 조성, 테마별 체험 콘텐츠 도입</li> <li>▣ 기본구상 및 타당성조사 용역 추진('23.6.~12.)</li> <li>▣ 관광자원개발사업 상반기 추진상황 점검('24.5.)</li> <li>▣ 사업계획(안) 환경부(국립공원계획 변경) 협의 추진('24.7.~8.)</li> </ul>
51	갯벌 치유센터 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 갯벌 치유센터 조성</li> <li>▣ '23년 서해안권 발전지원사업*(국토부)에 신규 반영하여 사업추진을 위한 1년차 용역사업비 국비 3억원 확보</li> <li>▣ 지방재정 도 투자심사 완료('23.4.)</li> <li>▣ '23년 지방비 3억원 추경 확보('23.6.)</li> <li>▣ 프로그램 개발 및 공공건축심의 용역 추진('23.9.~12.)</li> <li>▣ 기본 및 실시설계용역 발주 및 착수('23.12.)</li> <li>▣ '24년 국비 5억원 확보('23.12.)</li> <li>▣ 기본 및 실시설계용역 중간보고('24.7.)</li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
52	K-문화지원센터 건립	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) K-문화지원센터 건립</li> <li>▣ K-문화지원센터 건립 기본구상 연구용역 추진('23.1.~12.)</li> <li>▣ 문화콘텐츠 전문가 자문위원회 자문 2회('23.2~5.)</li> <li>▣ '24년 K-문화지원센터 건립 국가예산 확보 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국가예산 확보를 위한 문체부 6회, 국토부 2회 방문('23.2.~10.)</li> <li>- 국가예산 확보를 위한 기재부 10회, 의원실 6회 방문('23.6~12.)</li> <li>- K-문화지원센터 건립 타당성 연구용역 국비 2억원 확보('23. 12.)</li> </ul> </li> <li>▣ 지원센터 건립 전북특별자치도 특례 반영('23.12.)</li> <li>▣ '24년 K-문화지원센터 건립 타당성 연구용역 대응 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 타당성 연구용역 조기발주 요청 문체부 2회 방문('24. 1.~3.)</li> <li>- K-문화지원센터 건립 타당성 연구용역 조기발주('24. 3.)</li> <li>- K-문화지원센터 건립 타당성 연구용역 착수보고('24. 6.)</li> <li>- 센터건립 타당성 연구용역 업무지원 및 인터뷰 대응 등('24. 7.)</li> </ul> </li> <li>▣ '25년 K-문화지원센터 건립 국가예산 확보 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 센터 건립 기본 및 실시설계 연구용역 국비 5억원 반영('24. 8.)</li> </ul> </li> </ul>
53	금마역사체험마을 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 타당성 용역('23년) 및 부지매입('24년~'25년)</li> <li>◦ (목표) 기본 및 실시설계 용역(착수 : '25년 / 완료 : '26년)</li> <li>◦ (목표) 공사 발주('26년)</li> <li>▣ 익산 고도보존육성 기본계획 변경(문화재청 승인 '22.7.29, 변경 고시 ('22.8.24.)</li> <li>▣ '23년 국비 2억원 확보, 기본구상 및 타당성 용역 완료('23.1.~7.)</li> <li>▣ '24년 국비 29.75억원 확보('23.12.)</li> <li>▣ 기본계획 용역 발주('24.1.)</li> <li>▣ 토지 등 기본조사 용역(감정평가 완료, '24.2.)</li> <li>▣ 토지 협의보상 추진(총 53필지중 6필지 협의보상완료, '24.6.)</li> </ul>
54	동서회합 육십령 가야이음터 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 기본 및 실시설계용역('24년)</li> <li>◦ (목표) 육십령 가야 옛길 복원(1.45km) 1개소 착공('25년)</li> <li>▣ '23년 사전행정절차 이행(지방재정 투자심사, 도유림 사용허가 등)</li> <li>▣ 국가예산 확보 활동 추진('22년 6회, '23년 9회)</li> <li>▣ '24년 예산 6억원 확보('24.5.)</li> <li>▣ 호남 동부내륙권 지역 정책간담회('24.6.20.)</li> </ul>
59	국립 전북 유소년 스포츠 컴플렉스 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 기본구상 및 타당성 조사용역('23년)</li> <li>◦ (목표) 유소년 스포츠 콤플렉스 건립 착공('25년)</li> <li>▣ (남원시) 유소년 스포츠 콤플렉스 기본사업계획 수립('22.10.)</li> <li>▣ '23년 국가예산 확보(타당성조사 및 설계용역비 5억원) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 타당성조사 및 기본계획 수립용역 추진('23.12.~'24.6.)</li> </ul> </li> <li>▣ '24년 국가예산 확보(실시설계용역비 20억원)</li> <li>▣ 타당성 조사 및 기본계획수립 용역완료('24.8.)</li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
60	국제 태권도 사관학교 설립	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 타당성 조사('24년), 기본계획 수립('25년), 관련 법률 제·개정('26년)</li> <li>◦ (목표) 조성공사 및 대학 설립 추진('27년 이후)</li> <li>▣ '23년 국제 태권도 사관학교 건립을 위한 타당성 조사 용역비 3억원 반영</li> <li>▣ 타당성 조사 용역 추진('23.10.~'24.6.)</li> <li>▣ 타당성 조사용역 문체부 중간보고('24.4)</li> <li>▣ 기본 및 실시설계용역비 국가예산 반영 건의활동 추진(지속)</li> <li>▣ 타당성조사 용역 완료(삼일회계법인, '24.6.)</li> </ul>
65	마리나 리조트 건설	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 마리나항만 사업계획 승인, 사업시행자 및 구역 지정(해수부)</li> <li>▣ 사업계획 수립 용역('21.5.~'22.11.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업계획 승인신청 해수부 사전협의(2회, '23.3., '23.6.)</li> <li>- 마리나항만 수정계획 용역 착수('23.4.)</li> </ul> </li> <li>▣ 민간사업자 제안서 제출(부안군, '23.7.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 민간사업자 제안서 해양수산부 제출('23.8.)</li> </ul> </li> <li>▣ 민간사업자 제안서 승인 철회 요청('24.1.)</li> <li>▣ 마리나 항만 운영 현황 제출(도→해수부/ '24.4.17.)</li> <li>▣ 공항 마리나항만 사업계획 보고('24.4.24.)</li> <li>▣ 공항마리나항만 사업계획서 제출(부안군→해수부, '24.8.)</li> </ul>
66	국제학교 유치	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 새만금 개발의 가속화 및 내실화를 위한 스마트 수변도시 내 새만금 국제학교 유치</li> <li>▣ 국제학교 유치 및 설립을 위한 업무협의 및 특례발굴 등 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 유관기관 업무협의(도교육청, 새만금개발청·공사, 부안군)('23.2.~3.)</li> <li>- 유치관련 업무협의(美드렉셀대, IL텍사스 등)('23.2.)</li> <li>- 전북특별자치도 국제학교 관련 특례조항 발굴('23.2.~3.)</li> <li>- 국제학교 관련 전문가 토론회 등('23.2.24., 3.15.)</li> <li>- 국제학교 유치 관련 벤치마킹(인천/'23.5.2.)</li> <li>- 전북특별자치도 국제학교 특례법안 협의(교육부/'23.5.10., 6.13.)</li> <li>- 국제학교 추진상황 점검 및 업무간담(교육청, 새만금청·공사/'23.5.26.)</li> <li>- 국제학교 설립·운영을 위한 특별법 신설 관련 협의('23.7.13., 9.12.)</li> <li>- 새만금 국제학교 설립 타당성조사 연구용역 완료('23.4.~12.)</li> <li>- 새만금 특례조문 검토 및 입법과제 부처대응 전문가 자문('24.03.26)</li> <li>- 새만금개발청 새만금사업법 개정 협의 추진('24.03.27)</li> <li>- 제22대 국회 새만금사업법 개정 발의(이원택의원)('24.6.5)</li> <li>- 새만금개발청 새만금사업법 개정건의 소통 간담('24.6.24)</li> <li>- 새만금사업법 개정안 국회 국토교통위 상정('24.8.)</li> </ul> </li> </ul>
68	자율주행 통합관제센터 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 자율주행자동차 서비스 기술개발 및 사업 모델 고도화를 위한 통합관제센터 구축</li> <li>▣ 재정투자심사('22.8.~9.), '22년 도입장비 1종 구축('22.12.)</li> <li>▣ 자율운송 실증 인프라 및 통합관제시스템 설계 완료('23.1.~12.)</li> <li>▣ 자율운송 실증 도로인프라 및 통합관제센터 착공 (~'24.10.)</li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
69	새만금 국제물류 허브항 개발	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 부두 2선석 완공('25년) 및 개장('26년)</li> <li>◦ (목표) 새만금 신항 기본계획 변경 반영('25년) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2030년까지 계획된 1단계 부두 6선석을 2028년까지 단축</li> <li>- 민자로 계획된 부두 4선석과 배후부지의 기반시설을 재정사업으로 전환</li> </ul> </li> <li>▣ 기본계획 변경 용역('22.6.~'24.7./해수부), 부두 2선석 추진(공정률 47%) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 진입도로 및 북측 방파호안 축조공사 완공('23.4.)</li> </ul> </li> <li>▣ 새만금신항 1-1단계 배후부지 재정사업 전환요청('24.1~) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 해수부, 기재부 등 국가예산 건의 활동('25년 정부반영액 1,382억원)</li> </ul> </li> <li>▣ 북측 진입도로 등 개설공사 착공('24.9.)</li> </ul>
70	새만금 국제공항 조기 착공	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 새만금 국제공항 조기 착공('24년)</li> <li>▣ 대형공사 입찰방법(턴키) 결정('22.9.), 건설공사 입찰 공고('23.3.)</li> <li>▣ 기본설계서 제출 및 가격입찰('23.8.) <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 새만금 SOC사업 적정성 검토연구 용역시행으로 행정절차 중단('23.11~'24.4.)</li> </ul> </li> <li>▣ 실시설계 적격자 선정 및 실시설계 착수('24. 6.)</li> <li>▣ '24년 예산 집행률 제고를 위한 매립권 양수비(261억원) 신속집행 대응('24.7.~)</li> </ul>
71	새만금~전주 고속도로 건설	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 사업준공 및 개통('24년)</li> <li>▣ 토공 및 구조물 등 계속사업 추진(공정률 70.2%)</li> <li>▣ '24년 국가예산 3,668억원 확보</li> <li>▣ '25년 국가예산 4,190억원 확보(정부안)</li> </ul>
72	새만금항 인입철도 건설	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 새만금항 인입철도 건설사업 기본 및 실시설계 완료('26년)</li> <li>▣ 기본계획 수립 추진</li> <li>▣ 「새만금 SOC사업 적정성 검토용역」 완료('24.6월) <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 「새만금 SOC사업 적정성 검토용역」 결과에 따라 「신항만 건설 기본계획」('24.12월)에 인입철도 내용 반영확인 후 「인입철도 기본계획」 수립고시를 위해 행정절차 지연</li> </ul> </li> <li>▣ 기본 및 실시설계 용역 착수('25년 상반기 예정)</li> </ul>
73	새만금 남북3축 도로 건설	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 예비타당성 조사 통과</li> <li>▣ 사전타당성 조사용역비 예산 확보를 위한 건의 활동('23.~)</li> <li>▣ 간선도로망 구축방안 연구용역 시행(새만금청/'24.6.~)</li> </ul>
76	격포항 국가어항 확장 개발	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 격포항 내 부잔교·연결도교 설치(4개소)</li> <li>◦ (목표) 해경 함정 전용부두 설치 착공</li> <li>▣ '24년 국가예산 확보(기본 및 실시설계비 15.5억원) *'23년 기확보(10억원) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 격포항 확장 기본 및 실시설계 용역 착수(군산지방해수청, '23.6.)</li> <li>- 기본 및 실시설계 용역 착수보고회('23.8.29.)</li> </ul> </li> <li>▣ 격포항 개발 관련 공청회('24.1.26.)</li> <li>▣ 기본 및 실시설계 용역 중간보고회('24.3.7.)</li> <li>▣ 격포항 기본 및 실시설계 용역완료('24.9.)</li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
77	금란도 개발계획 수립	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 금란도 개발을 위한 항만재개발 기본계획 수립 추진</li> <li>◦ (목표) 상생협의체 운영(8회)</li> <li>▣ 기본구상 용역 완료('22.6.~'23.12./해수부)</li> <li>▣ 지역 상생협의체 회의 6회('22년 3,7,12월/'23년 3,6,12월)</li> <li>▣ 금란도 기본구상(토지이용계획) 건의('24.3.)</li> <li>▣ 군산·서천 지역상생협의체 제2기 추천('24.5.)</li> <li>▣ 군산·서천 지역상생협의체 제2기 1차회의('24.6.)</li> </ul>
78	대한방직 부지 개발 행정적 협력 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 장기간 방치된 부지를 재생하여 전주의 랜드마크 마천루(타워) 조성 지원 - 문화관광·업무시설 향후 모악산 송신탑 이전 등 다양화된 공간수요에 대응하는 도시기본계획 변경 승인</li> <li>▣ 사전협상대상지 선정 통보(전주시→민간, '24.2.27.)</li> <li>▣ 협상 제안서 제출(민간→전주시, '24.3.7.),</li> <li>▣ 주민설명회 개최('24.4.), 감정평가 실시('24.5.), 시의회 의견청취('24.6.11.) 도시건축공동위원회 자문('24.6.20.), 협상결과통보('24.6.26.), 협상결과 수용('24.6.27.), 도시관리계획 입안제안서 제출('24.6.28.) 도시기본계획 일부변경(안) 공청회 개최('24.8.7.)</li> </ul>
79	명사십리지구 연안 정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 해양수산부 제3차 연안정비 기본계획 변경('24년)</li> <li>◦ (목표) 기본계획 수립 용역('25년)</li> <li>▣ 국민안심해안 시범사업 대상지 선정 및 계획수립('22.12.~'23.6.)</li> <li>▣ 기본 및 실시설계 용역 원가심사 및 일상감사('23.7.~9.)</li> <li>▣ 용역 발주 및 업체 수행능력평가 추진('23.10.~'24.2.)</li> <li>▣ 용역업체 선정 및 착수('24.3.~)</li> <li>▣ 명사십리지구 국민안심해안 사업추진 협의(해수부, '24.8.)</li> </ul>
83	국도13호선 위험구간 (장수~천천) 개선	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 예비타당성 조사 통과 및 제6차 국도·국지도 5개년 계획(26~30) 반영</li> <li>▣ 제6차 국도·국지도 건설계획 수요조사 제출('23.4.~)</li> <li>▣ 국가계획 반영 건의활동 추진(지속)</li> <li>▣ 전북특별자치도 → 국회의원 및 국토부 도로국장 면담('24.7~8.)</li> </ul>
84	전주 시외버스터미널 현대화 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 노후화된 전주시외버스 터미널의 현대화 사업 건축설계 추진</li> <li>▣ 터미널 신축에 따른 재정지원 방안 검토 및 현대화 사업 추진을 위한 사업시행자와 이해당사자 간 지속 협의</li> </ul>
85	군산 고속·시외버스터미널 현대화 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 고속·시외버스터미널 현대화 사업 기본계획 수립('25년)</li> <li>▣ 사업시행자 및 민간사업자와 터미널 운영방안에 대한 지속 협의</li> </ul>
86	전라선 고속화 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 전라선(익산~여수간) 고속화 예비타당성 조사 통과('26년)</li> <li>▣ 예비타당성 조사대상사업 신청('24.2.)</li> <li>▣ 예비타당성 조사대상사업 선정 방문(국토부, 기재부)건의('24.2~8.)</li> <li>▣ 예비타당성 조사대상사업 선정 예정(24. 하반기)</li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
87	전주~김천간 동서횡단 철도 건설	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 전주~김천간 철도사업 예비타당성 조사 통과('26년)</li> <li>▣ 예비타당성 조사대상사업 선정 방문(국토부, 기재부)건의('24.2~8.)</li> <li>▣ 사전타당성조사 완료('24. 下)후 예타대상 사업 선정 예정('24.4분기)</li> </ul>
88	국가식품클러스터 산업선 국가계획 반영	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 제5차('26.~'35.) 국가철도망 구축계획 반영('26년)</li> <li>▣ 전북권 철도망 구축계획 수립용역 추진('23.7.~)</li> <li>- 신규사업반영을 위한 사업추진 논리 마련 등 국가계획 대응</li> <li>▣ 제5차 국가철도망 구축계획 신규사업 제출 및 반영 건의('24.2.~8.)</li> </ul>
89	부안~고창간 노을대교 조기 착공	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 해양관광권역 활성화 및 지역발전을 위해 신속한 사업 착공</li> <li>▣ 입찰방법을 변경(설계·시공 일괄입찰→설계·시공 분리, '23.1.), 기본설계 용역 완료('23.4.~12.), 기재부 총사업비 협의('23.1.~)</li> <li>- 해상교량에 따른 특수성으로 총사업비 증액이 필요함을 기재부에 설명 추진</li> <li>▣ '24년 예산 1억원 확보('24.1.)</li> <li>▣ 총사업비 협의 신속추진 건의('24.3.)</li> <li>▣ 전북특별자치도→ 국토부 도로국장 면담('24.7.)</li> <li>▣ '25년 국가예산 기재부 요구액 200억원 반영('24.8.)</li> </ul>
90	전주~대구간 고속도로 건설	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 전주~대구간 고속도로(무주~성주 구간) 예비타당성 조사 통과</li> <li>▣ 무주~성주 구간 사전타당성 조사용역 추진 건의('23.~)</li> <li>- 국토교통부 예산협의회 건의, 전북·경북 공동건의 추진 등</li> <li>▣ 전주~무주, 무주~성주 고속도로 건설 추진 건의('24.1.~)</li> <li>▣ 경상북도 방문 공조 방안 협의('24.3.)</li> <li>▣ 국토교통부 예산협의회 건의('24.4.)</li> <li>▣ 전북 민생토론회 개최 건의('24.7.)</li> </ul>
91	장애인고용 교육연수원 건립	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 장애인고용 교육연수원 건립</li> <li>▣ 예정부지 건축물 철거·해체공사 완료('23.4.~11.)</li> <li>▣ 건축공사 2동 완료(탈시설종합지원센터, 재활치료센터)</li> <li>* 자립생활주택 4동 공사 완료(~'23.12.)</li> <li>▣ 기본계획 수립 및 공공건축기획 사전검토 심의(~'23.11.)</li> <li>▣ 설계공모 및 용역 추진('24.3)</li> <li>▣ 연수원 부지조성을 위한 토지 분할('24.6)</li> <li>▣ 도·전주시·한국장애인고용공단·도교육청 1차 실무협의('24.6)</li> <li>▣ 도·전주시·한국장애인고용공단·도교육청 2차 실무협의('24.7)</li> </ul>
94	시·군 청소년 복합문화센터 건립	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 청소년 복합문화센터 건립(기능 전환) 5개소</li> <li>- ('24년) 2개소, ('25년) 3개소</li> <li>▣ 전북 청소년복합문화센터 건립방향 연구, 수요자 요구조사 계획 수립('23.)</li> <li>▣ 전북 청소년복합문화센터 추진방향 연구용역('23.6.~10.)</li> <li>▣ 청소년 관계기관 요구조사 및 의견수렴('23.8.~9.)</li> <li>▣ 전북 청소년복합문화센터 건립 기본계획 수립('23.9.)</li> <li>▣ 전북 청소년복합문화센터 건립 자문회의(12.15.)</li> <li>▣ 익산시, 진안군 청소년복합문화센터 설계용역 실시('24.1분기)</li> <li>▣ '25년 청소년 복합문화센터 건립사업 시군 선정('24.9.)</li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
96	글로벌 청소년 인재 양성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 글로벌 청소년 리더 센터 건립('24년)</li> <li>◦ (목표) 글로벌 마인드 함양을 위한 기초 소양 교육체임을 통해 글로벌 인재 양성 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 글로벌 청소년 인재 교육 : '24년~</li> </ul> </li> <li>▣ 글로벌 청소년 리더센터 건립공사 공정률 90%(부대토목 및 조경공사 추진)</li> <li>▣ 글로벌 청소년 리더센터 운영 기본계획 수립 용역 완료('23.6)</li> <li>▣ 글로벌 청소년 리더센터 운영 기본계획 수립('24.5)</li> <li>▣ 공사준공 및 준공신청서 제출(도→새만금청)('24.7)</li> <li>▣ 민간위탁관리위원회 심의 승인(리더센터 민간위탁 추진)('24.7)</li> <li>▣ 청소년수련시설 설치 및 운영 조례안 입법예고('24.7.19~8.8)</li> </ul>
97	신혼부부·청년 임대주택 임대보증금 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 신혼부부·청년 공공임대주택 임대보증금 지원 4,000가구('23년~'26년) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지원금액 : 임대보증금 최대 2,000만원(계약금 자부담 제외)</li> <li>- 지원기간 : 최대 10년(신혼부부·청년 6년, 1자녀 출산시 8년, 2자녀 이상 출산시 10년)</li> </ul> </li> <li>▣ 시·군 간담회 및 수요조사, 복지부 사회보장제도 신설 협의('22.10.~12.)</li> <li>▣ 실태조사 및 「전라북도 저소득계층과 청년 및 신혼부부 주거 지원 조례」 개정('23.3.)</li> <li>▣ 신혼부부·청년 임대보증금 지원 675가구 지원('23.4.~'24.6)</li> </ul>
105	다문화가정 원스톱 지원 서비스 고도화	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 광역가족센터 설치 1개소</li> <li>◦ (목표) 국적취득 비용 지원 : 매년 150건</li> <li>▣ 타 시·도 사례 조사 및 세부계획안 마련('22.11.~12.)</li> <li>▣ 국적취득 비용 지원 사회보장제도 신설 협의 및 추경예산 반영('23.2.~5.)</li> <li>▣ '23년 국적취득 비용 지원 195건</li> <li>▣ '24년 국적취득 비용 지원 183건(3분기)</li> <li>▣ 국비확보를 위한 가족센터 신규 운영기관 수요조사 제출(여가부, '24.3.25) 및 여가부 관계자 면담('24.4.23.)</li> <li>▣ 센터 설치를 위한 타 시도 벤치마킹('24.8. / 경남, 서울, 경북)</li> <li>▣ 전북특별자치도 가족센터 설치계획(안) 마련('24.8.)</li> </ul>
106	용담호 탐방길 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 용담호 생태탐방로(L=10km) 조성('25년)</li> <li>▣ 환경부 공모 선정('22.9.20.)</li> <li>▣ 기본계획 수립용역 완료('23.9.)</li> <li>▣ 실시설계 용역 추진('23.12.~'24.9.)</li> </ul>
107	옥정호 생태탐방 공간 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 옥정호 생태탐방로 및 편의시설 조성 <ul style="list-style-type: none"> <li>- (1단계) 탐방로 7.3km 조성('23년)/ (2단계) 탐방로 10.3km 조성 추진</li> </ul> </li> <li>▣ (1단계) 공정률 100% 추진</li> <li>▣ (2단계) 환경부 공모 선정('22.9.) 및 지방재정투자심사('23.2.), 실시설계 용역 추진('23.12.~'24.12.)</li> </ul>
109	한국정원산업지원센터 조성 적극 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 한국정원산업클러스터 조성사업 예비타당성 조사 대상사업 선정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정원산업혁신존(기업지식산업센터 조성 - 기업입주센터, 공동연구단지) : 중기부</li> <li>- 정원식물 소재존, 정원 소재 유통, 정원박람회존, 정원휴양 및 관광존 : 산림청</li> </ul> </li> <li>▣ 산림청 대상사업 선정을 위한 협의 및 부지매입 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 총 사업면적 중 74% 매입 완료</li> </ul> </li> <li>▣ 정원식물지원센터 조성 추진('23.~'24.)</li> <li>▣ 산림청 국책대상사업 선정을 위한 지속 건의('24.~)</li> <li>▣ 정원산업과 도시농업의 상생발전 기본계획 수립 추진('24.5.~10.)</li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
110	군립자연휴양림과 지방정원 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 기본 및 실시설계 수립('24년) 및 승인('25년), 사업 착공('26년)</li> <li>▣ <b>군립 자연휴양림 지정 고시(산림청, '23.4.)</b></li> <li>▣ <b>자연휴양림 조성계획 승인 후 국유림 교환 예정으로 기본 및 실시설계 수립 조성계획 승인 요청 ('24. 7. 24)에 따른 관련법 검토 중</b></li> </ul>
112	산림복지단지 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 산림휴양·치유·교육 등 다양한 산림복지서비스를 종합적으로 제공하는 산림복지단지 조성</li> <li>- 실시계획 수립('23년), 실시계획 승인('24년), 조성공사('25년~'26년)</li> <li>▣ <b>무주 향로산 산림복지단지 실시설계용역 추진('22.12.~'24.8.)</b></li> <li>▣ <b>산림복지단지 내 개별시설 공법선정 및 특허 사용협의('24.3.)</b></li> <li>▣ <b>향로산 자연휴양림 지정구역 변경 신청('24.7.)</b></li> </ul>
113	백두대간 산림정원 조성 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 행정절차 완료('25년) : 환경영향성 평가, 공유재산 심의</li> <li>◦ (목표) 기본 및 실시설계 착수('26년)</li> <li>▣ <b>대상지 확보를 위한 공유재산(도유림↔군유림) 교환 계획 수립</b></li> <li>▣ <b>공유재산 일부대상지(산154-93) 임야 교환 완료('24.1.18.)</b></li> <li>▣ <b>기본 및 실시설계 용역 착수('24.3.)</b></li> <li>▣ <b>육십령 지방정원 기본 및 실시설계용역 원가심사(일상감사) 완료 및 조달계약 요청 : 보완요청('24.3.), 조달청 재요청('24.8.)</b></li> </ul>
114	산림치유 인프라(지덕권 친환경 산림고원 조성) 확충	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 예비타당성 조사 대상사업 선정('26년)</li> <li>▣ <b>예비타당성 대비 기본구상 수립 연구용역 완료('22.4.~'23.4.)</b></li> <li>- '24년 사전 타당성 용역비 국비 5억원 확보를 위해 지속적 건의 활동 추진</li> <li>▣ <b>장수군 편입사유지 14.8ha 감정평가 등 매입('23.1.)</b></li> <li>▣ <b>지덕권 산지약용식물 특화산업화 방안연구 4억원 확보('23.9.)</b></li> <li>▣ <b>지덕권 산림약용식물 특화산업화 연구 용역 착수('24.6.)</b></li> <li>▣ <b>지덕권 산림약용식물 특화산업화 연구 용역 착수보고회('24.7.)</b></li> </ul>
115	임실 관내 공공하수처리시설 증설	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 공공하수처리시설 증설 2개소(오수 '25년 착공, 임실 '26년 착공)</li> <li>▣ <b>오수 공공하수처리시설 증설 : 설계용역 추진 중('23.6.~, 80%)</b></li> <li>▣ <b>임실 공공하수처리시설 증설 : 설계용역 착수('24.6.~, 10%)</b></li> </ul>
116	무주군 친환경 에너지타운 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 타당성조사 용역('23년), 기본 및 실시설계 용역('24년), 조성공사 추진('25년~'26년)</li> <li>▣ <b>공모 신청('22.6.) 및 환경부 현지실사('22.7.), 공모 선정('22.8.)</b></li> <li>▣ <b>타당성조사 용역 완료('23.1.~11), 기본 및 실시설계 용역('24.8.~'25.6.)</b></li> <li>▣ <b>사업수행능력평가 세부기준안 협의('24.2.~5.)</b></li> <li>▣ <b>사업수행능력평가 세부기준안 지방건설기술심의('24.5.)</b></li> <li>▣ <b>기본 및 실시설계 용역사업자 선정을 위한 사업수행능력평가 공고('24.7.)</b></li> </ul>
117	만경강 친수공간 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 만경강 친수공간 조성사업 추진을 위해 국가계획(만경강 하천기본계획 등) 반영</li> <li>▣ <b>금강유역 수자원 관리계획 반영('23년, 환경부)</b></li> <li>▣ <b>만경강 하천기본계획 반영 용역 추진 중(전북지방환경청, '23.1.~'25.12)</b></li> </ul>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
118	탄소중립 실현을 위한 생태 문명원 건립	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 탄소중립 실현을 위한 생태문명 혁신활동 거점공간 조성 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 생태기술혁신센터, 생태문명 연구·교육센터</li> </ul> </li> <li>▣ 환경부 국비사업 연계를 위한 자연환경복원 시범사업 선정('23.5.)</li> <li>▣ 환경청, 전북도, 환경공단, 전문가 등 협의체 구성('23.7.)</li> <li>▣ 자연환경복원사업 원활한 추진을 위한 환경청 선행용역 착수('23.8.)</li> <li>▣ 협의체 현장답사('23.9.) 및 환경청 선행용역 중간보고회('23.12.)</li> <li>▣ 도 기본계획 수립용역 착수('24.4.) / 착수보고회 개최.5.17)</li> <li>▣ 현장조사 결과 및 사업 구역계 결정 관련 환경부 협의('24. 8)</li> </ul>
119	국립공공보건의료대학원 설립	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 국립공공보건의료대학원 설립(법안 국회 통과)</li> <li>▣ 국회 상임위 제2법안소위 법안심사('22.4.26.) 공청회 개최('22.12.9.)</li> <li>▣ '23년도 국비 3.9억원(설계비 등) 확보</li> <li>▣ 국회 보건복지위 전체회의 통과('23.12.20.)</li> <li>▣ 국회 상임위 제2법안소위 법안심사('24.8.23.)</li> <li>▣ 법안 국회 통과를 위한 활동 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 조규홍 보건복지부장관 면담('23.1.16.)</li> <li>- 중앙지방협력회의에서 대통령께 국립의전원 설립 건의('23.2.10.)</li> <li>- (민주당)김성환 정책위의장, 박홍근·박광온 원내대표 등 면담('23.1.~4.)</li> <li>- (국민의힘)김기현 대표, 윤재옥 원내대표, 박대출 정책위의장 등 면담('23.3.~4.)</li> <li>- 국민의힘 호남권 예산정책협의회 협조 요청('23.6.14.)</li> <li>- 청와대 안상훈 사회수석, 박대출 국민의힘 정책위의장 면담('23.6.19.)</li> <li>- 박대출 국민의힘 정책위의장 면담('23.9.12.)</li> <li>- 국회의원 예산정책협의회 협조('23.10.30), 민주당 홍익표 원내대표 면담('23.11.14.)</li> <li>- 청와대 사회수석, 김윤덕, 한병도, 이춘석, 박희승 의원 등 면담('24.1.~8.)</li> <li>- 제21대 국회의원 정책간담회, 법안 통과 지원 건의('24.4.24.)</li> <li>- 전북특별자치도의회 의정대표 협의회, 법안 통과 지원 요청('24.5.2.)</li> <li>- 전북국회의원 간담회, 관련 법안 제정 협조 요청('24.6.12.)</li> <li>- 전북연고 국회의원 간담회, 관련 법안 제정 협조 요청('24.6.12.)</li> <li>- 제27민생토론회에서 대통령께 국립의전원 설립 건의('24.7.18.)</li> </ul> </li> </ul>
122	공공산후조리원 건립	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (목표) 출산·산후조리 취약지역 및 사각지대를 연계하는 산후조리 인프라 구축을 위한 공공산후조리원 건립</li> <li>▣ 공공산후조리원 건립·운영 연구용역 추진('22.10. ~ '23.3.)</li> <li>▣ 공공산후조리원 건립 부지 남원시 공유재산 승인('22.11.)</li> <li>▣ 공공산후조리원 설립 추진 방향 검토('23.3.) 및 도 투자심사 완료('23.3.)</li> <li>▣ 공공산후조리원 건립 부지 매입 확보('23.4.)</li> <li>▣ 지방소멸대응기금 확보를 위한 신청서 제출 및 대응('23.4.)</li> <li>▣ 보건복지부 사회보장제도 신설·협의 완료('23.5.)</li> <li>▣ 「전라북도 공공산후조리원 설치·운영 등에 관한 조례」 제정('23.5.8.)</li> <li>▣ '24년 지방소멸대응기금 평가 대응('23.7.~9.) 9억원 확보('23.12.)</li> <li>▣ '24년 지방소멸대응기금 예산 교부('24.3.)</li> <li>▣ '25년 지방소멸대응기금 신청('24.4.)</li> <li>▣ 정읍 실시설계 착수('24.4.) 남원 공사착공('24.7.)</li> </ul>

□ 공약 목표


- (완료도 상향) 매년 이행 완료된 공약의 비율 지속적 상향  
- 연도별 완료 가능한 목표를 명확히 설정하여 목표 달성

연도별	2023	2024	2025	2026	2027 이후
달성 목표	20%	50%	80%	90%	100%

□ 관리체계

- (실천계획 수립) 공약의 타당성, 실현 가능성, 재원확보 방안 등 종합검토
- (실천계획 이행) 실천계획에 따라 이행실적 관리(분기별)
- (실천계획 변경) 정책환경 변화 등 불가피한 사유 발생 시 변경
- (외부평가 대응) 평가기관의 평가매뉴얼에 맞춰 평가준비 및 대응(연 1회)

< 공약사업 관리 흐름도 >

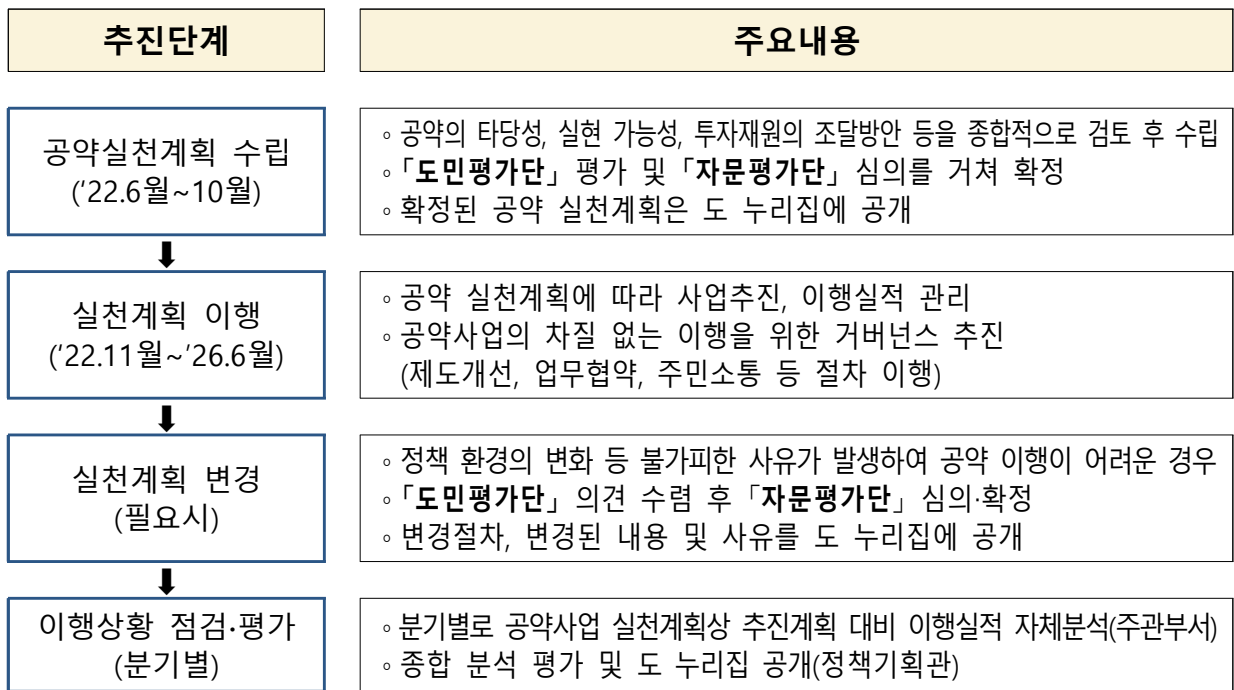

□ 금후계획

- 공약사업 실천계획 변경 확정 및 도 누리집 공개 : ’24. 11월중  
※ 도민평가단(3회) 및 자문평가단 운영을 통한 공약 실천계획 확정(9~11월)
- 하반기 공약사업 추진상황 점검(2회) : ’24. 10, 12월
