
2025년 도지사 공약사업 추진상황 점검결과(9월말)
[2022. 7월 ~ 2025. 9월]

목 차

I. 공약사업 개요	1
II. 추진상황 점검결과	2
III. 분야별 추진상황	3
IV. 사업추진 현황	10
□ 이행완료(12개 사업)	10
□ 이행 후 계속추진(73개 사업)	13
□ 정상추진(33개 사업)	40
□ 일부추진(5개 사업)	51
□ 폐 기(1개 사업)	52
V. 향후 관리계획	53


I 공약사업 개요

□ 사업 개요

- (대상사업) 5개 분야 124개 사업
 - (신규여부) 신규 95, 계속 29
 - (사업기간) 임기내 71, 임기후 계속 53
 - (재정투자) 예산 100, 비예산 24



- (총사업비) 16조 344억원(국비 91,798, 도비 11,182, 시군비 12,178, 기타 45,186)
 - (시기별) 기투자 1조 8,584억원(11.6%) / 임기내 8조 2,246억원(51.3%) / 임기후 5조 9,514억원(37.1%)
 - (재원별) 국비 57.3%, 도비 6.9%, 시군비 7.6%, 민자(기타) 28.2%

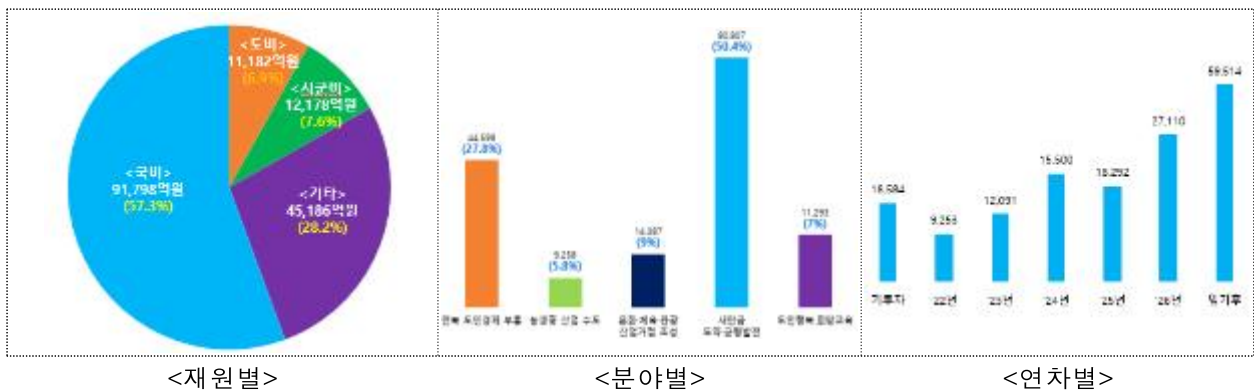

□ 자원투자 계획

(단위 : 건, 억원)

구분	사업수			사업비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	기타
합 계	124	100	24	160,344.23	91,797.59	11,182.51	12,177.74	45,186.4
I. 전북 도민경제 부흥	23	19	4	44,598.91	11,286.17	3,184.1	3,200.94	26,927.7
II. 농생명 산업 수도	19	18	1	9,257.8	5,157.6	1,775.99	1,561.61	762.6
III. 문화·체육·관광 산업거점 조성	20	18	2	14,387.27	5,377.42	3,954.02	3,749.43	1,306.4
IV. 새만금 도약·균형발전	28	14	14	80,807	64,351	117.8	148.5	16,189.7
V. 도민행복·희망교육	34	31	3	11,293.25	5,625.4	2,150.6	3,517.26	-

II 추진상황 점검결과

□ 점검 개요

- (점검기준) 2025. 9월말 기준
- (점검대상) 5개 분야 124개 사업
- (점검근거) 전북특별자치도지사 공약사항 관리조례 제10조(자체평가)
- (점검내용) 사업별 추진실적 및 공약 이행도, 도민소통 실적 등

< 공약 이행도 판단 기준(한국매니페스토실천본부 평가기준 준용) >

이행완료	◦ 공약이행이 완료되어 종료된 사업
이행 후 계속추진	◦ 공약(목표) 이행완료 후 추가목표를 세워 추진 중인 사업 ◦ 공약(목표) 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업
정상추진	◦ 내용이 정상적으로 추진 중이고, 임기종료 시점까지 완료가 예상되는 사업
일부추진	◦ 추진하고 있으나, 예상목표를 달성하지 못하고 있는 사업

(완료 세부기준) 입법 관련 공약 : 법, 조례 통과, 재정관련 공약 : 재정 확보

- 조성사업(산업단지 등) : 입법 및 재정확보 후 사업 개시 / - 건설사업(SOC 도로건설 등) : 입법 및 재정확보 후 사업 개시
- 시설유치 사업 : 입법 및 행정결정 등 완료 시 / - 자본유치 사업 : 양해각서에 그치지 않고 자본유입이 시작되었을 경우
- 건립 공약 : 완공되었을 경우(착공은 정상추진으로 분류) / - 재건축, 재개발 사업 : 입주가 시작되었을 경우(착공은 정상추진으로 분류)

□ 점검 결과

- (이행률*) 68.5%

- 이행완료 12개, 이행 후 계속추진 73개, 정상추진 33개, 일부추진 5개, 폐기 1개

계	달성		추진중		폐기
	이행완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	
124	12	73	33	5	1

* 이행률 = [(이행완료 공약수 + 이행 후 계속추진 공약수) / 전체 공약수] × 100

- (분야별 사업 이행상황)

분야별	사업비 (억원)	사업수 (개)	이행(추진)상황				폐기
			이행완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	
5개 분야	160,344.23	124	12	73	33	5	1
I. 전북 도민경제 부흥	44,598.91	23	4	11	6	2	-
II. 농생명 산업 수도	9,257.8	19	1	15	3	-	-
III. 문화·체육·관광 산업거점 조성	14,387.27	20	-	12	7	1	-
IV. 새만금 도약·균형발전	80,807	28	4	13	9	2	-
V. 도민행복·희망교육	11,293.25	34	3	22	8	-	1

Ⅲ 분야별 추진상황

□ 연도별 이행률

<구 분>	<'24.8.>	<'24.10.>	<'24.12.>	<'25.1분기>	<'25.2분기>	<'25.3분기>
이행률	43.5%(+3.2)	46%(+2.5)	54%(+8.)	58.8%(+4.8)	64.5%(+5.7)	68.5%(+4.0)
이행완료	8개 사업	8개 사업	11개 사업	11개 사업	11개 사업	12개 사업
이행 후 계속추진	46개 사업	49개 사업	56개 사업	62개 사업	69개 사업	73개 사업
정상추진	70개 사업	67개 사업	57개 사업	46개 사업	38개 사업	33개 사업
일부추진 등	-	-	-	5개 사업	6개 사업	6개 사업



- **이행완료** : 공약 이행이 완료되어 종료된 사업(10%)
- **이행 후 계속추진** : 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업 등(59%)
- **정상추진** : 내용이 정상적으로 추진 중이고, 임기종료 시점까지 완료가 예상되는 사업(27%)
- **일부추진 등** : 추진하고 있으나, 예상목표를 달성하지 못하고 있는 사업(4%)

- (전북 도민경제 부흥) ① 대기업 계열사 6개 유치(두산, LG화학, GEM코리아, LSLnF, 삼성, 한국미래소재) ② 글로벌 자산운용사 전주사무소 9개소 유치 (BNY, 프랭클린템플턴, 블랙스톤, 하인즈, 코람코, 티시먼 스파이어, 핼코, 스텝스톤, PGIM) ③ 재생에너지 국가종합실증 연구단지 실증연구동 착공(24.3.) ④ 호남권 AI융합 지능형 농업 생태계 구축 공모 선정(24.4.) ⑤ 글로벌 혁신 의료기술 실증지원센터 공모 선정(24.5.) ⑥ 농식품분야 메타버스기반 기술실증 지원 공모선정(24.6.) ⑦ 금융산업 육성 협력을 위한 '도-우리금융그룹-국민연금공단' 협약 체결(24.6.) ⑧ K-UAM(도심항공교통) 기술개발경연대회 개최(24.10.) ⑨ 수소특화 국가산업단지조성 예타대상 선정(24.10.) ⑩ 해상풍력산업지원센터 착공 (24.12) ⑪ 새만금산단 미래모빌리티테크센터 개소(24.12) 등 전북 산업 활성화 및 기반 구축



< 금융산업 육성협력을 위한 (도-우리금융-국민연금공단) 협약 >



<해상풍력산업지원센터 조감도>




<코람코 자산운용사 유치>

- (농생명 산업 수도) ① 치유농업 확산을 위한 치유농업센터 공모 선정('23~'24.) ② GMP기반 농축산용 미생물산업화지원시설 구축(정읍, '22~'24.) ③ 국가 식품클러스터 2단계 국가첨단산단 후보지 선정('23.3.) 및 기본협약 추진('24.12) ④ 동물용 의약품 효능·안전성 평가센터 완공(익산, '24.1.) ⑤ 동물용의약품 임상시험 지원센터 구축 타당성 조사 연구용역 완료(농식품부, '24.9.) ⑥ 발효테마파크 야간경관 조성사업 완료('24.10.) ⑦ 지능형 농기계 실증단지 부지조성 설계 용역 완료('24.12) ⑧ 반려동물 동반 국민여가캠핑장 준공('24.12) ⑨ 부안 치유농업센터 구축 완료('24.12) ⑩ 온라인 유통기업과의 협력을 통한 매출액 증가('25.3월기준 매출액 149억원, 회원수 40,11명) ⑪ 농축산용 미생물 공유 인프라 구축 공사 착공('25.1), ⑫ 동물용시제품 생산시설 설계용역 완료('25.3.) 등 농생명 산업 수도로서의 전북 위상 강화



< GMP기반 농축산용 미생물산업화지원시설 >

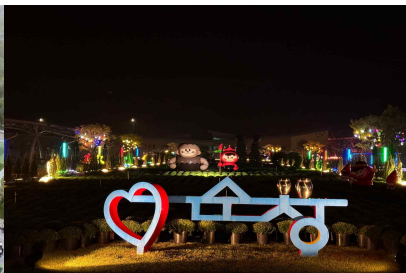

< 발효테마파크 야간경관 조성 >



< 반려동물 동반 국민여가캠핑장 >

- (문화·체육·관광 산업거점 조성) ① 완주군 종합 스포츠타운 족구장, 농구장, 풋살장 준공('23.6.) ② 전주 월드컵 스포츠타운 육상경기장, 야구장 착공('23.6.) 및 추진('25.3월기준 52.75%) ③ 문화 예술 콘텐츠원캠퍼스 최우수사업 선정('24.2) ④ 전주 월드컵 스포츠타운 실내체육관 착공('24.4), ⑤ '24 전북형 치유 관광지 10개소 선정('24.5.) ⑥ 24년 콘텐츠원캠퍼스 3개 대학(호원대, 전주대, 우석대) 과제운영 협약체결('24.7.) ⑦ 전북 글로벌 마이스 육성센터 설립 및 마이스 비전선포식 개최('24.6. / '24.8.) ⑧ 유소년 스포츠 콤플렉스 건립사업 업무협약('24.10.), ⑨ 국민체육센터 6개소 건립(정읍 1, 남원 1, 전주 1, 부안 1, 완주 2) ⑩ K-문화지원센터 건립 타당성 연구용역 완료('24.12.), ⑪ 갯벌치유센터 공사착공('24.12), ⑫ '25년 전북형 웰니스관광지 10개소 선정('25.4.), ⑬ 2025 세계관광산업컨퍼런스 행사 개최('25.6, 해외 10여개국 국제기구 인사 등 150명), ⑭ 전주전시컨벤션센터 건립 기공식('25.9) 등 문화·체육 인프라 확충



<'25 세계관광산업컨퍼런스>



< 갯벌 치유센터 조감도 >



<전주전시컨벤션센터 건립 기공식>

- (새만금 도약·균형발전) ① 새만금 국제투자진흥지구 지정(23.6.) ② 전북특별자치도 설치 등에 관한 특별법」 제정안(22.12.) 및 「전북특별자치도 설치 및 글로벌 생명경제도시 조성을 위한 특별법」 전부개정안 국회 본회의 통과(23.12.)로 명실상부한 전북특별자치도 출범 기반 마련 ③ 인구청년지원연구센터 설치(24.1.) ④ 새만금 자율운송 상용차 실증지원 인프라 및 통합관제센터 설계 완료(24.1.) ⑤ 새만금 국제공항 실시설계 적격자 선정 및 실시설계 착수(24.7.), 새만금 국제공항 활성화 협의회 구성(24.10.) ⑥ 외국교육기관 유치 관련 「새만금사업법」 개정(24.12.) 및 업무협약(25.3.), ⑦ 제6차 국도·국지도 건설계획 일괄예타 대상사업 선정(비예타, '25.1.), ⑧ KDI 일괄예타 현장조사 대응(25.5.16~21), ⑨ '새만금항'으로 통합 지정(25.5.2), ⑩ 새정부 국정과제(51번) '새만금 도약 반영확정 (25.9.16.) 등 새만금을 미래 신산업 중심지로 조성



< 새만금 투자진흥지구 지정 >



< 전북특별자치도 설치 등에 관한 특별법 통과 >



< 외국교육기관 설립추진 업무협약 >

- (도민행복·희망교육) ① 공공산후조리원 건립 부지 매입(23.4.) 및 조례 제정(23.5.) ② 서해안 유네스코 세계지질공원 인증 확정(23.5.) ③ 장애인 종합지원센터 설치 운영(24.1.) ④ '24 RIS 핵심분야 및 자율과제 공모 선정(24.4.) ⑤ 남원 공공산후조리원 건립 공사 착공(24.7.) ⑥ '24 글로벌컬대학 30(원광대+원광보건대) 최종선정(24.8.), ⑦ 「전북인복지」 플랫폼 개통식(24.8.) ⑧ 국적취득 모바일 교재 「전북국적+」 개발 및 배포(24.10.), ⑨ 「전북자치도 가족센터 설치 및 운영 조례」 제정(24.11.) ⑩ 전북자치도 라이즈 기본계획 수립(24.12.) ⑪ 복지자원 통합관리 플랫폼 활성화를 위한 전북인복지 주간 뉴스클리핑 서비스 시행(25.3.), ⑫ 광역가족센터 설치·운영(25.1), ⑬ 정읍 어린이 기적의 놀이터 개장(25.9.) 등 도민이 행복한 전북특별자치도 조성



< 24년 글로벌컬대학 30 (원광대+원광보건대) 최종선정 >



< 장애인종합지원센터 설치 >



< 정읍 어린이 기적의 놀이터 개장 >

□ 예산확보 현황

○ (총사업비) 16조 344억원

(단위 : 억원, %)

재정계획			확보액				반영률	
총액	임기내 (a)	임기후 (b)	계 (c=d+f)	~'24년 (d)	'25년		임기내 대비 (c/a)	'25년 대비 (f/e)
					계획(e)	확보(f)		
160,344	100,830	59,514	67,834	53,318	18,292	14,516	67.2	79.3

○ ('25년) 분야별 확보 현황

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	'25년 필요액	'25년 확보액					확보율 (%)
			계	국비	도비	시군비	기타	
합 계	160,344.23	18,292	14,516	6,011	2,173	1,788	4,544	79.3
I. 전북 도민경제 부흥	44,598.91	2,948	1,535	602	270	344	319	52.1
II. 농생명 산업 수도	9,257.8	1,564	1,267	346	376	328	217	81.0
III. 문화체육관광 산업거점 조성	14,387.27	2,748	1,972	581	937	454	-	71.8
IV. 새만금 도약·균형발전	80,807	8,848	6,522	2,493	12	9	4,008	73.7
V. 도민행복·희망교육	11,293.25	2,184	3,220	1,989	578	653	-	147.4

□ 도민소통 실적

○ 도민소통 및 사업 추진을 위한 거버넌스 구축·운영 실적 1,532건

- K-UAM 기술개발경연대회('24.10.), RE100 에너지 솔루션 얼라이언스 운영협의회('24.10.), 도민 실무금융교육 강화를 위한 업무협약('24.10.), 혁신 도시 활성화를 위한 대토론회('24.10.), 완주 로컬푸드 참여농가 현장 견학('24.10.), 장애인종합지원센터 정책간담회('24.10.), 금융혁신기업 대상 투자 IR 개최('24.12.), 치유농업 관련 2024년도 농촌자원사업 종합평가회('24.12.), 전북자치도-새만금개발공사 업무협약('25.3.6), 해외 우수 인재 유치를 위한 도-원 광대-한국생산성본부-(주)참프레 업무협약('25.3.7), 도-이전 금융기관-국민연금공단 소통 간담회('25.3.31), 새만금 신항의 항만지정 심의회 개최('25.5.2), '25 세계관광산업컨퍼런스 개최('25.6.6), 전북도 대한민국 스마트농업의 중심지 언론보도('25.6.12.), 새만금국제공항 현안사항 토론('25.9.20) 등

(단위 : 건)

구 분	사업수	유형별 실적							
		합계	설명회, 토론회 등	만족도 조사	전문가 자문	언론/방송 보도	간담회	보고서 발간	기타
합 계	124	1,532	189	34	148	426	393	5	337
I. 전북 도민경제 부흥	23	393	51	20	34	112	111	0	65
II. 농생명 산업 수도	19	364	47	0	37	83	94	0	103
III. 문화·체육·관광 산업거점 조성	20	210	12	5	20	62	29	3	79
IV. 새만금 도약·균형발전	28	208	54	1	44	59	26	1	23
V. 도민행복·희망교육	34	357	25	8	13	110	133	1	67

□ 예비타당성조사 대상사업 추진 현황(총 13개 사업)

예타 통과 0

신청준비·완료 9

기획 단계 4

관리번호	공약사업	예타대응 계획	비고
7	특수목적선 선진화단지 조성	◦ 항만기본계획 변경 및 예타대상 사업 선정 등 국가재정사업 반영 추진을 위한 활동 전개	기획단계
18	청정수소 활용산업 클러스터 구축	◦ 예타대상사업 선정('21.8월), 예타 철회('23.11월) ◦ 예타 재기획용역('24.~'25.) 및 예타대상사업 신청('26년)	기획단계
19	수소특화 국가산업단지 조성	◦ 제안서 제출('22.10월) ◦ 국가산단업지 후보지 선정('23.3.15.) ◦ 사업시행자 선정('23.4.28.), ◦ 상생협약 체결('23.7.5.) ◦ 사전타당성 용역 착수('23.12., LH) ◦ 기본협약 체결('24.6.) ◦ 예비타당성 대상 선정 통보('24.10.) 및 예타신청('24.11.)	신청완료
26	국가식품클러스터 2단계 확장	◦ 1단계 성과분석 및 발전방안 연구용역 추진('23) ◦ 예비타당성 신청 및 입수수요 활동 전개('24~) ◦ 입수수요 조건완화 부처(행안부, 기재부) 건의('24.3.28) ◦ 입수수요 개선건의 부처(행안부, 기재부) 건의('24.4.2~3) ◦ 사전타당성 용역('23.12.. ~ '25.11. LH) ◦ 기본협약 체결('24.12), 관계기관협의 (농식품부)(5회-'25.2~8)	신청준비
44	국립해양문화시설 건립 기본구상	◦ 기본구상 및 사전 타당성 조사 용역 완료 ('23.4.~'24.6., 해양수산부) ◦ 사업부지 사용 및 매입관련 사전협의('24.7., 농식품부) ◦ 예비타당성조사 대상사업 신청('24.11.) ◦ 기재부 재정사업평가위원회 심의결과 미선정('25.1.) ◦ 기본구상 및 타당성 등 보완용역 추진('25.3.~12.) ◦ 예비타당성 조사 대상사업 재신청(해수부→기재부)('26.2)	신청준비
73	새만금 남북3축 도로 건설	◦ 예타 대상사업 선정 신청을 위해 연구용역 시행('24.6.) ◦ 예비타당성조사 신청('24.11.) 및 미반영('25.1.) ◦ 예비타당성조사 면제 신청('25.8.)	신청준비
83	국도13호선 위험구간(장수~천천) 개선	◦ 제6차 국도·국지도 건설계획('26.~'30.) 반영 건의활동 전개 - 제6차 국도·국지도 건설계획 수요조사 제출('23.4.) ◦ 제6차 국도·국지도 건설계획('26~'30) 일괄예타 대상사업 선정('25) - (변경) 비예타 대상사업(500억 미만)으로 조정 추진 ◦ 건설계획 일괄예타 정책성평가 대응용역 추진('25.2~12)	신청준비
86	전라선 고속화 추진	◦ 예비타당성조사 대상사업 선정('24.10.) 및 착수('24.12.) ◦ 예비타당성조사 개발계획 등 자료제출(도→KDI, '25.9.)	신청완료
87	전주~김천간 동서횡단 철도 건설	◦ 예비타당성조사 신청('24.11.), ◦ 예비타당성조사 미선정('25.12.3)	신청준비
88	국가식품클러스터 산업선 국가계획 반영	◦ 제5차 국가철도망 구축계획('26.~'35.) 반영 건의활동 전개 - 전북권 철도망 구축계획 수립 용역 착수('23.6.)	기획단계
90	전주~대구간 고속도로 건설	◦ 무주~성주 구간 사전타당성조사용역 착수('24.8.) ◦ 전주~무주 구간 직결노선 국가계획 반영 건의('24.~) ◦ 무주~성주~대구 구간 조기 추진 방안 협의('25.6.) ◦ 무주~대구 구간 예비타당성조사 대상사업 신청('25.8.)	신청준비
114	산림치유 인프라(지덕권 친환경 산림고원 조성) 확충	◦ '24년 사전타당성용역 추진(산림청) - 국립시설 조성.운영 및 예타 신청을 위한 지속적 협의	기획단계
118	탄소중립 실현을 위한 생태문명원 건립	◦ 기본계획 수립 및 예타대응방안 연구용역 완료('24.4.) ◦ 예타대상사업 신청('25.8.)	신청완료

□ 제도개선 추진 실적(총 17개 사업)

제도개선 완료 11(법률 4, 조례 7)

법률 제·개정 추진·준비중 6(법률 5, 조례 1)

관리 번호	공약사업	제도개선사항 추진상황 및 계획	비고
13	새만금 SK데이터센터 조속 추진	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 새만금사업법 개정('22.12.8.) ◦ 새만금사업법 시행령 개정 및 시행('23.6.28.) 	법률 개정
43	해양치유 거점단지 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 「전북특별자치도 해양치유자원 관리 및 활용에 관한 조례」 제정 - 해양치유자원의 관리와 필요한 사항을 규정함으로써 치유산업 활성화 ▣ 조례 제정 완료('23.3.) 	조례 제정
46	지리산권 관광특구단지 추진	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 지리산권 특별자치단체 설치 조례 제정('25년) ▣ 5개 지자체(남원,구례,산청,함양,하동) 업무협약('22.12.) 	조례 제정
60	국제 태권도 사관학교 설립	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 태권도 진흥 및 태권도공원 조성등에 관한 법률 개정('26년) ▣ 타당성 조사 용역 완료('24.6.) 	법률 개정
63	새만금 국제투자진흥지구 지정	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 새만금사업법, 조세특례제한법 개정('22.12.8.,12.23.) ◦ 새만금사업법 시행령 개정 및 시행('23.6.28.) 	법률 개정
66	국제학교 유치	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 내국인 입학제한이 없는 새만금 국제학교 설립을 위한 새만금사업법 개정(안) 제출('23. 2월) 및 전북특별자치도 특례조항 발굴('23. 2월~3월) ◦ 국제학교 관련 토론회 개최('23.2.24., 3.15.) ◦ 유관기관(도교육청, 전북연, 새만금개발청공사, 부안군) 업무협약(5회) ◦ 국제학교 특례조항 관련 부처 협의(교육부/5회) ▣ 전북특별자치도 특별법 제정을 위한 입법대응 추진 ◦ 새만금개발청, 새만금개발공사 협의(2회) ▣ 새만금사업법 개정 입법대응 추진 ◦ 제22대 국회 새만금사업법 개정 발의('24.6.5) ◦ 새만금사업법 개정안 국회 국토위 상정('24.8.21) ◦ 새만금사업법 개정안 국회 국토위 심의 의결('24.9.26) ◦ 새만금사업법 개정('24.12.3) 및 새공과 업무협약체결('25.3.6) 	법률 개정
74	전북특별자치도 설치	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 전북특별자치도 설치 등에 관한 특별법 제정 ▣ (발의) 안호영('22.4.12.), 한병도, 정운천('22.8.18.) (본회의 통과) '22.12.29. ◦ 전북특별자치도법 전부개정안 국회 본회의 통과('23.12.) 	법률 제정
75	완주·전주 상생 협력추진 지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 통합시법 제정('25년) 	법률 제정

관리 번호	공약사업	제도개선사항 추진상황 및 계획	비고
96	글로벌 청소년 인재 양성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 「글로벌 청소년 리더센터 운영 관리 조례」 제정 ('24.9.) ▣ 글로벌 청소년 리더센터 운영 근거 마련 ▣ 청소년수련시설 설치 및 운영 조례안 입법예고(24.7.19~8.8) ▣ 청소년수련시설 설치 및 운영 조례 제정('24.9.) 	조례 제정
97	신혼부부·청년 임대주택 임대보증금 지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 전라북도 저소득계층과 청년 및 신혼부부 주거 지원 조례 개정 ▣ 조례 공포·시행('23.3.3.) 	조례 개정
99	1인 가구 주거 안전 방문 지키미 사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 「전라북도 1인가구 지원 조례」 제정('22.11.) ▣ 1인가구 주거 안전 방문지킴이 지원사업 추진('23년~) 	조례 제정
100	전라북도 일·생활 균형 지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 전라북도 일·생활 균형 지원에 관한 조례 제정 ▣ 공포 및 시행('23.10.4. 시행) 	조례 제정
105	다문화가정 원스톱 지원 서비스 고도화	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 전북특별자치도 광역가족센터 운영 지원 조례 제정('24년) ▣ 공포 및 시행('24.11.1. 시행) 	조례 제정
119	국립공공보건의료대학원 설립	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 국립의학전문대학원법 제정('24년) ▣ 국회 복지위 제2법안소위 법안심사(24.8.23/11.20/25.8.20) 	법률 제정
120	디지털 헬스케어 시범사업 추진	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 비대면 진료 제도화 위한 「의료법」 개정('25년~) ▣ 5건 발의, 4건* 국회 복지위 상정('25.8.19.) * 최보윤('25.3.21.), 우재준(4.18.), 전진숙(6.11.), 권철승(8.13.), 김윤(9.11.) 의원안 	법률 개정
122	공공산후조리원 건립	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 전북특별자치도 공공산후조리원 설치·운영 등에 관한 조례 제정 완료('23.5.8.) ▣ 공공산후조리원 건립 추진('24년~) 	조례 제정
124	지역발전 생태계 조성을 위한 지역대학 경쟁력 제고	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 고등교육위원회 구성을 위한 지방대육성법 개정('25년) ▣ 준비중 	법률 개정

IV

사업추진 현황

이행완료 : 12개

관리번호	사업명	공약목표 및 추진상황
1	5개 대기업 계열사 유치로 양질의 일자리 확충	<ul style="list-style-type: none"> ◦(목표) 대기업 계열사 5개 유치 ▶ 6개사 유치 : 두산, 삼성, LG화학, LS-L&NF배터리솔루션, LSMnM, 한국미래소재
2	대기업 계열사 유치 추진 전담조직 구성 및 거버넌스 구축	<ul style="list-style-type: none"> ◦(목표) 기업유치 전담조직 구성 및 거버넌스 구축 ▶ 도지사 직속으로 전문조직(기업유치, 기업지원, 애로해소) 구성·운영 - 1사 1공무원 담당제 추진 ▶ 기업유치 관련 위원회(11개) 활용계획 수립 및 전문가 세미나 개최
8	현대중공업 군산조선소 재가동	<ul style="list-style-type: none"> ◦(목표) 현대중공업 군산조선소 재가동('23년) ▶ 군산조선소 사내협력사 선정(13업체), 사내협력사 직원 모집('22.7.~11.) ▶ 군산조선소 재가동 선포식('22.10.28.) ▶ 군산조선소 본격 가동으로 생산된 블록 출항식('23.2.10.) ▶ 조선업 일자리 매칭데이 운영('23.3.9.~9.) ▶ 군산조선소 재도약 TF 구성 및 킥오프 회의('24.5.1.) ▶ 군산조선소 재도약 TF 회의('24.9.26., '25.2.20., '25.4.17./'25.9.24.)
10	메타버스 융복합 산업 육성	<ul style="list-style-type: none"> ◦(목표) 메타버스 플랫폼 구축 3건 ◦(목표) 메타버스 콘텐츠 제작지원 20건 ▶ 메타버스 플랫폼 구축 2건 완료, 콘텐츠 제작 지원 20건 완료 - 새만금 챔버 메타버스 서비스 제공('23.6.8.) - 한옥마을 메타버스 플랫폼 구축('23.12.) - 메타버스 활용 콘텐츠 제작 지원('22년 10건, '23년 10건) ▶ 전주-익산 도서관 여행 메타버스 구축사업 중간평가('24.4.) ▶ 한옥마을 메타버스 플랫폼 구축 홍보회의('24. 6.) ▶ 한옥마을 메타버스 플랫폼 서비스 오픈 및 홍보('24. 8. ~ 9.) ▶ 전주-익산 도서관 여행 메타버스 구축 검수 중('24.10.) ▶ KMF 연계 새만금 메타버스 체험관 홍보('24.10.)
37	반려동물 특화단지 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦(목표) 반려동물 지원센터 조성 1개소 ◦(목표) 반려동물 동반 국민여가캠핑장 조성 1개소 ◦(목표) 반려동물 산업단지(오수제2농공단지) 조성 ▶ 반려동물 지원센터 준공('23.12.) ▶ 반려동물 동반 국민여가캠핑장 준공('24.12.) ▶ 반려동물 산업단지 조성 완료('23.9.) ▶ 반려동물 지원센터 운영('24.7.~) 및 국민여가캠핑장 시범운영('24.11.) ▶ 반려동물 동반 국민여가캠핑장 준공('24.12) 및 민간운영 위탁계약('25.6.) ▶ 반려동물 동반 국민여가캠핑장 개장 및 운영('25.7.~)
63	새만금 국제투자진흥지구 지정	<ul style="list-style-type: none"> ◦(목표) 글로벌 기업유치 등을 위한 인센티브 마련 등 국제투자 진흥지구 지정('26년) - (세제) 입주기업에 법인소득세 등 감면 - (입지) 장기임대용지 추가공급 - (기업활동) 항만·공항 배후 산업단지 자유무역지역 지정 추진 및 규제개선 ▶ 새만금사업법, 조세특례제한법 개정('22.12.8.,12.23.) ▶ 투자진흥지구 지정 관련 새만금사업법 시행령 개정 및 시행('23.6.28.) ▶ 새만금투자진흥지구 지정('23.6.28.)
74	전북특별자치도 설치	<ul style="list-style-type: none"> ◦(목표) "전북특별자치도 특별법" 제정 ▶ 국회 통과('22.12.29.) ▶ 전북특별법 1차 개정(23) 후 전북특별법 전부개정안 마련(232개 조문) ▶ 전북특별법 전부개정안 국회 본회의 통과('23.12.8.) (131개 조문/333개 특례) ▶ 전북특별자치도 종합발전 방안 용역 추진('23.3.~'24.3.) - 도민의식 조사, 광역단위 특례 발굴, 법률 및 제도개선 사항 마련 등

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
78	대한방직 부지 개발 행정적 협력 추진	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 장기간 방치된 부지를 재생하여 전주의 랜드마크 마천루(타워) 조성 지원 - 문화관광·업무시설 향후 모악산 송신탑 이전 등 다양화된 공간수요에 대응하는 도시기본계획 변경 승인 ▣ 사전협상대상지 선정 통보(전주시→민간, '24.2.27.) ▣ 협상 제안서 제출(민간→전주시, '24.3.7.), ▣ 주민설명회 개최('24.4.), 감정평가 실시('24.5.), 시의회 의견청취('24.6.11.) ▣ 도시건축공동위원회 자문('24.6.20.), 협상결과통보('24.6.26.), 협상결과 수용('24.6.27.), 도시관리계획 입안제안서 제출('24.6.28.) ▣ 도시기본계획 일부변경(안) 공청회 개최('24.8.7.) ▣ 도시기본계획 일부변경(안) 승인 신청('24.9.11.) ▣ 도시기본계획 일부변경(안) 道도시계획위원회 심의('24.11.5.) ▣ 2035년 전주시도시기본계획 일부변경(안) 승인('24.11.7.)
81	익산시 구도심 도시재생사업 지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 도시재생 뉴딜사업 성과평가 추진(완료 및 '23년 완료예정인 9개 사업 평가) ◦ (목표) 익산시 중앙동 도시재생사업 완료('23년) - (HW) 거점시설 및 공공시설 준공 - (SW) 창업지원 및 문화축제 등 공동체 활성화 지원 ▣ 도시재생 뉴딜사업 9개 사업 성과평가 완료('22년) ▣ 중매서 커뮤니티라운지 및 문화주차장(1공구) 조성 등('22년 준공), 음식식품 교육문화원 조성 및 운영('23.7.~), 문화주차장(2공구) 준공('23.12.), 중앙동 도시재생사업 완료('23.12.), 거점시설 프로그램축제 및 행사·도시재생대학 운영 추진('23년~) ▣ 사업완료지역 거점시설 운영 모니터링 및 교육지원('24.7.~)
93	장애인 종합지원센터 건립	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 장애인종합지원센터 설치 ▣ 6개동(탈시설, 재활치료, 체험홈4) 리모델링 공사 완료('23.12.) ▣ 운영주체 선정 및 위수탁 계약 체결('23.9.) ▣ '24년 공공기관 위탁 심의 및 의회 동의('23.10.) ▣ '24년 운영 위수탁 협약 체결(도·사회서비스원) ('23.12.) ▣ 직원 채용(10명)및 개소 준비(환경구성, 물품구입 등)('23.10.~'24.3.) ▣ 장애인종합지원센터 개소식('24.4.16) ▣ 타 시도 벤치마킹('24.6.7) ▣ 장애인종합지원센터 운영위원회 위원 위촉('24.7.12.) ▣ 장애인종합지원센터 홍보 및 여름물놀이터 운영('24.8.5.~9) ▣ 장애인종합지원센터 운영위원회의 개최(6회, '24.7.~'25. 9.) ▣ 도·사회서비스원·장애인종합지원센터 운영간담회(10회, '24.9.~'25.9.) ▣ 장애인종합지원센터 운영 전반 지도·점검('24.11.5.) ▣ 장애인종합지원센터 산업박람회 홍보 부스 운영('24.11.13~14) ▣ 2024 지역사회 포럼 개최(장애시민의 온전한 지역사회 삶)('24.11.27.) ▣ 2024년 장애인종합지원센터 운영 평가 계획 수립('24.12.) ▣ 2025년 장애인종합지원센터 운영계획 수립('25.2.7.) ▣ 장애인종합지원센터 거점기능 강화방안 토론회('25.2.24.)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
101	정읍시 어린이 기적의 놀이터 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 전국 최대 '기적의 놀이터' 조성 ▣ 공유재산 심의 및 관리계획 승인('22.12.), 지방재정투자심사 및 중기 지방재정계획 반영('22.12.) ▣ 선진지 견학('23.2.6.) 및 기본 및 설계 용역 완료('23.3.~10.) ▣ 놀이터 실시계획 용역 최종보고회 개최('24.2) ▣ 도 감사위원회 원가 심사('24.7) ▣ 놀이터 조성 공사 착공('24.8) ▣ 2024년 상반기 특별교부세 교부대상(행안부) 선정('24.8.) ▣ 놀이터 조성 추진상황 현장 점검('24.11.) ▣ 놀이터 조성 공사 준공('25.6.) ▣ 놀이터 시범운영('25.7.~8.) 및 개장식 개최('25.9.1.)
108	전북 서해안 유네스코 세계 지질공원 인증	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 전북 서해안(고창, 부안군) 유네스코 세계지질공원 인증 1개소 ▣ 유네스코 심사위원 현장실사('22.9.30.~10.3.) 세계지질공원 이사회 인증 권고(안) 확정('22.12.7.) 유네스코 집행이사회 인증 최종 의결('23.5.18.)

□ 이행 후 계속추진 : 73개

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
3	지방-산업-대학 연계형 인력양성 시스템 및 지원체계 구축	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 지자체 전북지역 혁신플랫폼(50개 기관) 구축·운영 ◦ (목표) 기업수요 맞춤형 전문인력 양성(매년 1,100명 이상) ▣ '23년 RIS 신규지역 공모 최종 선정(국비 1,500억원 확보) RIS 실행계획 최종 제출('23.7.18), RIS 대학교육 혁신본부 및 3개 사업단 조직(8월) RIS 지역혁신 자율과제 공모 선정(23.9), 사업단별 기업수요 맞춤형 MOU 체결(23.10~11) ▣ 기업수요 맞춤형 인력양성 : ('22년) 1,231명, ('23년) 1,150명 ▣ JST 공유대학 학생모집(262명) 개강(3.4) ▣ RIS 핵심분야 45개 소과제 추진('23.8~'24.2) ▣ 시군 현안해결형 자율과제(31개) 발굴 및 추진('23.9~'24.2) ▣ '24년 대학 산학관 커플링 15개 사업단 선정('24.1) ▣ 'JST 공유대학' 학생모집 홍보 및 선발(265명)('24.1~2월) ▣ RIS 핵심분야 1차 과제공모(2~3월) 및 선정(22개 77억원)('24.4.19) ▣ RIS 핵심분야 2차 과제공모(5월) 및 선정(87개 139억원)('24.6.21) ▣ 'JST 공유대학' 2학기 추가모집(36명 추가, 총287명)('24.8.7) ▣ 'JST 공유대학' 운영 확대를 대학별 운영방안 마련 협조 요청(24.10.29) ▣ 사업단별 추진상황 및 사업비 집행점검('24.9~12월) ▣ 한국연구재단 RIS 종합평가('24.12.18)
4	취업경쟁력 강화를 위한 청년인턴 확대	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 취업 경쟁력 강화를 위한 청년인턴 5,000명 확대 - ('22년) 760명, ('23년) 850명, ('24년) 950명, ('25년) 1,100명, ('26년) 1,440명 ▣ 도 청년 직무인턴 : ('22년) 262명, ('23년) 312명, ('24년) 323명 ('25년) 433명 ▣ 고용노동부 국민취업지원제도 활용 : ('22년) 500명, ('23년) 570명 ('24년) 679명 ('25년) 600명
6	청년 생활안정 기반 지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 전북형 청년수당 매월 30만원, 최대 12개월 지급 - ('22년~'23년) 2,500명 → ('23년) 사회보장협의를 → ('24년~'26년) 매년 3,000명 ◦ (목표) 전북형 청년활력수당 매월 50만원, 최대 6개월 지급 - ('23년) 사회보장협의를 → ('24년~'26년) 매년 2,000명 ◦ (목표) 전북청년 함께 두배적금 매월 10만원, 최대 24개월 지원 - ('23년) 사회보장협의를 → ('24년) 500명 → ('25년~'26년) 매년 1,000명 ▣ 청년수당 지원('23년 3,000명, '24년 3,000명, '25년 3,000명) ▣ 청년활력수당 지원('23년 2,000명, '24년 2,000명, '25 2,000명 예정) ▣ 청년 함께 두배적금 지원('23년 301명, '24년 1,000명, '25년 1,300명) ▣ '19-23년 전북청년 지역정착 지원사업 참여자 만족도 조사('25.2.) ▣ '25년 전북청년 함께 두배적금 사업 시군설명회 실시('25.2.) ▣ '25년 함성패키지 사업 대상자 모집 및 선정('25.1.~5.) ▣ '25년 전북청년 함께 두배적금 금융교육컨설팅 및 만족도 조사('25.6.~9.)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
9	미래차 산업벨트 구축	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 새만금 내 1~3단계 자율주행 상용차 원스톱 실증기반 구축 ◦ (목표) 김제 특장단지 기능 고도화를 위한 전문기술지원센터 구축 ◦ (목표) 완주 수소상용차 핵심부품 개발 및 시험평가인증 지원 전용플랫폼 구축 ▣ 자율주행 상용차 실증지원 도로 인프라 설계 완료('23.1.~'24.7.) ▣ 자율주행 상용차 실증지원 도로 인프라 착공('24. 8. ~ .) ▣ 증견중소 전기차 클러스터 협업기반 장비 구축(~'25.3.) ▣ 특장차 전문기술지원센터 장비 6종 구축 추진(~'24.10.) ▣ 자동차품질인증부품 25건 신규개발('23.1.~12.) ▣ 수소상용차 실차기반 신뢰 내구성 검증기반 구축사업 설계 추진(~ '23.7) ▣ 수소상용차 실차기반 신뢰 내구성 검증기반 구축관련 자체장비 심의회 개최('24.5.) ▣ 수소상용차 실차기반 신뢰 내구성 검증기반 센터 착공('24.12) ▣ 자동차 대체부품 지원 조례 개정(인증기관 지정 근거)('25.3.) ▣ 증견기업-지역 공모사업(미래차 고급연구인력 양성) 선정('25.3.) ▣ 수소상용차 실차 기반 구축 관련 전북-충남 협의회 개최('25.4.)
11	새만금 도심항공교통(UAM) 버티포트 구축	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 국토부 비수도권 지역특화 시범사업 공모 선정('26. 상반기) ◦ (목표) 드론/UAM 전문가 포럼 4회(연 1회) 개최 ▣ 2022년 전주 국제 드론산업 박람회 추진('22.12.9.~12.10.) ▣ 남원시 항공산업(드론-UAM) 클러스터 조성 연구용역('22.10~'23.1.) ▣ 전주 드론-UAM 산업 육성 기본계획 수립 연구용역 진행중('23.7.~'24.6.) ▣ 전북자치도 UAM협의체 회의 운영('23.3./'23.7.) ▣ UAM 실증 서비스 기반 구축 및 관련산업 육성방안 연구용역 수행('24.4~'24.12) ▣ UTK 핵심참여기관 승격('24. 3.) ▣ 도-새만금개발청-K-UAM드림팀 업무협약 체결('24. 4.15.) ▣ 항공얼라이언스 UAM 협의체 간담회('24.5./'24.7.) ▣ UTK 사업모델 워킹그룹 참여('24.5) ▣ 시군대상 시범사업 설명회 ('24.7.) ▣ UAM 실증사업 참여 인원 UAM협의체 위원 추가위촉('24. 9.) ▣ 2024 K-UAM 기술개발 경연대회 ('24.10.) ▣ 항공얼라이언스 정책포럼 및 UAM 산업육성 전략 포럼('24.12.) ▣ UAM 연구용역 최종보고회('24.12.19.) ▣ UAM 실증서비스 기반 구축 관계기관 간담회('24.12.) ▣ 도심항공교통 시범사업 TFR 구성 및 실무회의('25.2.) ▣ 도심항공교통 촉진 및 지원 조례 제정 ('25.5) ▣ UAM 운용을 위한 전북자치도 CNSi 전파환경 분석용역 추진('25.9.)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
12	서해안 데이터센터 집적지 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 데이터·AI 전문인력양성 2,000명 ◦ (목표) 새만금 스마트그린산단 착공 ◦ (목표) 주력산업 빅데이터 플랫폼 구축 ▣ 데이터·AI 전문인력양성 '22년 824명, '23년 668명, '24년 584명 ▣ 그린산단 통합관제센터 부지매입 및 설계용역(24.7), 통합관제센터 착공(25.9) <ul style="list-style-type: none"> - 통합관제센터 및 전력망 구축 국가예산 편성(25년 98억원, '26년 121억원) ▣ 플랫폼 구축을 위해 국가예산 확보에 따른 사업 공모대응 추진 <ul style="list-style-type: none"> - AI융합 지능형 농업 생태계 구축사업 공모 선정(167억) - 농식품 분야 메타버스기반 기술실증 지원사업 공모 선정(295억)
14	생체적합성 탄소소재 의료기기 기술개발	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 탄소소재 의료기기 기술개발 지원 1건 ◦ (목표) 탄소소재 의료기기 실용화 역량강화 지원 7건 ▣ 탄소소재의료기기 개발지원센터 개소(23.4.) ▣ '글로벌 혁신의료기술 실증지원센터' 공모 선정(24.5.) ▣ '탄소소재 기술진흥 기본구상 연구용역' 완료(24.6.~8.) ▣ 탄소소재의료기기 개발지원센터 전체 장비 36종 구축완료(24.9.) ▣ 탄소소재의료기기 기술진흥을 위한 석학 초청 및 글로벌 협력 세미나 2회(24.10.) ▣ 국제 의료기기병원설비 전시회(KIMES) 참가(25. 3. 20. ~ 23.) ▣ 탄소소재 의료기기 임상 실증 등 기술개발 11건 지원(24.7.~25.12.)
18	청정수소 활용산업 클러스터 구축	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 수소 클러스터 구축 사업 기획 완료 ◦ (목표) 산업부 수소 클러스터 구축사업 예타 대상사업 신청 ▣ 그린수소 생산 클러스터 예타대상사업 선정(21.8.) ▣ 예타 진행(21.8.~23.10.) 및 경제성 미확보로 예타 철회(23.11.) ▣ 수소 클러스터 구축 예타사업 재기획 추진(24.~25.) ▣ 수소 클러스터 예타 기획 용역 보고회(24.11.) ▣ 수소특화단지 지정 사업기획 완료(25.7.) ▣ 수소특화단지 지정 업무협약(16개기관) 체결(25.8.) ▣ 수소특화단지 지정 추진(산업부)(25.8.~)
20	새만금 재생에너지 클러스터 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 신재생에너지 평가·인증센터 구축 5개소 ◦ (목표) 혁신 인프라 및 기반 구축 3개소 ◦ (목표) 신재생 에너지 전문인력 1,754명 육성(유지보수 1,500명, 석박사 254명) ▣ 신재생에너지 평가·인증센터 구축(완료 4개소, 구축중 1개소) <ul style="list-style-type: none"> - 새만금 신재생에너지산업 전문인력양성센터 준공(23.5.) - 고분자연료전지 신뢰성평가센터 구축 완료(23.12) 및 장비 구축(42종 83기, '24.6.) - 수상형태양광 종합평가센터 구축 완료(23.12.) - 새만금 에너지산업융복합단지 종합지원센터 준공(24.7.) - 해상풍력산업지원센터 설계용역 완료(24.8.) - 해상풍력산업지원센터 착공(24.12.) ▣ 혁신 인프라 및 기반 구축(완료 1개소, 구축중 2개소) <ul style="list-style-type: none"> - 재생에너지 국가종합실증연구단지 실증연구동 착공(24.3.) - 조선기자재기업 신재생에너지 업종전환지원 사업 완료(24.6.) - 수전해기반 수소생산기지 착공(24.6.), 준공(25.9) ▣ 태양광해상풍력 유지보수 전문인력 육성(22년 602명, '23년 609명, '24년 366명) ▣ 신재생에너지산업 석박사급 전문인력 육성(22년 17명, '23년 41명, '24년 52명)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
21	자산운용 중심 특화 금융도시 육성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 자산운용사 등 금융관련 기관 집적화를 위한 인프라 개선 ◦ (목표) 금융혁신 생태계 육성(금융혁신기업 육성 40개사) ▣ 전북 혁신도시 내 금융 혁신기업 공유오피스 조성 완료('23.11.) ▣ 금융혁신 스타트업 육성 활성화 추진('24년 연중) <ul style="list-style-type: none"> - 전북 혁신도시 내 금융 혁신기업 공유오피스 조성 완료('23.11월) - 금융혁신 스타트업 육성('19년~, 월12개사 / 기업당 5천만원 이내) - 금융혁신 빅데이터 활성화(역량교육, 경진대회, 데이터 안심구역 운영) 5억원, 국가데이터안심구역 지정(과기부), 통계데이터센터 구축(통계청) 등 연계 기반 마련 ▣ 글로벌 자산운용사 전주사무소 추가 개소('22년 이후 9개소) <ul style="list-style-type: none"> - BNY멜론 자산운용그룹('23.7.), 프랭클린템플턴('23.8.), 블랙스톤('24.1월), 하인즈('24.11), 코람코('25.1월), 티시먼 스파이어('25.3월), 핼코('25.4월), 스텝스톤('25.4월), PGIM('25.5월) ▣ 금융산업 육성 협력을 위한 '도-우리금융그룹-국민연금공단' 협약 체결(24. 6) <ul style="list-style-type: none"> - 국민연금 빅데이터 활용 新사업 발굴, 핀테크기업 디노랩 설치, 금융교육 등 ▣ 금융산업 육성 특례(5개 조항) 반영에 따른 후속절차 이행 <ul style="list-style-type: none"> - 특례 구체화를 위한 계획수립 및 조례 개정 (24.12) ▣ 도민 금융역량 강화를 위한 금융교육 추진('24.4) <ul style="list-style-type: none"> - 도민맞춤형 실용금융교육 추진('24.4~), 글로벌대학 과제 발굴('24.7월), 범도민 맞춤형 금융교육 활성화 업무협약(금감원 등 / '24.10) ▣ 금융도시 도약을 위한 금융허브 발전전략 마련(연구용역, ~'24.11) <ul style="list-style-type: none"> - 지속 가능한 글로벌 금융허브를 비전으로 3대 전략(자산운용, 기후에너지 및 스마트농생명) 15대 과제 제안 ▣ 금융위에 선제적 제시를 위한 '전북 금융중심지 개발계획' 수립 추진 (전북연 현안과제, '25.3~11월) ▣ 디지털금융 활성화를 위한 전국최초, 전북 핀테크육성지구' 지정·고시(25.8.1)
22	금융공공기관 유치 추진	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 타깃 공공기관 선정(토론회 5회) ▣ 전라북도 금융도시 추진위원회 출범('23.2.) <ul style="list-style-type: none"> 한국투자공사 이전 촉구 성명(2회/'23.3월,6월) 한국투자공사 전북 이전 법개정안 대표발의(양경숙의원, '23.5.) ▣ 금융 공공기관 이전 네트워크 활동 및 대내외 협력 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 공공기관 이전 공감대 확산을 위한 토론회 개최(연1회 이상) - 금융도시추진위원회(위원장:도지사) 회의 개최(2회 / '23.2월,6월) - 22대 총선 여야 공통 공약 반영(한국투자공사 및 7대 공제회 이전('24.4월) - 금융 공공기관 이전 등 금융도시 육성방안 논의 (혁신도시 대토론회 / '24.10) ▣ 금융 공공기관 유치를 위한 저변확대 지속 <ul style="list-style-type: none"> - 금융허브 발전전략 마련 등 금융산업 발전을 위한 추진과제 발굴(계속) - 금융인프라확충(금융타운 등) 및 디지털금융 육성 등 여건 강화(계속) ▣ 타깃 공공기관 이전 관련 국회 및 기관 건의활동 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 한국투자공사, 7대 공제회 관련 국회 건의(기업유치지원실장, '25.3월), 기관 면담('25.5월)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
26	국가식품클러스터 2단계 확장	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 국가식품클러스터 2단계 확장(302만㎡) 예비타당성 조사 신청 및 선정 건의 ▣ 국가식품클러스터 성과분석 및 발전방안 연구용역비 확보(5억원) <ul style="list-style-type: none"> - 국가식품클러스터 성과분석 및 발전방안 용역 착수보고회('23.3.) - 연구용역 중간보고회('23.6.) ▣ 국토부 신규 국가산단 후보지 2단계 확장 선정('23.3.) ▣ 연구용역 관계기관 워크숍('23.5.) ▣ 농식품부 1단계 성과분석 및 발전방안 타당성 용역 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 국가식품클러스터 성과분석 및 타당성 용역 킥오프 및 착수보고회('23.3.), 중간보고회('23.6.) - 농식품부 2단계 확장 정책결정 및 국클 활성화 방안 도출('23.8.) ▣ 국토부(LH) 국가식품클러스터 2단계 사전 타당성 용역 추진 중(23.11~'25.10) <ul style="list-style-type: none"> - 2단계 사전 타당성 용역 착수보고회('23.12) ▣ 예비 타당성 조사 신청을 위한 입주수요 조건완화 부처(행안부, 기재부) 건의(24.2) ▣ 입주수요 개선건의 부처(행안부, 기재부) 건의('24.4.2~3) ▣ 신규 국가산업단지 범정부 추진지원단 회의(국토부)('24.5.22) ▣ 국토도시실장 현장점검(국토부, 도, 익산시, LH)('24.6.12) ▣ 국토정책관 현장방문(국토부, 도, 익산시, LH)('24.7.23) ▣ 범정부 추진단 실무회의(국토부, 광역시도, 시군, LH)('24.9.26) ▣ 국토부 2단계 회의(국토부, 농식품부, 도, 익산시, LH)('24.10.29) ▣ 2단계 기본협약관련 관계기관 회의(도, 익산시)('24.11.8) ▣ 2단계 기본협약 추진(도, 익산시, LH/ '24.12.31) ▣ '25년 1차 및 2차 관계기관 협의회 추진(농식품부, 도, 익산, LH 등)(25.2.11, 3.19) ▣ '25년 2차 관계기관 협의회 추진(농식품부, 도, 익산, LH 등)(25.03.19) ▣ '25년 3차 관계기관 협의회 추진(농식품부, 도, 익산, LH 등)(25.05.15) ▣ '25년 4차 및 5차 관계기관 협의회 추진(농식품부, 도, 익산, LH 등)(25.7.11, 8.28)
27	정읍 농축산용 미생물 산업화 지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 농축산용 미생물 공유 인프라 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 공장형 개별 입주 공간 구축, 공동활용 장비 및 물류 보관창고 구축 ▣ 중앙재정투융자심사 신청('23.3.) ▣ 부지매입 완료('23.9.) 및 실시설계 추진('23.12.) ▣ 건축공사 입찰('24.8.) ▣ 기본실시설계 및 조달청 실시설계 적정성 검토 완료('24.10.) ▣ 건축공사 계약('24.12.~), ▣ 건축착공 및 추진('25.1.~) ▣ 장비 조달 입찰 및 업체 선정·계약('25.2.) ▣ 공유인프라 60개 기업대상 입주설명회('25.6.) ▣ 입주신청서 접수('25.8.~)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
28	순창 전통장류 지역미생물 실증단지 구축	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 지역별 전통장류 맞춤형 균주 및 생산공정 개발 - 전국 9개 권역 전통장류 표준생산모델 5건, 표준균주 27균주 확보 - 지역 전통장 복원 프리미엄 제품 10건 ▶ 농식품부 타당성 용역 추진(15억원/발효미생물산업진흥원/23.12~'24.5) ▶ 기재부, 국회에 국가예산 건의 추진('24.5~) ▶ '25년 국비 확보를 위한 국회방문('24.9.5, 예산정책협의회) ▶ '25년 국회 예산심의시 예산반영 건의('24.11.) ▶ '26년 신규사업 반영 위한 농식품부 방문 및 사업설명('25.2.) ▶ '26년 국회 예산심의시 예산반영 건의('25.9.) - 제안 사업명.사업내용 일부 수정(미생물기반 전통장류 제품표준화 지원)
30	애그테크 기반 연구	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 애그테크 기반 연구를 통한 품종 및 기술개발 : 21품종, 28기술 ▶ 첨단육종 기술 활용 품종개발('22년 2품종, '23년 신품종 4종) - ('22년) 파프리카 2품종(「미네르바 레드」, 「미네르바 골드」) - ('23년) 프리지아 2품종(스윗드림, 스노우보이즈) 국화(핑크윈드) 파프리카(레이골드) ▶ 스마트 정밀농업 기술개발('22년 2건, '23년 3건) - ('22년) 파프리카 하우스 이중차광 조건 설정, 차광에 의한 환경개선 효과 - ('23년) 파프리카 배양액 내 병원균 정보, 농업기상재해 조기경보 활용방법, 딸기 꽃눈분화 판별 기준 ▶ 환경친화 기술개발('22년 1건, '23년 3건) - ('22년) 콩 재배시 가축분퇴비 사용 토양탄소 증대 및 수량 확보 효과 - ('23년) 농산부산물 발생 추정량 및 바이오차 생산 잠재량, 바이오차 성분특성 정보 ▶ '24년 애그테크 기반 신규과제 발굴(5과제) 및 계획수립(31과제) - 신규과제: 상추 생육관리 모델(2과제), 수박 신품종 육종(2과제), 버섯 등 5과제 - 계획수립.선정: 첨단육종 7과제, 스마트정밀 12과제, 환경친화 10과제 ▶ 2024년 애그테크 기반 중간진도점검(3개 분야) 추진 : 31과제 - 중간점검: 스마트정밀(8.22.), 환경친화(8.20.), 첨단육종(8.29.) ▶ 2024년 애그테크 기반 결과평가심의(3개 분야) 추진 : 31과제 - 결과평가: 첨단육종(12. 10.), 스마트정밀(12. 12.), 환경친화(12. 16.) ▶ 스마트 정밀농업 기술개발('24년 육종 4품종, 기술개발 6건) - 첨단육종(장미 등 4품종) 스마트정밀관리기술 등 4건) 환경친화(방제효과 등 2건) ▶ 2025년 애그테크 기반 연구과제 설계심의 및 전문가 의견 수렴 : 31과제 - 대학, 농진청, 지역특화협회, 유관기관 등 전문가 의견 반영 계획서 발간 ▶ 2025년 애그테크 기반 연구사업 중간진도점검 추진 : 31과제 - 첨단육종(7과제), 스마트정밀(12과제), 환경친화(12과제)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
31	K-스마트팜 확대 조성 추진	<ul style="list-style-type: none"> ◦(목표) 시설원에 스마트팜 면적 확대(매년 12ha) ◦(목표) 자원순환형 에너지시설 지원(매년 4ha) ▣ ('22년) 스마트팜 시설보완(9ha), 청년창업 스마트팜(3ha), 자원순환형 스마트팜(4ha) 조성 ▣ ('23년) 스마트팜 시설보완(10ha), 청년창업 스마트팜(4ha), 자원순환형 스마트팜(5ha) 조성 ▣ ('24년) 스마트팜 시설보완(8ha), 청년창업 스마트팜(5.5ha), 자원순환형 스마트팜(9.8ha) 조성 - 세부사업별 사업대상자 선정 및 세부추진계획 승인('24.1~3월) - 시군 업무담당 및 유관기관 대상 간담회 추진(2회, '24. 5, 8월) - 추진상황 점검(4회, '24. 4, 7, 10, 12월) ▣ ('25년) 25년 사업대상자 선정 및 세부계획 승인 추진 중('25.10월~)
32	장수 임대형 스마트팜 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦(목표) 임대형 스마트팜 4ha 조성 ▣ (1단계) 기본계획 수립 및 승인, 실시설계, 중앙투자심사 승인 등 사전 행정절차 이행완료 - 실시설계 및 용역사 선정('22.) - 임대형 스마트팜 협의회 개최(4회), 사업 시행계획 승인 및 고시('23. 5월) - 실시설계 완료 및 기반조성 착공('23.7월) - 건축공사 시공사 선정 및 착공('24. 3월) - 지역특화 임대형스마트팜 공사 추진: ~ '25. 5월 - 임대형 스마트팜 4ha 조성 완료('24.12.) - 스마트팜 협의회 개최('25.3.~9 / 총 4회) ▣ (2단계) 부지확보 및 기본계획 수립('23.7.) - 도 투융자심사 승인('23. 8.) - 동부권발전사업 승인 및 예산반영('23.12.) - 실시설계 및 용역사 선정('24.3월) - 저탄소에너지 공동이용시설 지원 공모 선정('24.4월) - 시행계획 승인 및 고시('24.5월) - 실시설계 완료 및 토목공사 추진('24.7월~) - 추진상황 점검(4회, '24. 4, 7, 10, 12월) - 지열 공사 및 토목 공사 완료, 온실공사 착공('25.9월~)
33	부안 친환경 스마트 농업 확산	<ul style="list-style-type: none"> ◦(목표) 시설원에 스마트팜 4ha 조성(매년 1ha, '23년~'26년) ▣ '22년 스마트팜 환경(ICT기자재 지원) 1ha 조성 ▣ '23년 청년창업 스마트팜 패키지 지원사업 1개소 포함 1ha 조성 ▣ '24년 청년창업 스마트팜 패키지 지원사업 2개소 포함 1ha 조성 - 세부사업별 사업대상자 선정 및 세부추진계획 승인('24.1.~3월) - 시군 업무담당 및 유관기관 대상 간담회 추진(2회, '24. 5, 8월) - 추진상황 점검(4회, '24. 4, 7, 10, 12월) ▣ '25년 사업대상자 선정 및 세부계획 승인 : '25. 1~3월 ▣ '25년 스마트팜 환경(ICT기자재 지원) 1ha 대상자 선정 및 추진 중

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
34	순창 저탄소 친환경 생태농업 지원시설 구축	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 친환경농자재 생산시설 구축(1개소) ▣ 친환경농자재 시설 구축에 대한 설문조사 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 대상 : 친환경 농가, 친환경 자재업체, 담당공무원, 전문가 등(632명) ▣ 24년 도 균특예산 19억원 반영(농촌지도기반사업 시설 11억원 장비 8억원) ▣ '24년 사업 보조금교부결정 및 송금('24.3.5.) ▣ 도(농산유통과, 농업기술원), 순창군 현장 합동점검('24.4.2.) ▣ 기본 및 실시설계 용역(건축, 기계 분야) 추진('24.4.~8.4.) ▣ 공사계약(건축,토목, 기계, 전기) 추진('24.11.~) ▣ 공사계약(통신, 소방) 추진('24.12.~), ▣ 공사착공('24. 12.~) ▣ 동절기 공사중지('24.12월) 및 재착공('25.3월~)
35	임실 치즈 명소화	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 치즈산업 기반 확대 및 임실군 식품산업 고도화 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 식품 기업 2개소 추가 창업 - 상품화 시설 건립 1개소, 제품 개발 및 특허 등록 20건 - 임실N치즈 홍보마케팅 30회 ▣ 상품화 시설 건립공사 준공('23.) ▣ 임실N브랜드 홍보 및 마케팅 추진 36회(~'25.) ▣ 제품 개발 및 특허 등록 8건 ▣ 임실N치즈클러스터사업단 운영, 유가공업체 시설개선지원 등 사업추진('24.1~) ▣ 동부권 식품클러스터 육성 실무위원회('24.3./'25.3.27.) ▣ 유가공업체 시설 지원('24.2.~6.) ▣ 유가공업체 시설개선 지원(임실치즈농협 외 6개소)('24.2.~10.) ▣ 치즈이용식품 기업 창업 지원('24.10.) ▣ 유가공업체 시설개선 지원(3개소)('25.2.~10.)
36	섬진강 먹거리촌 구축 (섬진강 건강휴양단지 조성)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 식품 관련 그린바이오 미생물 소재 확보 및 미생물 DB 구축 ◦ (목표) 섬진강 유역을 중심으로 하는 건강 휴양도시 육성 및 콘텐츠 개발 <ul style="list-style-type: none"> - 국지도 55호선(순창~구림) 확장 추진 - 국도 24호선(순창~인계) 확장 : 제6차 국도·국지도 건설계획 반영 - 자연휴양림 시설 보완(4회), 먹거리촌 조성(1개소) ▣ 국지도 55호선(순창~구림 간 9km) 확장 기본설계 완료('22.6.~'23.6.) 및 실시설계 용역 추진('22.10.~'25.上), 총사업비 협의('25.上~) ▣ 제6차 국도 국지도 건설계획(26~30) 국도 24호선 4차선 확장 반영 건의(244) <ul style="list-style-type: none"> - 일괄예타 대상사업 미선정('25.1), 건설계획 반영 지속 건의 추진('25.2~) ▣ 자연휴양림 시설보완(4회, 데크 안전시설 등) 먹거리체험존 조성 공정률 75% ▣ 전통장류산업화 기술개발 사업타당성 조사용역 실시('24.1~) ▣ 국지도 55호선 건설공사 기재부 예산반영(2억원) ('24.8) ▣ 그린바이오 미생물공급망 구축사업 '25년 예산반영(3.5억원) ('24.12) ▣ 국지도 55호선 건설공사 기재부 총사업비 협의 중(익산청, '25.1~) ▣ 국지도 55호선 건설공사 인수인계 전 현장점검(도, '25.2~3) ▣ 국지도 55호선 건설공사 도로구역 변경결정 절차 이행(도, '25. 4~) ▣ 국지도 55호선 건설공사 총사업비 신속 협의 건의(기재부 등, '25. 5~9)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
38	치유농업 기반 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 치유농장·마을, 목적형 농장 조성 등 치유농업 시범사업 70개소 ◦ (목표) 치유농업 연구개발 및 보급, 교육 등 치유농업센터 구축 1개소 ◦ (목표) 치유농업 서비스 제공 및 확산 전문인력 양성 400명 <p> ▣ 치유농장 및 마을 등 기반 확대(22년 13개소 / 23년 18 / 24년 16 / 25년 9월 15) ▣ 치유농업 전문인력 양성(22년 90명 / 23년 86 / 24년 129 / 25년 9월 66) ▣ 치유농업 활용 기술개발 완료('22년 4건, '23년 10, '24년 10) ▣ 전복형 치유농업 확산을 위한 치유농업센터 구축 완료(부안/24.12.) </p>
39	진안 홍삼 세계화	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 진안 홍삼 홍보 시설 구축 및 판매시설 집적화 <ul style="list-style-type: none"> - 홍삼 플랫폼 센터 구축(카페, 콘텐츠 제작 공간 등) - 진안홍삼 홍보체험관 및 판매시설 조성 ◦ (목표) 전북자치도 관광자원과 연계한 진안 홍삼 홍보 50회 <p> ▣ 홍삼 플랫폼 센터, 홍보 체험관, 판매시설 구축 건축기획 용역 완료('23.12.) ▣ 진안홍삼 홍보 30회 실시('22년 6회, '23년 20회, '24년 4회) ▣ 유통·판매시설 기본 및 실시설계 용역추진('24.1~) ▣ 행정·유관기관 정례회의 개최(2회/ '24.3.~5.)) ▣ 명품홍삼 집적화단지 기본 구상안 및 시설배치 용역('24.4.~) ▣ 동부권 식품클러스터 육성 추진협의회 개최(1차, '24.7.) ▣ 동부권 식품클러스터 육성 추진협의회 개최(2차, '24.10.) ▣ 플랫폼센터, 홍보체험관, 판매시설 설계공모 및 실시설계('24.10.) ▣ 명품홍삼 집적화단지(전체) 중간용역 보고회('24.11.) ▣ 명품홍삼 집적화단지(판매시설) 설계공모('25.1.~3.) ▣ 명품홍삼 집적화단지(판매시설) 용역추진('25.3.~9.) ▣ K-홍삼 전시홍보체험관 사업구상 및 사업계획 수립 용역('25.4.~9.) </p>
40	순창 전통장류 브랜드 파워 강화	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 장담그기, 장문화학교 연 30회 운영(총 150회) ◦ (목표) 장독대 공원 조성('25년) ◦ (목표) 발효아카데미 연 2회 운영(총 10회) <p> ▣ 장담그기, 장문화 학교 25회 운영(22년 4회, 23년 60회, 24년 111회, 25년 1회) ▣ 장독대 공원 부지 확정 ▣ 발효아카데미 운영 11회 운영(22년 4회, 23년 4회, 24년 2회, 25년 1회) ▣ 발효테마파크 조경·경관개선 마스터플랜 수립용역 착수('24. 1~7.) ▣ 발효테마파크 야간경관 조성사업 완료('24. 1~10.) ▣ 장독대공원 조성 기본계획 수립 및 설계용역 공모('24. 8~11.) - 장독대공원 설계용역 착수('24. 12.), 건축설계 일시정지('25. 3~6.) </p>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
41	완주 로컬푸드 활성화 적극 지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 완주 로컬푸드 활성화 4년간('23년~'26년) 5.2억원 투자 <ul style="list-style-type: none"> - 농가조직화 2,100명, 생산자-소비자 교류활동 4회 ▣ ('23년 추진결과) <ul style="list-style-type: none"> - 기획생산 경쟁력 강화 : 농가조직화 14회 및 직원 역량강화 4회 - 관계시장 확대 : 홍보책자 5000부 제작, 관계시장 교류사업 31회, 안전성검사 18회 - 로컬푸드 조직화 : 순회수집차량 운영 2개소, 통합교육 416명(6회) - 생산소비 교류확대 : 모니터단 회의(6회), 농사체험(6회), 요리교실(6회), 식농·식생활 교육(9회, 196명) ▣ ('24년 추진결과) <ul style="list-style-type: none"> - 기획생산 경쟁력 강화 : 거버넌스 회의(2회), 로컬푸드 참여농가 역량강화 교육(5회), 저장농산물 간담회(2회), 친환경농가 간담회 (1회), 기획생산 직원 역량강화 (3회), 로컬푸드 참여농가 현장 견학(2회) - 관계시장 확대 : 운영주체 실무협의(3회), 현판제작(16개) 친환경농산물 안전성검사(115건) - 로컬푸드 조직화 : 순회수집차량 운영 2개소, 생산자 통합교육(5회) - 생산소비 교류확대 : 모니터단 발대식(1회), 모니터단 정기회의(2회), 생산-소비 네트워킹(1회), 식농교육 (9회) ▣ ('25년 추진결과) <ul style="list-style-type: none"> - 기획생산 경쟁력 강화 : 직원 역량강화(1회), 로컬푸드 참여농가 역량강화 교육(3회) - 관계시장 확대 : 소비자 교류활동(2회) - 로컬푸드 조직화 : 순회수집 차량 운영(2개소), 로컬푸드 운영주체 실무협의회(3회), 순회버스 운영(1개소), 로컬푸드 생산자 통합교육(5회) - 생산소비 교류확대 : 모니터단 발대식(1회), 모니터단 정기회의(2회), 직매장 모니터링(4회), 소비자 식생활교육(3회), 식농교육(4회)
42	전북 농수산물 가공식품 플랫폼 활성화	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 온라인 유통 혁신기업 협력사례 발굴 12건(23년~26년, 매년 3건) ◦ (목표) 온라인 몰 '전북생생장터' 입점업체 확대 60개점(23년~26년, 매년 15개점) ▣ ('24년 추진결과) <ul style="list-style-type: none"> - 온라인 유통기업과의 협력 프로모션 추진(18회) <ul style="list-style-type: none"> ※ 쿠팡 5회, 우체국몰 7회, 11번가 3회, G마켓 2회, 배민 1회, ssg 1회 - 생생장터 매출 확대 등을 위한 간담회(9회) 개최('24. 2.~) - 신규 6차산업 및 국가인증 생산기업 전용관 운영('24. 4.~) - 상반기 추진상황 점검('24. 7.) - 신규회원 확대 등을 위한 서울지하철(신분당선) 홍보('24. 9.~) - 입점업체 확대(42개) 및 매출액 452억원 달성(목표대비 180%) - 회원수 33,265명 확보(전년대비 132%) ▣ ('25년 추진상황) <ul style="list-style-type: none"> - 온라인 유통기업과의 협력 프로모션 추진계획수립('25.1) <ul style="list-style-type: none"> ※ 쿠팡 5회, 우체국몰 7회, 11번가 2회, G마켓 3회 - 생생장터 외부채널 프로모션 확대관련 협의('25.2) - 전북농협 협업 프로모션 업무 간담회('25.3) - 생생장터 입점기업 간담회('25.4) - 전북농협 협업 프로모션 업무 간담회 2차('25.4) - 농수산물 가공식품 플랫폼 활성화 관련 소통행정 간담회('25.5) - 상반기 추진상황 점검('25. 6.) - 전북농협 협업 프로모션 업무 간담회 3차('25.8.) - 신규 생생 프리미엄 전용관 운영추진('25.9.) - 전북농협 협업 프로모션 업무 간담회 4차('25.9.)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
43	해양치유 거점단지 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 해양치유산업 활성화 기반 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 해양치유 프로그램 발굴·운영, 해양치유지구 지정, 조례 제정 등 ▣ 해양치유 프로그램 발굴 및 운영('22회/4,816명) <ul style="list-style-type: none"> - ('22년) 7회, 192명, ('23년) 9회, 3,629명, ('24년) 6회, 995명 * 생명존중 해양체험(1회 / 45명), 해양치유프로그램(4회 / 50명) 및 고창갯벌 마린힐링 체험 교육(1회 / 900명) ▣ 국가예산 확보활동(1회) 및 치유거점단지 현지방문(1회) ▣ 해양치유자원 관리 및 활용 조례 제정('23.3.) ▣ 해양치유지구 지정 관련 자료 제출(해수부, '23.10.) ▣ 타 시도 해양치유센터 벤치마킹(태안)('23.11.) ▣ '24년 해양치유지구지정 및 공모추진 계획 논의(3회^{4~6월}, 해수부) ▣ '25년 해양치유지구 지정 및 국가예산 확보 등 건의(3회^{1~8월}, 해수부) ▣ '25년 군산시 해양치유 프로그램 발굴 및 운영(20회/1,500명, '25. 7.~8.) ▣ 해양치유 프로그램 운영사업 추진상황 점검 회의('25. 8. 11.)
44	국립해양문화시설 건립 기본구상	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 사전타당성 조사 완료('23년) ◦ (목표) 예비타당성 조사 통과('26년) ▣ 용역 추진을 위한 국가예산(3억원) 확보('23.12.) ▣ 해수부 기본구상 및 사전 타당성 조사 용역 착수('23.4.) ▣ 용역 착수보고회('23.4.13.) 및 자문회의('23.5.24.) ▣ 전문가 세미나 개최('23.11.24.) 및 용역 중간보고회('23.12.15.) * 선진지 벤치마킹 3회 추진(서천 국립해양생물자원관2, 서울 국립민속박물관1) ▣ 기본구상 및 사전 타당성 조사 용역 완료(해수부, '24.6.) ▣ 사업 부지 사용협의 및 부지매입 확보 마련(농식품부, '24.7.) * 새만금 기본계획 부합 및 「농어촌정비법」 등에 따라 매각절차 추진 후 부지 사용 가능 ▣ (과기부) 설립 타당성 사전평가 협의 추진(해수부, '24.10.) ▣ 해수부 예타 대상사업 신청(해수부→기재부, '24.11.) ▣ 기재부, 국회, 국무총리 면담 건의활동('24.11.~12.) ▣ 사업 대상부지 매입 절차 등 조세연 요구자료 제출 등('24.12.) ▣ 기재부 재정사업평가위원회 심의결과 미선정('25.1.) * 타 시도 유사시설과의 차별성 미비, 전시컨셉 구체화 및 시급성 부족 ▣ 보완 용역 과업내용 정비 및 해수부 협의 등('25.2.) ▣ 타당성 및 기본구상 보완용역 착수 및 보고회 개최('25.4.) ▣ 전문가 자문회의 및 전시컨셉 등 전면 변경('25.7.~8.)
45	내장산 트라이앵글 관광벨트 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 내장산~문화광장~용산호를 잇는 관광벨트 조성 <ul style="list-style-type: none"> - (문화광장) 문화·관광·레저시설 5개 사업 - (용산호) 복합힐링 공간 조성 3개 사업 ▣ (문화광장) 문화광장 수상레저 체험존, 순환열차 설치('22./2개소), 메인주차장 및 상가, 미디어아트관, 동화마을 조성중('23.~'26/3개소) ▣ (용산호) 미르샘 분수, 전망대 설치('22~'23/2개소) / 용산호 환경정비('24./1개소) ▣ '25년 상반기 사업 추진현황 점검(1회, '25.5.)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
47	치유관광산업 육성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 전북 '특화 치유관광지' 기반시설 5개소 구축 ◦ (목표) '전북 치유관광지' 30개 선정 : 매년 10개 선정('23.~'25년) ◦ (목표) 치유관광 상품 20개 개발 : 매년 5개 개발 ▣ 전북 치유(웰니스)관광 거점지역 육성 용역 추진('22.11.~'23.9.) ▣ 문체부 '웰니스·의료관광 융복합 클러스터' 공모사업 선정('23.3.) ▣ '23년 치유관광지 10개 선정 및 치유관광상품 8개 개발·운영 ▣ '24년 치유관광지 10개 선정('24.5.) ▣ 정읍시, 임실군 치유관광지 기반조성 재정투자심사 재의뢰('24.4~7.) ▣ 치유관광지 맞춤형 컨설팅 및 상품개발 추진('24.6.~12.) ▣ 치유관광상품 6개 상품운영('24.11.~12.) ▣ 치유관광지 4개 시군 설계용역 추진 및 정읍 대상지 변경 등 행정절차 이행 ('25.2.~12.) ▣ 2025 전북형 웰니스 관광지 10개 선정('25.3.~5.) ▣ 2025 전북 치유음식 콘테스트 추진('25.6.) ▣ 치유관광지 조성사업 현장 확인 및 추진사항 점검('25.7.) ▣ 정읍·순창 대상지 등 사업계획 변경 승인('25.8.) ▣ 정읍 치유관광지 조성사업 투자심사 이행 ('25.8.~9.) ▣ 전북형 웰니스관광지 맞춤형 컨설팅 및 상품 개발용역 중간보고회('25.9.)
48	전주-군산-익산 연계 역사·문화 관광벨트 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 역사문화관광벨트 조성을 위한 사업 추진(3개) - 전주 지역관광거점도시 육성, 군산 달빛마루관광자원화 사업, 익산 이색교도소 조성 ▣ 전주 지역관광거점도시사업 세부사업(22. 33개 완료/ '24.10. 일부사업 완료) - 전주전통술박물관 리모델링, 경기전 여행자 라운지, 동물원 관광안내소, 덕진공원 야간경관 조성, 한벽굴 경관개선 등 완료 - 전주역 통합관광센터 기존건물 철거완료 및 공사착수('24.4.) ▣ 군산 월명산 전망대 디자인(안) 확정('23.6.) 및 실시설계 재착수('23.11.) ▣ 익산 이색교도소 조성사업 설계용역 공모('24.3.) ▣ 전주역 통합관광센터 공사 추진('24.4~'25.12.) ▣ '25년 상반기 사업 추진현황 점검(1회, '25.5.) ▣ 익산 이색교도소 조성사업 실시설계용역 추진('24.4.~12.) ▣ 익산 이색교도소 조성사업 공사 추진('25.1.~)
51	갯벌 치유센터 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 갯벌 치유센터 조성 ▣ '23년 서해안권 발전지원사업 신규 반영(국토부) ▣ 지방재정 도 투자심사 완료('23.4.) ▣ 프로그램 개발 및 공공건축심의 용역 추진('23.9.~12.) ▣ 기본 및 실시설계용역 발주 및 착수('23.12.) ▣ 기본 및 실시설계 중간보고('24.7.) / 기본 및 실시설계 완료('24.12.) ▣ 공사 착공('24.12.) ▣ 토목 및 조경공사 계속추진, 건축공사 착공('26.7.)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
55	대학 연계 문화예술 콘텐츠 교육 플랫폼 구축	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 대학 연계 창의적 융합(인문+공학+디자인+예술) 인재양성 및 청년 인턴십/기업 연계 일자리 지원을 위한 교육 플랫폼 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 창의인재 거버넌스 구축('23년), 인재교육 500명 및 취업지원 200명('23년~'26년) ▶ 문체부 공모사업 '콘텐츠원캠퍼스 구성운영 지원사업' 선정 (국비 2.5억원, 도비 3억원 반영) ▶ K-컬처 공유협력대학 협의회 구성 MOU(호원대, 군산대, 원광대) 체결('23.8) ▶ 전북 창의인재육성 산·학·관 거버넌스 구축회의 개최('23.11.28) ▶ 콘텐츠원캠퍼스 성과전시회·토크콘서트 개최('23.12.13) ▶ '23년 인재교육 197명, 취업지원 58명 ▶ 문체부 공모사업 '콘텐츠원캠퍼스 구축운영 지원사업' 연속선정 (국비 2.4억원, 도비 2.4억원 반영) ▶ 2024 콘텐츠원캠퍼스 참여대학 사업운영 회의('24.5.22./6.20.) ▶ 2024 콘텐츠원캠퍼스 3개대학(호원대, 전주대, 우석대) 협약체결('24.7.) ▶ 글로벌대학30 지역상생사업 과제 확정 및 '25년 예산 확보('24.9.~'12) ▶ 산·학·관 협력 창의인재육성 네트워킹 추진('24.11.) ▶ 콘텐츠원캠퍼스 성과 전시 및 공연('24.12.) ▶ 글로벌대학30 우수탁협약체결 및 사업추진('25.3.) ▶ 공유협력대학 콘텐츠 융복합 프로젝트 지원사업 운영회의('25.4.) ▶ 전북대 글로벌대학30 지역상생사업 협약 체결('25.5.) ▶ 공유협력대학 융복합 콘텐츠 프로젝트 협약 체결('25.5.) ▶ 전북대 글로벌대학30 사업추진 관련 OT 및 업무회의('25.6.) ▶ 인문학+콘텐츠 융복합 프로젝트 실습 교육('25.6.~8.) ▶ 전문가 멘토링 도내 대학생 콘텐츠 개발 교육('25.8.)
56	폐공장 등 활용 문화적 도시재생 사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 폐산업시설 문화재생 공간 조성 3개소, 소규모 문화예술공간 구축 2개소 ▶ '22년 폐산업시설문화재생 공간 조성 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 전주 서브컬처 복합문화공간 조성(남부시장 구.원예공판장) ▶ '23년 소규모 문화예술공간 사업지 공모 선정(군산, 익산, 남원) <ul style="list-style-type: none"> - 도비 500백만원(군산 285, 익산 99, 남원 116) 지원 ▶ '23년 소규모 문화예술공간 만족도 조사(2회/1, 12월) ▶ '24년 폐교활용 유휴공간 문화재생공간 조성 1개소(군특 15억) 지원('23.9) <ul style="list-style-type: none"> - 임실(구. 관촌 상월분교) ▶ '24년 임실 폐교활용 유휴공간 문화재생공간 현지실사 등 점검('24.3) ▶ 사업 현장 지도점검(군산시·익산시)('24.6.) ▶ 소규모 문화예술공간 사업 추진현황 점검('24.8, 남원) ▶ 소규모 문화예술공간 사업 설계 및 예산 변경('24.8, 익산) ▶ 소규모 문화예술공간 사업추진현황 점검('24.9. 남원) ▶ 문화예술공간 사업 완료(2개소, '24.12.) ▶ '25년 소규모 문화예술공간 조성사업 공모추진('25.1.) ▶ '25년 소규모 문화예술공간 조성사업 추가공모('25.3.) ▶ '25년 소규모 문화예술공간 조성사업 사전심의 및 선정(진안, '25.5.)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
57	전북 글로벌 MICE 육성센터 설립·운영	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 전북 글로벌 MICE 육성센터 설립 ▣ 전북 글로벌 MICE 육성센터 설립 기본구상 용역 완료('22.12.~'23.5.) 착수보고('23.2.), 중간보고('23.4.), 용역 완료('23.5.) ▣ '23년 전북 MICE 전문인력 양성(30명) 추진계획 수립('22.12.) <ul style="list-style-type: none"> - '23년 전북 MICE 전문인력 운영기관(전북마이스발전협의회) 선정('23.4.) 및 교육생 모집·홍보('23.6.) - '23년 전북 마이스 전문인력 양성(50명) 참가자 모집('23.9.) ▣ 전북 마이스 지원협의회 개최 및 육성센터 설립 자문 청취('23.9.) ▣ 마이스 육성센터 설립 관련 전북문화관광재단 실무협의('23.9.) ▣ 전북 글로벌 마이스 육성센터 설립(안) 보고('23.9.) ▣ 재단내 육성센터 설립 위한 조직 신설 및 정원증원 예산과 협의('23.10.) ▣ 마이스 육성센터 운영 인건비 '24년 예산 반영(의회 전액삭감) ('23. 12.) ▣ 재단내 육성센터 설립 위한 조직신설 및 정원증원 협의 요청(예산과) (24. 3.) ▣ 육성센터 인건비(재단 출연금) 추경 확보 사전활동 전개(예산과, 의회) (24. 3.) ▣ 마이스 육성센터 인건비(재단 출연금) 추경 확보('24. 5.) ▣ 재단 정원 증원 및 조직 신설('24. 6.) ▣ '24년 지역 마이스 활성화 지원사업 국비 확보(132백만원, '24. 6.) ▣ 전북특별자치도 마이스 비전선포식 개최('24. 8.) ▣ '24년 전북 MICE 전문인력 양성(40명 / '24년 10월) ▣ '25년 지역 마이스 활성화 지원사업 국비 확보(105백만원, '25. 3.) ▣ '25년 전북 MICE 전문인력 양성(30명) 추진 <ul style="list-style-type: none"> - '25 전북 MICE 전문인력 교육생 모집·홍보('25. 4.) - '25년 전북 마이스 전문인력 양성(30명) 과정 운영('25. 6월~) ▣ '25년 지역유망 마이스 행사 육성 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 계획수립('25. 1~2월) →공고('25. 3월) →심사('25.4월)→사업운영 ▣ IMAX Frankfurt 2025 참가(독일 프랑크푸르트)('25.5.) ▣ 2025 세계관광산업컨퍼런스 개최('25. 6월, 해외10여개국 국제기구 인사 등 150여명) ▣ 「국제회의산업 육성 기본계획 수립(마이스산업 종합계획)」 연구용역 완료('25.7.) ▣ 2025 코리아 영마이스 앰배서더 총회' 솟품 챌린지 대상 수상('25. 8.) ▣ 2025 순창발효문화 국제관광포럼(지역유망마이스 사업)('25. 9.) ▣ 전주전시컨벤션센터 건립 기공식('25. 9.)
58	전주 월드컵 스포츠타운 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 전주 월드컵 스포츠 타운 조성('27년 개관) <ul style="list-style-type: none"> - 육상경기장, 야구장, 실내체육관 건립 시행 ▣ '23년 국가예산 확보(육상경기장 27억원, 야구장 30억원) ▣ 육상경기장, 야구장, 실내체육관 설계용역 완료('22.12.) ▣ 육상경기장 및 야구장 착공('23.6.) ▣ '24년 국가예산 확보(육상경기장 36억원, 야구장 30억원) ▣ 육상경기장 및 야구장 건립 공정률 10%('24.3.) ▣ 육상경기장 및 야구장 건립 공사착공('23.6.) ▣ 실내체육관 건립 공사착공('24.4.) ▣ 육상경기장 및 야구장, 실내체육관 건립('25.9., 공정률 72.24%)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
61	체육·스포츠 재정 대폭 확대로 전 도민 체육복지 실현	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 체육·스포츠 재정 대폭 확대 <ul style="list-style-type: none"> - ('22년) 100% → ('23년) 120% → ('24년) 130% → ('25년) 140% → ('26년) 150% ◦ (목표) 공공스포츠 인프라 공급 확대 : 30개소(매년 6개소) <ul style="list-style-type: none"> ▶ '23년 체육·스포츠 예산 확대(체육분야 예산 1,042억원 / 131.5%) ▶ 공공스포츠 시설 설립 완료 : '22년 7개소/'23년 6개소 ▶ '23년 국민체육센터(장애인형) 추가 선정 2개소(국비 70억원 확보) ▶ '24년 체육·스포츠 예산 확대(체육분야 예산 1,033억원 / 130.3%) ▶ '24년 국민체육센터 건립 추진 6개소 <ul style="list-style-type: none"> - 정읍 체육트레이닝센터('24.3), 남원 테니스장('24.4), 전주 에코시티 국민체육센터('24.6), 부안 벽산국민체육센터('24.6), 완주 반다비 체육센터('24.10), 완주 어린이 체육관('24.12.) ▶ '24년 1회 추경 예산확보(1,015.74억원) * 본예산대비 52억 증가 ▶ '24년 2회 추경 예산확보(1,033.25억원) * 1회추경대비 17.5억 증가 ▶ '25년 2회 추경 예산확보(1,090.12억원) * '22년 대비 137.5% ▶ '26년 국민체육센터 건립사업 공모 선정(2개소, 20억원 확보)
62	완주 종합 스포츠타운 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 축구장, 족구장, 농구장, 풋살장, 다목적체육관 건립 시행 <ul style="list-style-type: none"> ▶ '23년 다목적체육관 예산 확보(체육진흥시설 지원사업 8억원) ▶ 축구장 준공('22.8.), 족구장·농구장·풋살장 준공('23.6.) ▶ 다목적체육관 건축기획 용역 시행('23.8.) ▶ 다목적체육관 공공건축심의 및 건축기획용역 완료(~'24.4.) ▶ 다목적 체육관 공공건축 심의 완료('24.8.) ▶ 다목적 체육관 실시설계 용역 시행('24.10.~) ▶ 종합운동장 설계 용역 시행('25.5.~)
64	대규모 복합테마파크 유치 기반 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 복합테마파크 유치계획 수립 ◦ (목표) 민관지원단 구성·운영(6회) <ul style="list-style-type: none"> ▶ 새만금 대규모 테마파크 유치 구상 연구 완료(전북연, '22.6. ~'23.7.) ▶ '22년 새만금워킹그룹 관광진흥분과 회의(5회, '22.7. ~12.) ▶ 잼버리부지 활용방안 관계기관 회의('22.7.18.) ▶ 대규모 복합테마파크 선진지 방문(4회, '22.5.~'24.3.) ▶ '23년 새만금워킹그룹 관광진흥분과 회의(4회, '23.5.~9.) ▶ '23년 테마파크 관심투자 기업 면담·설명(2개사, 2회, '23.6.2.) ▶ 새만금 관광레저용지(테마파크 등) 투자설명회 개최('23.11.6.) ▶ 민관지원단 구성·운영 계획 수립('23.11.23.) <ul style="list-style-type: none"> - 민관지원단 운영비 '23년 예산(20백만원) 확보('22.12.) - 민관지원단 구성·운영 관련 전문가 자문(2회, '23.3.~8.) ▶ 민관지원단 운영 활성화를 위한 사전회의('23.11.24.) <ul style="list-style-type: none"> - 민관지원단 구성·운영(안) 협의(새만금개발청, '23.9.7.) ▶ 제1회 민관지원단 회의 개최 및 위원 위촉('23.12.22.) ▶ '24년 테마파크 등 관심투자 기업 면담·설명(2개사, 4회, '24.2.~5.) ▶ '24년 새만금워킹그룹 정책기획·관광분과 회의(3회, '24.3.~5.) ▶ 대규모 복합테마파크 벤치마킹 지원용역 착수('24.5.27.) ▶ 제2회 민관지원단 회의 개최('24.6.14.) ▶ 대규모 복합테마파크 글로벌 벤치마킹('24.6.25.~29.) ▶ 새만금 관광레저용지 투자유치 설명회 개최('24.10.24.) ▶ 제3회 민관지원단 회의 개최('24.12.19.) ▶ 새만금 관광레저용지 투자유치 설명회 개최('24.12.19.) ▶ 새만금 테마파크 유치 관련 백년포럼 개최('25.2.11.) ▶ 제4회 민관지원단 현장 회의 개최('25.6.26.)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
66	국제학교 유치	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 새만금 개발의 가속화 및 내실화를 위한 스마트 수변도시 내 새만금 국제학교 유치 ▣ 국제학교 유치 및 설립을 위한 업무협약의 및 특례발굴 등 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 유관기관 업무협약(도교육청, 새만금개발청·공사, 부안군)(‘23.2.~3.) - 유치관련 업무협약(美드렉셀대, IL텍사스 등)(‘23.2.) - 전북특별자치도 국제학교 관련 특례조항 발굴(‘23.2.~3.) - 국제학교 관련 전문가 토론회 등(‘23.2.24., 3.15.) - 국제학교 유치 관련 벤치마킹(인천/‘23.5.2.) - 전북특별자치도 국제학교 특례법안 협의(교육부/‘23.5.10., 6.13.) - 국제학교 추진상황 점검 및 업무간담(교육청, 새만금청·공사/‘23.5.26.) - 국제학교 설립·운영을 위한 특별법 신설 관련 협의(‘23.7.13., 9.12.) - 새만금 국제학교 설립 타당성조사 연구용역 완료(‘23.4.~12.) - 새만금 특례조문 검토 및 입법과제 부처대응 전문가 자문(‘24.03.26) - 새만금개발청 새만금사업법 개정 협의 추진(‘24.03.27) - 제22대 국회 새만금사업법 개정 발의(이원택의원)(‘24.6.5) - 새만금개발청 새만금사업법 개정건의 소통 간담(‘24.6.24) - 새만금사업법 개정안 국회 국토교통위 상정(‘24.8.21) - 새만금사업법 개정안 국회 국토교통위, 법사위 심의 의결(‘24.9., 11.) - 새만금사업법 개정(‘24.12.3.) - 외국교육기관 설립 추진 전북특별자치도-새만금개발공사 업무협약(‘25.3.6) - 외국교육기관 설립추진 실무협의체 구성 및 실무회의(‘25.3.27) - 국제학교 유치 관련 벤치마킹(부산/‘25.5.8.) - 외국교육기관 설립추진 교육청 업무협약(‘25.5.27.)
67	자율주행 스마트시범지구 구축	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 군산시 자율주행차 규제 특례를 통한 유상 운송서비스 실증에 필요한 자율주행 실증 및 서비스 제공 <ul style="list-style-type: none"> - 고군산군도 및 새만금방조제(‘24년), 군산2국가산업단지(‘25년) ▣ 자율주행차 시범운영지구 지정 고시(국토부, ‘22.6) ▣ 선유도 내 관광형 자율주행셔틀(4대) 서비스 제공(‘23.5.~11.) 및 새만금 방조제 하부 테스트베드 상용차 자율주행 실증(‘23.2.~) ▣ 군산 선유도 자율주행 전용도로 정비 및 정밀지도 구축(‘24.12.) ▣ 군산 선유도 내 관광형 자율주행셔틀(1대) 시범운영(‘24.12.) ▣ 군산 선유도 내 관광형 자율주행셔틀(1대) 서비스 제공(‘25.1.~6.)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
69	새만금 국제물류 허브항 개발	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 부두 2선석 완공('25년) 및 개장('26년) ◦ (목표) 새만금 신항 기본계획 변경 반영('25년) <ul style="list-style-type: none"> - 2030년까지 계획된 1단계 부두 6선석을 2028년까지 단축 - 민자로 계획된 부두 4선석과 배후부지의 기반시설을 재정사업으로 전환 ▣ 기본계획 변경 용역('22.6.~'25.2./해수부), 부두 2선석 추진(공정률 87%) <ul style="list-style-type: none"> - 진입도로 및 북측 방파호안 축조공사 완공('23.4.) - 새만금신항 북측진입도로 개설공사 착공('24.12.) - 새만금신항 무역항 지정 행정절차 이행('25.3~) ▣ 새만금신항 1-1단계 배후부지 재정사업 전환요청('24.1~) <ul style="list-style-type: none"> - 해수부, 기재부 등 국가예산 건의 활동('25년 정부반영액 1,382억원) ▣ 새만금신항의 항만 지정 관련 중앙항만정책심의회 개최('25.5.) <ul style="list-style-type: none"> * "새만금항"으로 통합 지정(군산항+(새만금) 신항) ▣ 새만금항 신항(5만톤급, 2선석) 부두운영사 선정 공고('25.8.)
68	자율주행 통합관제센터 구축	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 자율주행자동차 서비스 기술개발 및 사업 모델 고도화를 위한 통합관제센터 구축 ▣ 재정투자심사('22.8.~9.), '22년 도입장비 1종 구축('22.12.) ▣ 자율운송 실증 인프라 및 통합관제시스템 설계 완료('23.6.~12.) ▣ 자율운송 실증 통합관제센터 구축을 위한 행정절차 이행('24.4.~) ▣ 광역운송망 자율주행차 시범운영지구 지정·고시('24.6.) ▣ 자율운송 실증 도로인프라 구축 착수('24.8.) ▣ 군산국가2산단 경쟁력강화사업 환경영향평가 협의 완료('25.3.) ▣ 군산국가2산단 경쟁력강화사업 중앙산단심의위원회 심의('25.4.~) ▣ 자율운송 실증 통합관제센터 공사착공('25.10.~)
71	새만금~전주 고속도로 건설	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 사업준공 및 개통('25년) ▣ 토공 및 구조물 등 계속사업 추진('24년 공정률 83%) ▣ '25년 준공을 위한 '25년 국가예산 4,190억원 확보 ▣ 사업 적기 준공을 위한 관계기관 협의 및 건의(한국도로공사, '25.1.~) ▣ 공사 완료 및 개통('25. 12월말)
75	완주·전주 상생협력 추진 지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 완주군과 전주시의 상생협력 추진지원 및 향후 행정통합 추진 시 통합 비전 및 전략수립 등 ▣ 완주·전주 상생협력사업 발굴 및 협약 추진(13차) <ul style="list-style-type: none"> - '22년 2회, '23년 7회, '24년 4회(2, 3, 9, 10월)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
76	격포항 국가어항 확장 개발	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 격포항 내 부잔교·연결도교 설치(4개소) ◦ (목표) 해경 함정 전용부두 설치 착공 ▣ '25년 국가예산 확보(1차분 사업비 10억원) *'24년까지 기확보(25.5억원) <ul style="list-style-type: none"> - 격포항 확장 기본 및 실시설계 용역 착수(군산지방해수청, '23.6.) - 기본 및 실시설계 용역 착수보고회('23.8.29.) ▣ 격포항 개발 관련 공청회('24.1.26.) ▣ 기본 및 실시설계 용역 중간보고회('24.3.7.) ▣ 기본 및 실시설계 용역 추진상황 점검('24.9.) ▣ 기본 및 실시설계 용역 결과보고회('24.11.25.) ▣ 기본 및 실시설계 용역 완료('24.12.) ▣ 전체분 및 1차분 공사 발주('25.1.) 및 착공('25.6.18.)
77	금란도 개발계획 수립	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 금란도 개발을 위한 항만재개발 기본계획 수립 추진 ◦ (목표) 상생협의체 운영(8회) ▣ 기본구상 용역 완료('22.6.~'23.12./해수부) ▣ 지역 상생협의체 회의 6회('22년 3,7,12월/'23년 3,6,12월) ▣ 금란도 기본구상(토지이용계획) 건의('24.3.) ▣ 군산·서천 지역상생협의체 제2기 추천(도→해수부, '24.5.) ▣ 군산·서천 지역상생협의체 제2기 1차회의('24.6.) ▣ 군산·서천 지역상생협의체 제2기 추천('24.5.) ▣ 지역상생협의체 2차회의 사전협의(해수부,도,군산시 / '24.10.~11.) ▣ 군산·서천 지역상생협의체 제2기 2차회의('25.2.) ▣ 지역상생협의체 제2기 실무협의체 회의('25.5. 도·군산시 등) ▣ 지역상생협의체 제2기 실무협의체 2차회의(25.7. 해수부·전북도·충남도 등) ▣ 군산·서천 지역상생협의체 제2기 3차회의('25.8.)
79	명사십리지구 연안 정비	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 해양수산부 제3차 연안정비 기본계획 변경('24년) ◦ (목표) 기본계획 수립 용역('25년) ▣ 국민안심해안 시범사업 대상지 선정 및 계획수립('22.12.~'23.6.) ▣ 기본 및 실시설계 용역 원가심사 및 일상감사('23.7.~9.) ▣ 용역 발주 및 업체 수행능력평가 추진('23.10.~'24.2.) ▣ 용역업체 선정 및 착수('24.3.~) ▣ 명사십리지구 국민안심해안 사업추진 협의(해수부, '24.8.1.) ▣ 명사십리지구 국민안심해안 사업추진 2차협의(해수부, '24.10.11.) ▣ 사업계획 변경 협의 추진(해수부, '24.11.7.) ▣ 사업대상지 감정평가 및 토지보상 협의('24.12.~) ▣ 사업 기본계획 보완, 계획변경 협의(도·해수부, '25.3.10./3.13.) ▣ 사업추진 관련 협의(도·해수부·고창군·윤준병의원, '25.5.8.) ▣ 추진방향 최종 결정 및 행정절차 추진계획 협의 완료('25.8.28.)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
80	제2의 혁신도시 유치	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 전북도내 균형발전을 도모할 수 있는 제2의 혁신도시 조성을 위한 정부방침 결정 후 지속적인 공공기관 유치 활동 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 지속적인 공공기관 유치활동 추진 - 정부방침 결정 후 제2의 혁신도시 입지 타당성 논리 개발 ▣ 지속적인 공공기관 유치활동 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 국토부 장관('22.11.25./12.26.), 국토부 혁신도시발전부단장('23.4.11.) 균형위원장('23.6.22.) 면담 등 공공기관 전북도 추가이전 건의 - 공공기관 유치추진단 발족 및 제1~3차 회의('23.3.15./4.19./10.31.) - 공공기관 전북 추가이전을 위한 전라북도, 전북 여·야 국회의원 공동성명서 결의('23.3.17.) - 중점유치 대상기관 실·국별 유치 활동 전개('23.4./'23.10.) - 수도권 소재 150여개 공공기관, 부처 산하기관, 농수협 등 특수 민간기관 중 유치 대상 선정 및 전략 마련을 위한 용역 완료(~'23.6.) - 혁신도시 지정 신청 및 공공기관 이전 관련 특례 반영 활동('23.7.~10.) - 이전공공기관 및 종사자 지원 방안 연구용역('24.1.~5.) - 중점유치 대상기관 실·국별 유치 활동 전개('24.2./'24.5./'25.5.) - 공공기관 소재지 개정을 위한 입법 건의활동('24.9.) - 공공기관 이전 관련 메가비전 프로젝트 반영 추진('25.2.~) - 2차 공공기관 이전 관련 중앙부처 등 건의 활동('25.4.~) - 공공기관 유치추진단 유치 활동('25.5월,9월) 및 점검회의('25.9.24.)
82	지역소멸 대응 '인구·청년 지원연구센터' 설치	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 지역소멸 대응 '인구·청년 지원연구센터' 설치 ◦ (목표) 지역소멸 대응 선도사업 발굴 및 추진('24년~'26년, 연 1건) ▣ 센터 설치 및 운영 전북연구원 업무협약('22.8.) <ul style="list-style-type: none"> - 전북연 조직 및 정원 신설 등 정책기획관, 예산과 업무협약('22.8.~10.) ▣ '전북여성가족재단' 출범('23.9.) <ul style="list-style-type: none"> - '24년 전북연 출연 동의안(센터 설치 포함) 승인('23.10.) ▣ 전북연 조직개편, 인구·청년지원연구센터 개소('24.1.) ▣ 중장기 연구계획 수립(상반기) 및 개별 연구과제(6건)* 수행 <ul style="list-style-type: none"> * 기초과제 2, 미래전략 과제 1, 정책과제 2, 현안과제 1 등 ▣ 중장기 연구계획 수립 중간보고회('24.6.) ▣ 중장기 연구계획 수립 최종보고회('24.7.) ▣ 중장기 연구계획 수립 및 개별 연구과제(12건)* 수행(완료8**, 진행4) <ul style="list-style-type: none"> * TFT과제 2, 선도과제 2, 정책과제 3, 현안과제 3, 협약·수탁과제 2 등 ** 중장기 운영계획(TFT과제), 여성청년 유입방안 연구(정책과제), 청년활동 현황조사, 출입국관리법에 대한 효과적 활용방안(현안과제) 등 ▣ '25년도 연구과제(14건)* 발굴 및 수행 <ul style="list-style-type: none"> * 선도과제(기초,기획) 4, 도정과제(정책, 현안, TFT) 8, 협약·수탁 2

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
86	전라선 고속화 추진	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 전라선(익산~여수간) 고속화 예비타당성 조사 통과('26년) ▣ 예비타당성 조사대상사업 선정 방문(국토부, 기재부)건의('24.2~8.) ▣ 예비타당성 조사대상사업 신청/선정('24.8./'24.10) ▣ 예비타당성 조사 착수('24.12.) ▣ 예비타당성조사 개발계획 등 자료제출(도→KDI, '25.9.)
92	장애인 공공일자리 확대	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 재활, 돌봄, 자활 관련 공공일자리 창출 1,808명 - ('22) 1,678명, ('23) 1,737명, ('24) 1,755명, ('25) 1,773명, ('26) 1,808명 ▣ ('22년) 5개 분야 1,678명 - 일반형 513, 복지 764, 특화형 118, 지역맞춤형 273, 최종증 10 ▣ ('23년) 5개 분야 1,948명 - 일반형 575, 복지 825, 특화형 136, 지역맞춤형 336, 최종증 76 ▣ ('24년) 4개 분야 2,237명 - 일반형 588, 복지 1,007, 특화형 156, 지역맞춤형 340, 최종증 146 ▣ '24 최종증장애인 공공일자리 수행기관 간담회('24.6.) ▣ 최종증장애인 공공일자리 관련 단체 의견수렴('24.7.) ▣ 장애인 공공일자리 수행기관 현장방문('24.7.) ▣ 장애인일자리 수행기관 및 배치기관 점검(~'24.10.) ▣ 장애인일자리 참여자 만족도 조사('24.10.) ▣ 2025년 장애인일자리 사업설명회(보건복지부, '24.10.) ▣ 2025년 장애인일자리 수행기관 선정 및 참여자 선정('24.11.~12.) ▣ 2025년 장애인일자리 참여자 기본교육 ('25.1.) ▣ 장애인일자리 수행기관 및 배치기관 점검('25.5~'25.10.) ▣ 복지부 최종증장애인일자리사업 현장행정('25.9.3.)
95	청소년 스마트 체험 활성화	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 전라북도 청소년들에게 스마트 체험 활동을 제공하기 위해 교육청 등 관계기관 등과 협업 추진 - 교육청, 청소년 관련 기관 등과 협업체계 구축 - 청소년 스마트 체험 활동 및 각종 프로그램 운영 지원 ▣ 협업체계 구축·운영 및 체험 활성을 위한 교육청과 소통협의(2회) - 교육행정협의회('22.10.28., '23.4.28.) ▣ 전북교육청, 관계기관 등 협업체계 구축('23.7.) ▣ 청소년 스마트 체험활성화를 위한 간담(교육청/'23.8.) ▣ 청소년 스마트 체험활성화 방안 추진계획 수립('23.11.) ▣ '24년 도내 청소년 스마트체험 수요분석 완료('23.12.) ▣ '24년 도내 청소년 스마트체험 현장학습 코스* 개발 및 운영('24.3.~) *새만금 메타버스체험관, 신재생에너지테마파크, 새만금간척박물관 ※ '25년 9월 기준 스마트체험 예약현황 : 25개교 1,788명(4~12월)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
96	글로벌 청소년 인재 양성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 글로벌 청소년 리더 센터 건립('24년) ◦ (목표) 글로벌 마인드 함양을 위한 기초 소양 교육체험을 통해 글로벌 인재 양성 <ul style="list-style-type: none"> - 글로벌 청소년 인재 교육 : '24년~ ▣ 글로벌 청소년 리더센터 운영 기본계획 수립 용역 완료('23.6) ▣ 글로벌 청소년 리더센터 운영 기본계획 수립('24.5) ▣ 제1회 전북특별자치도 청소년박람회 추진('24.5.) ▣ 공사준공 및 준공신청서 제출(도→새만금청)('24.7) ▣ 공사준공 및 준공승인(새만금청→도)('24.9) ▣ 민간위탁관리위원회 심의 승인(리더센터 민간위탁 추진)('24.7) ▣ 청소년수련시설 설치 및 운영 조례안 입법예고('24.7.19~8.8) ▣ 청소년수련시설 설치 및 운영 조례 제정('24.9.) ▣ 리더센터 활용을 위한 간담회(도, 도의회, 교육청 관계자 등) ('24.10.) ▣ 국제교육원 활용을 위한 용역 추진(교육청 / '25.4.~8.) ▣ 제2회 전북특별자치도 청소년박람회 추진('25.5.)
98	어르신 맞춤형 복지 서비스 지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 노인일자리 시장형사업단 초기투자비 지원(20개소) ◦ (목표) 맞춤형 노인돌봄서비스 확대 : ('22년) 33천명 → ('26년) 37천명 ◦ (목표) 전라북도 장기요양요원 지원센터 운영 : 1개소 ▣ '23년 예산 514.5억원 확보 및 사업계획 수립추진 ▣ '24년 예산 560.3억원 확보 및 사업계획 수립추진 ▣ '25년 예산 572.9억원 확보 및 사업계획 수립추진 ▣ 노인일자리 신규 시장형사업단 지원('23년~'25년 15개소) ▣ 맞춤형 노인돌봄서비스 제공('22년 33,000명, '23년 36,000명) ▣ 맞춤형 노인돌봄서비스 제공('24년 37,173명, '25년 37,475명) ▣ '23년 장기요양요원지원센터 운영 및 사업계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> - '23년 장기요양요원지원센터 프로그램(힐링캠프 및 교육 등) 운영(800명) ▣ '24년 장기요양요원지원센터 운영 및 사업계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> - '23년 장기요양요원지원센터 프로그램(상담·교육캠페인 등) 운영(142건) ▣ '25년 장기요양요원지원센터 운영 및 사업계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> - '24년 장기요양요원지원센터 프로그램(상담·교육캠페인 등) 운영(117건) ▣ '24년 수행기관 사회복지사 역량강화교육 실시('24.6.~11.) ▣ '24년 장기요양요원지원사업 추진(상담·교육캠페인 등 117건 2,549명) ▣ '25년(9월) 장기요양요원지원사업 추진(상담·교육캠페인 등 197건 5,289명)
99	1인 가구 주거 안전 방문 지킴이 사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 1인가구 대상 스마트기술을 활용한 안심장비 설치 지원 3,000가구 <ul style="list-style-type: none"> - ('23년) 400가구, ('24년) 700가구, ('25년) 900가구, ('26년) 1,000가구 ▣ 전라북도 1인가구 지원 조례 제정('22.11.) ▣ '23년 1인가구 주거 안전 방문지킴이 지원계획 수립('23.1.) 및 주거안전 장비설치 지원(479가구) ▣ 시군 간담회('23.1./'23.3.) ▣ '24년 1인가구 주거 안전 방문지킴이 지원계획 수립('24.1.) 및 주거안전 장비설치 지원(766가구) ▣ '25년 9월말 지원실적 : 626가구

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
100	전북특별자치도 일생활 균형 지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 문화확산 : 조직문화개선을 위한 컨설팅 200건 <ul style="list-style-type: none"> - ('23년) 40건, ('24년) 50건, ('25년) 50건, ('26년) 60건 ◦ (목표) 기업지원 : 일·생활균형 선도 추진 기업 지원 45개사 <ul style="list-style-type: none"> - ('23년) 5개사, ('24년) 12개사, ('25년) 13개사, ('26년) 15개사 ▣ 일·생활 균형 지원 관련 정책연구과제 추진(전북연구원/~'23.5.) ▣ '23년 일·생활 균형 문화확산 지원사업계획 수립('23.3.) ▣ 일·생활 균형 우수 지자체 벤치마킹('23.4.) ▣ (23년 추진실적) 조직문화개선 컨설팅 추진 42건 / 선도추진 기업 지원 7개사 ▣ '24년 일생활균형 문화확산 협의체 구성 및 회의('24.4.) ▣ 일·생활 균형 제도 실천 우수기업 대상 워라벨 경진대회 추진('24.9.) ▣ '24년 조직문화개선 컨설팅 추진 50건 / 선도추진 기업지원 12개사('24.12) ▣ '25년 조직문화개선 컨설팅 추진 55건 / 선도추진 기업지원 9개사('25.9.)
102	전북 복지자원 통합관리 플랫폼 구축	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 전라북도 복지정보 및 자원 ONE-STOP 시스템 구축('23년) ◦ (목표) 플랫폼 이용자 확대 : ('24년) 1만명 → ('25년) 2만명 → ('26년) 4만명 ◦ (목표) 복지정보 사각지대 발굴 및 지원: ('24년) 50명 → ('25년) 100명 → ('26년) 150명 ▣ 복지자원 통합관리 플랫폼 구축 타당성 및 운영방안 연구용역 추진 ('22.11.~'23.5. 전북연구원) ▣ 플랫폼 관련 우수지역 벤치마킹(세종 등/'23.3.~4.) ▣ 플랫폼 구축 업체 선정('23.8~11.) ▣ 플랫폼 조기 구축 및 시범 운영('23.12.) ▣ 시군 및 민간기관 복지자원 조사('24. 1~2월) ▣ 사용자 및 전문가 의견 수렴, 반영('24. 2~3월) ▣ 플랫폼 시스템 보완('24. 5~6월) ▣ 플랫폼 본격 운영(개통식) 및 도민 홍보('24. 8.21.) ▣ 플랫폼 이용 실적 14,000명('24. 12.) ▣ 시군 및 민간기관 복지자원 현행화('25.1~3월) ▣ 전북인복지 주간 뉴스클리핑 서비스 시행('25.3월) ▣ 플랫폼 이용 실적 24,254명('25. 3. 31.) ▣ 전북인복지 도민 홍보단 운영('25.6월~) ▣ 플랫폼 이용 실적 35,192명('25. 6. 30.) ▣ 복지정보 사각지대 발굴 지원 91명('25.6.30.) ▣ 플랫폼 이용 실적 47,998명('25. 9. 30.) ▣ 복지정보 사각지대 발굴 지원 171명('25.9.30.)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
103	경로당 공용 와이파이 설치 및 운영비 개선	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 경로당 와이파이 설치 : 8개 시·군 경로당 3,209개소 ◦ (목표) 경로당 운영비 개선 : 6,358개소 → 6,857개소(전체 경로당으로 확대) ▣ 경로당 와이파이 설치 및 운영비 지원 지침 통보 및 사업비 교부('23.1.) ▣ 경로당 와이파이 설치('23년 1,490개소) ▣ 경로당 운영비 개선 지원 완료('22년 6,358개소, '23년 6,857개소) ▣ 경로당 와이파이 설치 및 운영비 지원 지침 통보 및 사업비 교부('24.1.) ▣ 경로당 와이파이 설치 수요조사('24년 2,664개소) ▣ 경로당 운영비 개선 지원 완료(22년 6,358개소, 23년 6,857개소, 24년 6,899개소) ▣ 경로당 와이파이 설치시설 현장 확인 및 점검 : ('24.6월) ▣ '25년 경로당 공용 와이파이 추가 설치 수요조사('24.8.) ▣ 경로당 공용 와이파이 설치 사업비 교부(3차, '24.9.) ▣ 경로당 와이파이 설치시설 현장 확인 및 점검('24.11.) ▣ 경로당 와이파이 설치 만족도 조사('24.12.) ▣ 경로당 와이파이 설치 및 운영비 지원 지침 통보 및 사업비 교부('25.2.) ▣ 경로당 와이파이 설치시설 현장 확인 및 점검('25.5.) ▣ '26년 경로당 공용 와이파이 추가 설치 수요조사('25.8.)
104	전북형 무상보육 실현 등 돌봄 확대	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 어린이집 차액보육료(만3~5세아) : 전액 지원('23년~'26년) ◦ (목표) 필요경비(만3~5세아) <ul style="list-style-type: none"> - 특별활동비, 특성화비용('23년~'26년), 차량운영비('24년~'26년) 현장학습비('25년~'26년), 필요경비 전액 지원('26년) ▣ 보건복지부 사회보장제도 신설협의 완료('22.10.) ▣ '23년 어린이집 차액보육료 및 필요경비 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 차액보육료 전액 지원(1인 월82천원) - 필요경비(특별활동비, 특성화비, 차량운영비 일부) 1인 월100천원 ▣ '24년 어린이집 차액보육료 및 필요경비 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 차액보육료 전액 지원(1인 월평균 95천원) - 필요경비(6개항목* 전체 지원) 1인 월138천원 ▣ '25년 어린이집 차액보육료 및 필요경비 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 차액보육료 전액 지원(1인 월평균 97천원) - 필요경비(6개항목* 전체 지원) 1인 월141천원 <p>*6개항목 : 특별활동비, 특성화비, 차량운영비, 현장학습비, 입학금, 행사비</p>

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
105	다문화가정 원스톱 지원 서비스 고도화	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 광역가족센터 설치 1개소 ◦ (목표) 국적취득 비용 지원 : 매년 150건 ▣ 타 시·도 사례 조사 및 세부계획안 마련('22.11.~12.) ▣ 국적취득 비용 지원 사회보장제도 신설 협의 및 추경예산 반영('23.2.~5.) ▣ '23년 국적취득 비용 지원 195건 ▣ '24년 국적취득 비용 지원 183건(3분기) ▣ 국비확보를 위한 가족센터 신규 운영기관 수요조사 제출(여가부, '24.3.25) 및 여가부 관계자 면담('24.4.23.) ▣ 센터 설치를 위한 타 시도 벤치마킹('24.8. / 경남, 서울, 경북) ▣ 전북특별자치도 가족센터 설치계획(안) 마련('24.8.) ▣ 국적취득 모바일 교재 「전북국적+」 개발 및 배포('24.10.) ▣ 전북특별자치도 가족센터 설치 및 운영 조례 제정('24.11.) ▣ '24년 국적취득 비용 지원 200건 ▣ 전북특별자치도 가족센터 설치 및 운영('25.1.) ▣ '25년 국적취득 비용 지원 197건(3분기)
106	용담호 탐방길 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 용담호 생태탐방로(L=10km) 조성('25년) ▣ 환경부 공모 선정('22.9.20.) ▣ 기본계획 수립용역 완료('23.9.) ▣ 실시설계 용역 추진('23.12.~'24.11.) - 국가생태탐방로 조성사업 집행점검('24.11.5.) ▣ 공사 착공 및 추진('24.12.~), '25년9월 공정률(55%)
107	옥정호 생태탐방 공간 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 옥정호 생태탐방로 및 편의시설 조성 - (1단계) 탐방로 7.3km 조성('23년)/ (2단계) 탐방로 10.3km 조성 추진 ▣ (1단계) 공정률 100% 추진 ▣ (2단계) 환경부 공모 선정('22.9.) 및 지방재정투자심사('23.2.), 실시설계 용역 발주 및 사업수행능력평가('23.9), 실시설계 용역 원가심사 완료('25.8.) - 국가생태탐방로 조성사업 집행점검('24.11.5.)
109	한국정원산업지원센터 시설 조성 지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 정원산업지원센터 시설 조성지원 - 정원식물지원센터(정원식물 생산, 관리 연구, 교육체험, 육묘, 야외포지, 양묘장 등) - 실내정원(체험, 교육, 실습을 위한 공간), 실외정원(다중이용시설 쉼과 힐링공간) ▣ 정원식물지원센터 조성 착공('23년) ▣ 정원식물지원센터내 실내정원 실시설계 추진('24.10.~'25.3월) ▣ 실내정원 조성공사 추진('25.4.~'25.11월)
110	군립자연휴양림과 지방정원 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 기본 및 실시설계 수립('24년), 조성계획 승인 및 사업착공('25년) ▣ 자연휴양림 조성 추진 현황 - 군립자연휴양림 지정 고시(산림청) ('23.4.) - 자연휴양림 조성계획 승인('24.12.) - 국유림 교환 완료 및 휴양림 조성 공사착공('25.8.) ▣ 지방정원 조성 추진 현황 - 지방정원 기본구상 및 타당성조사 용역('24.11.)-대상지 변경 - 지방정원 조성대상지 확정('25.4.) (죽도→운산 생태습지공원)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
111	산악트레킹 코스 개발 지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 역사와 문화가 있는 다양하고 쾌적한 산악트레킹 코스 개발 - 구봉산 등 4개 코스 80km 개발 ▣ 숲길 조성계획 용역 수립('23.2.~6.) ▣ '23~'24년 트레킹코스 40km 조성완료('24.12.) ▣ '25년 트레킹코스(대덕산~천반산) 23km 사업추진('25.4.~12.)
112	산림복지단지 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 산림휴양·치유·교육 등 다양한 산림복지서비스를 종합적으로 제공하는 산림복지단지 조성 - 실시계획 수립('23년), 실시계획 승인('24년), 조성공사('25년~'26년) ▣ 무주 향로산 산림복지단지 실시계획용역 추진('22.12.~'24.8.) ▣ 산림복지단지 내 개별시설 공법선정 및 특허 사용협의('24.3.) ▣ 향로산 자연휴양림 지정구역 변경 신청('24.7.) ▣ 산림복지단지 지방건설기술심의 보완('24.10.~'24.12.) ▣ 산림복지단지 실시계획 승인('24.12.) ▣ 산림청소관 국유림 매수완료 및 관계행정기관 협의요청('25.4.) - 소규모환경영향평가(방문2회), 매장유산보존대책 등 협의 ▣ 산림복지심의위원회 실시계획 승인 심사('25.7.) - 조건부 승인(식재 수종 일부 재검토, 차별화된 디자인 필요 등)
115	임실 관내 공공하수처리시설 증설	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 공공하수처리시설 증설 2개소(오수 '25년 착공, 임실 '26년 착공) ▣ 오수 공공하수처리시설 증설 : 설계용역 추진 중('23.6.~, 95%-9월기준) ▣ 임실 공공하수처리시설 증설 : 설계용역 착수('24.6.~, 65%-9월기준)
118	탄소중립 실현을 위한 생태 문명원 건립	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 왕궁 축사매입지 자연환경복원 사업을 통한 자연생태계 회복 및 생태문명 거점공간 조성 - 자연환경복원연구센터 역사체험공간, 생태계복원 자연형하천, 생태탐방방로, 생태빌리지 등 ▣ 환경부 국비사업 연계를 위한 자연환경복원 시범사업 선정('23.5.) ▣ 환경청, 전북도, 환경공단, 전문가 등 협의체 구성('23.7.) ▣ 자연환경복원사업 원활한 추진을 위한 환경청 선행용역 착수('23.8.) ▣ 협의체 현장답사('23. 9.) 및 환경청 선행용역 중간보고회('23.12.) ▣ 도 기본계획 수립용역 착수('24.4.) / 착수보고회 개최.5.17) ▣ 현장조사 결과 및 사업 구역계 결정 관련 환경부 협의('24. 8.) ▣ 환경청 기본구상 등 선행용역 완료('24.9.) ▣ 세부사업계획 및 사업비, 사유지 매입방안 등 환경부 협의('24.11.) ▣ 기본계획 및 예타 대응 환경부 협의(3회/'24.11., '25.1., '25.3.) ▣ 기본계획 및 세부사업계획, 예타 대응 환경부 협의('24. 9. ~ '25. 4.) ▣ 도 기본계획 수립용역 완료 및 예타 요구서 작성('25. 4. ~ 8.) ▣ 환경부, 예타대상사업 신청('25. 8. 29.)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
120	디지털 헬스케어 시범사업 추진	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 1차 의료기관 중심의 디지털 헬스케어 기반 비대면 진료 추진 ▣ '전라북도 비대면진료 추진 협의회' 발대식 및 심포지엄 개최('22.10.) ▣ 전라북도 디지털헬스케어 추진협의회 개최('23.1.) ▣ '23년 마이헬스웨이 구축 시범사업 참여 10개소 ▣ 마이헬스웨이 구축 시범사업 추진상황 등 간담('23.6.) ▣ 디지털헬스케어 시범사업 추진 간담('23.8.3./ 8.31.) ▣ 1차의료기관 건강정보고속도로 연계사업 참여 간담('23.10.19.) ▣ 의료취약지 원격협진 15개소, AI IoT 활용 어르신 건강관리 15개소, 보건소 모바일 헬스케어 활용 건강관리 15개소 추진('24.1.~) ▣ 정부 비대면진료 시범사업 지역보건의료기관 한시적 허용('24.4.3.) ▣ 전북특별자치도 디지털헬스케어 추진협의회 개최('24.6.3.) ▣ 전북특별자치도 디지털헬스케어 추진 위한 분과 운영('24.8.16.) ▣ 비대면 헬스케어 사업 활성화 위한 복지부 실무회의('24.10.15.) ▣ 전북특별자치도 디지털헬스케어 추진 위한 분과 회의('24.11.15.) ▣ 전북특별자치도 디지털헬스케어 추진협의회 개최('25.1.16.) ▣ 디지털헬스케어 활성화 방안 논의('25.9.30.)
121	전북형 노인결핵 검진 지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 결핵발병 건강고위험군(65세 이상 고연령층, 노인집단시설 등) 대상 노인결핵 검진 지원('23년~'25년 매년 1만명) ▣ 대한결핵협회 전북특별자치도지부 사업추진 간담회 ('22.8.1./ '23.10.5./ '24.1.12,8.29/ '25.1.15, 4.23, 7.10, 8.7, 9.16.) ▣ 시·군 업무 담당자 간담회 및 의견수렴('22.9.2.) ▣ '23년 노인결핵 검진사업 위·수탁 계약('23.1.19.) ▣ 전북형 노인결핵 검진사업 추진상황 점검(23316,1213 /24227,107,1023/25318) ▣ 전북형 노인결핵 검진 12,348명('23년), 11,207명('24년), 8,152명('25.9월) ▣ '24년 최종 사업 간담회 및 성과보고('24.12.)
123	전북형 난임부부 시술비 지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 난임환자의 경제적 부담완화를 위한 시술비 추가 지원 : 200건 <ul style="list-style-type: none"> - 체외수정(신선배아, 동결배아), 인공수정 시술비 중 일부 및 본인부담금 지원 - 1인 최대 2회 ▣ 보건복지부 사회보장제도 신설·협의 완료('22.11.) ▣ 전북형 난임 시술비 추가지원 방송 및 신문기사 보도('22.12./'23.12.) ▣ 「2023년 전북형 난임 시술비 추가 지원사업 안내」 시·군 시달('23.1.) ▣ 전북형 난임 시술비 지원 57건('23년)/51건('24년)/11건('25.1분기) ▣ 「2024년 전북형 난임 시술비 추가 지원사업 안내」 시·군 시달('23.12.) ▣ 전북형 난임 시술비 추가지원 실적 등 성과조사(7회,23.12/24.3,5,10/25.1,5,9)

관리번호	사업명	공약목표 및 추진상황
124	지역발전 생태계 조성을 위한 지역대학 경쟁력 제고	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 지·산·학 협력 강화와 지역특화인재 양성을 위한 지역인재 투자협약제도 추진, 거버넌스 및 교육협력 추진체계 구축 ▣ 전라북도 대학 상생발전 협의회 구성·운영('23.2.~) ▣ RIS 및 RISE 공모 추진 및 선정('23.2.~3.) ▣ 글로벌대학30 예비 지정 1개(전북대, '23.6.20.), ▣ 전북테크노파크 내 JB지·산학협력단(전라북도 RISE센터) 설립('23.7.4) ▣ 글로벌대학30 전북대 선정('23.11.13) ▣ '24년 글로벌대학30 등 대학상생 간담회('24.2.20) ▣ '24년 글로벌대학30 공모 신청(4개, '24.3.22) ▣ 전북특별자치도 라이즈 계획수립위원회 구성 및 전체회의('24.4.2) ▣ 글로벌대학 예비지정 대면평가 참여('24.4.9/4.11) ▣ 도·원광대, 본지정 준비 실무TF 구성 등 대응회의('24.4.23) ▣ 전북대 글로벌대학 지역상생사업 도 수요과제 발굴('24.4~6월) ▣ 전북특별자치도 라이즈계획수립위원회 총괄분과위 회의('24.5.16) ▣ 원광대 글로벌대학 본지정 대응 협업회의(도·익산시·원광대 등)(3회) ▣ 원광대 글로벌대학 육성을 위한 지역 국회의원 간담회('24.7.8) ▣ 라이즈 계획 수립 호남권 현장소통 간담회('24.8.23) ▣ 원광대+원광보건대(통합형) 글로벌대학 최종선정('24.8.28) ▣ 라이즈계획수립 위원회 총괄분과위원회 개최('24.8.30) ▣ 전북대 글로벌대학30 지역상생사업 예산편성('24.9.~12.) ▣ 원광대 글로벌대학30 도비 지원사업 과제 발굴('24.9.~12.) ▣ 라이즈 기본계획 의견수렴(대학, 산업계, 연구기관)('24.9.~12.) ▣ 라이즈계획수립을 위한 산업계 공청회('24.10.10) ▣ 라이즈계획수립을 위한 시군비 분담 관련 의견조회 실시('24.10.13) ▣ 라이즈계획 수립을 위한 도지사-총장 간담회('24.10.17) ▣ 라이즈 연계 늘봄학교 지원을 위한 시도 설명회 참석('24.10.25) ▣ 라이즈 계획수립을 위한 전문가, 대학, 산업계 공감포럼('24.10.31) ▣ 전북라이즈위원회 개최, 라이즈 기본계획 심의,의결('24.12.17) ▣ 전북라이즈위원회 개최, 라이즈 시행계획 심의,의결('25.2.18) ▣ 글로벌대학30 신규 공모 대응을 위한 도지사-총장간담('25.2.18) ▣ 전북대 글로벌대학 지역상생사업 사업관리위원회 개최('25.2.21) ▣ 전북대 글로벌대학 지역상생사업 추가사업발굴 협의('25.3.4) ▣ 원광대 글로벌대학 지역상생사업 추진방향 협력회의('25.3.4) ▣ 해외 우수 인재 유치를 위한 도·원광대-한국생산성본부-(주)참프레 업무협약('25.3.7) ▣ 전북 라이즈 사업 공고('25.3.7) ▣ 전북대, 원광대 글로벌대학 지역상생사업 발굴계획 통보('25.3.11) ▣ 전북 라이즈 사업 공고관련 설명회('25.3.13) ▣ 전북 라이즈 사업 평가위원회(25.4.2~5) 제3회 전북 라이즈 위원회 개최(25.4.15) ▣ 글로벌대학 대학상생사업 공고('25.5.14) ▣ '25 글로벌대학30 신규공모 예비지정(전주대·호원대)('25.5.27) ▣ 글로벌대학 대학상생사업 평가위원회('25.5.31) ▣ 글로벌대학 대응회의(도·전주대·호원대)('25.6.4) ▣ 글로벌대학 도·시군·대학 협력회의('25.6.18)

□ 정상추진 : 33개

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
5	캠퍼스 혁신파크 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 산학연 혁신허브(기업종합지원센터) 건립공사 추진 ▶ 캠퍼스 혁신파크 조성사업 추진상황 논의('23.12.) ▶ 캠퍼스 혁신파크 조성사업 개발구상, 사업타당성조사 용역 추진중('23.) ▶ 캠퍼스 혁신파크 조성사업 조성 관계기관 업무협의(6회, '24.2~12월) ▶ 캠퍼스 혁신파크 조성사업 조성사업 관련 관계자 간담회 및 업무협의(8회, '25.2~6월) ▶ 전주실내체육관 철거 공유재산 심의 완료('25. 8.)
15	첨단의료산업 기반 구축	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 제약산업 미래인력 양성센터 1개소 완공 ◦ (목표) 제약공정 장비 120종 구축 ▶ 센터 구축을 위한 설계 업체 선정 및 계약('23.9.), 설계 완료('24. 8.) ▶ '24년 한국보건산업진흥원 장비도입심의위원회 완료('24.8.) ▶ 센터 건축공사 계약 및 '24년 구축장비 계약 완료('24. 12.) ▶ '25년 한국보건산업진흥원 장비도입심의위원회 완료('25.8.) ▶ 감리용역 계약('25.3.), 터파기 공사 완료('25.4.), 골조공사 추진('25.5.~)
16	전북 화장품 시험검사 임상 센터 건립	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 화장품산업 육성을 위한 전북 화장품 시험검사 임상센터 건립 ▶ '24년 국가예산 확보(40억원) 및 도비 확보(12억원) ▶ 설계공모 시행 및 기본 및 실시설계 계약('23.6.), 설계 완료('24.3.) ▶ 시공업체 입찰조달('24.6.), 건축허가('24.8.), 건설공사 착공('24.8.) ▶ '25년 국비 삭감에 따른 사업기간 연장 논의('25.1.) ▶ 추진상황 점검회의 추진('25.4.~) ▶ 센터 건설공사 진행중(현 공정률 92%, '25.9.)
17	첨단 바이오소재 생태환경 기반 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 첨단 바이오소재 융합산업센터 구축 추진 ◦ (목표) 기술경영인 양성 일자리 창출 30명('27년) ▶ 융합산업 추진 용역 완료('22.12.~'23.7.) ▶ 바이오소재 산업 육성 기술협력 교류('23.4.) ▶ '24년 지방소멸대응기금 사업 선정(남원시비 5.66억원 확보) ▶ 남원시-남원시바이오산업연구원 사업대행 협약 체결('24.8.) ▶ 바이오 소재 융합센터 설계공모('24.11.~12.) ▶ 건축공사 기본 및 실시설계 용역 계약 및 착수('24.12.) ▶ 컨소시엄 기관(전자연, 한식연, 캠틱)과 역할 분담 및 사업 내용 협의('25.1.) ▶ 건축공사 용역사업 중간보고회 개최('25.6.) ▶ 건축공사 원가심사 의뢰('25.9.)
19	수소특화 국가산업단지 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 수소특화 국가산업단지 후보지 선정 ◦ (목표) 수소특화 국가산업단지 예비타당성 조사 통과 ◦ (목표) 수소특화 국가산업단지 계획 승인·지정 ▶ 수소특화 국가산업단지 후보지 종합평가('23.2.27.) 및 후보지 선정('23.3.15.) ▶ 사업시행자 선정('23.4.28.), 국가산단 성공추진 상생협약 체결('23.7.5.) ▶ 국토부 기업설명회 및 입주기업(2개) MOU 체결('23.11.28.) ▶ 사업타당성조사 용역 착수('23.12., LH) ▶ 기본협약 체결('24.6.) ▶ 예비타당성 대상 선정 통보('24.10.) 및 예타 신청(LH→기재부, '24.11) ▶ KDI 예비타당성 조사 현장방문('24.12.13.) ▶ KDI 예비타당성 조사 중간보고('25.5.30.) / 최종보고('25.8.21.)

관리번호	사업명	공약목표 및 추진상황
23	전북 국제금융센터(JIFC) 설립	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 전북 국제금융센터 건립('27년) ▣ 전북국제금융센터 건립(안) 확정 및 건립추진단 구성('22.11.) ▣ 전북국제금융센터 조성부지 매매계약 체결('23.3.) ▣ 전북국제금융센터 건립사업 기본구상 수립용역 완료('23.4.~'10.) ▣ 전북국제복합금융센터 개발 업무협약 체결('23.11.) ▣ 지역활성화 투자펀드 대상사업 선정[道 선정위원회] ('24.3.) ▣ 전북국제금융센터 건립 특수목적법인(SPC) 설립 ('24.8.) ▣ 전북국제금융센터 건립 관련기관 협의 및 사례조사 ('25.1.~9월)
24	새만금 첨단농업 클러스터 구축	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 새만금 청년농 스마트팜 창업특구 조성('26년) ◦ (목표) 지능형 농기계 실증단지 구축 추진(기본 및 실시설계, 착공 및 기반공사 완료) ▣ 임대형 스마트팜, 농업스타트업단지 공모 선정('23.1.~2.) - 임대형 스마트팜 실시설계('24.4.), 농업스타트업단지 공사준공(~'23.12.), 임대형 스마트팜 토목공사 시행사 선정 및 공사 착수('24.하반기) ▣ 지능형 농기계 실증단지 조성계획 수립(농식품부, '23.3.) ▣ 지능형 농기계 실증단지 구축 기본계획 수립용역 추진('23.12.~'24.4) ▣ 지반조사, 측량 및 소규모 환경영향평가 용역('24.3.) ▣ 지능형농기계 실증단지 구축사업 국비 확보(28.6억원) ▣ 임대형 스마트팜 기반공사 착공('25.5.) ▣ 지능형 농기계 실증단지 공공건축 심의('25.9.)
25	종자생명산업 혁신클러스터 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) (1단계) 종자산업진흥센터 첨단온실 구축, 입주기업 스마트 육종 설비(5개소) (2단계) 사업 타당성 용역 등 행정절차 추진 ▣ 김제공항부지 기본계획 폐지('22.11.), 실시계획 및 용도폐지 완료('23.1.) 김제공항 관리전환(국토부→농식품부) 본격 논의('23.4.~) ▣ 종자생명산업 혁신클러스터 사전 예비타당성 용역 착수('23.6.) - 종클 연계사업 종자가공처리센터 기본계획 수립 용역 추진 * 기본계획 용역 착수('23.3.)→ 중간보고('23.6.) → 건축설계 용역 착수('23.10.) ▣ 종자생명산업 혁신클러스터 농식품부 간담회 8회('24.2.~12.) ▣ 종자생명산업 혁신클러스터 사전 예타용역 완료('24.10.) ▣ 구 김제공항부지 매입 및 관리전환에 관한 협약 체결(김제시↔서향청)(24.11.) ▣ 종자산업 혁신클러스터 조성사업 대선공약 포함('25.5.) ▣ 「종자생명산업 혁신클러스터」예타 대상사업 신청(농식품부→기재부)(25. 8.)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
29	동물용의약품 클러스터 구축	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 동물용의약품 효능·안전성 평가센터 구축('23년) (목표) 동물용의약품 시제품 생산시설 구축('24.~'25년) (목표) 동물용의약품 임상시험 지원센터 구축 1개소 국가예산 확보 ▣ 동물용의약품 효능·안전성 평가센터 착공('22.6.), 준공('23.12.) ▣ 동물용의약품 시제품 생산시설 구축 국가예산 확보('22.12.), <ul style="list-style-type: none"> - 기본 및 실시설계 용역 계약 및 용역 추진('24.3.~11.) (연구용역 보고회 : '24. 3., '24.10.) - 기본 및 실시설계 용역 결과 제출('24.12.) - 기본 및 실시설계 용역 최종보고회('25.3.) - 건축시공사 조달청 발주의뢰('25.5.) - 건축시공사 선정('25.8.) / 건축공사 착공('25.9.) ▣ 동물용의약품 클러스터 관계기관 협의회('23.4, '24.3, '24.6, '24.9, '25.2, '25.8) ▣ 농식품부 동물용의약품 임상시험 지원센터 구축 타당성 조사 연구용역 완료('24.9)
49	전북 서해안권 새만금과 5개 시군 연계 해양관광벨트 추진	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 시군별 관광자원 사업 추진(14개) - 군산시(2개), 정읍시(3개), 김제시(2개), 고창군(3개), 부안군(4개) ▣ 기본구상 연구용역 착수보고('22.12.) 및 전문가 자문회의 개최('23.1.) 기본구상 연구용역 준공('23.9.) ▣ 공사추진 3개소, 실시설계용역 추진중 4개소(24.10월) ▣ '24 상.하반기 사업 추진현황 점검(2회, '24. 5, 10월) ▣ '25년 상반기 사업 추진현황 점검(1회, '25.5.) ▣ 공사추진 4개소, 실시설계용역 추진중 4개소(25.9월)
50	무주 구천동 33경 관광명소화	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 둘레길 및 자전거 도로 조성, 테마별 체험 콘텐츠 도입 ▣ 기본구상 및 타당성조사 용역 추진('23.6.~12.) ▣ 사업계획(안) 환경부(국립공원계획 변경) 협의 추진('24.7.~8.) ▣ '24 상.하반기 사업 추진현황 점검(2회, '24. 5, 10월) ▣ 실시설계용역 추진(~24.12월) ▣ '25년 상반기 사업 추진현황 점검(1회, '25.5.) ▣ 국립공원계획 변경(~'25.11.)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
52	K-문화지원센터 건립	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) K-문화지원센터 건립 ▣ K-문화지원센터 건립 기본구상 연구용역 추진('23.1.~12.) ▣ 문화콘텐츠 전문가 자문위원회 자문 2회('23.2~5.) ▣ '24년 K-문화지원센터 건립 국가예산 확보 <ul style="list-style-type: none"> - 국가예산 확보를 위한 문체부 6회, 국토부 2회 방문('23.2.~10.) - 국가예산 확보를 위한 기재부 10회, 의원실 6회 방문('23.6~12.) - K-문화지원센터 건립 타당성 연구용역 국비 2억원 확보('23.12.) ▣ 지원센터 건립 전북특별자치도 특례 반영('23.12.) ▣ '24년 K-문화지원센터 건립 타당성 연구용역 추진('24. 1.~12.) <ul style="list-style-type: none"> - K-문화지원센터 건립 타당성 연구용역 착수보고('24. 6.) - 타당성 조사 연구용역 문체부 업무협약('24.10.) - 문화지원센터 건립 타당성 연구용역 완료('24.12.) ▣ '25년 K-문화지원센터 건립 국가예산 확보 <ul style="list-style-type: none"> - 센터 건립 기본 및 실시설계 연구용역 국비 5억원 반영('24.9.) ▣ 문체부 타당성 용역 조사 결과 보고 및 관련 부서 협의 <ul style="list-style-type: none"> - 지방비 부담 가중으로 사업 규모 조정 방안 도출('25.1~6.) ▣ 사업규모 조정 기본계획 수립 용역 추진('25.7.~10.) ▣ 지방재정투자심사, 공유재산 관리계획 심의('25.7.~10.)
53	금마역사체험마을 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 타당성 용역('23년) 및 부지매입('24년~'25년) ◦ (목표) 기본 및 실시설계 용역(착수 : '25년 / 완료 : '26년) ◦ (목표) 공사 발주('26년) ▣ 익산 고도보존육성 기본계획 변경(문화재청 승인 '22.7.29, 변경 고시 ('22.8.24.) ▣ '23년 국비 2억원 확보, 기본구상 및 타당성 용역 완료('23.1.~7.) ▣ '24년 국비 29.75억원 확보('23.12.) ▣ 기본계획 용역 발주('24.1.) ▣ 토지 등 기본조사 용역(감정평가 완료, '24.2.) ▣ 토지 협의보상 추진 ('24.6.~) ▣ 지방토지수용위원회 재결(22필지)신청 ('25.3.) ▣ 지방토지수용위원회 재결 결과에 따른 토지 보상(22필지) 완료('25.6.) <ul style="list-style-type: none"> ※ 총53필지 중 28필지 토지보상 완료 ▣ 건축기본계획용역 완료 ('25.6.)
54	동서화합 육십령 가야이음터 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 기본 및 실시설계용역('24년) ◦ (목표) 육십령 가야 옛길 복원(1.45km) 1개소 착공('25년) ▣ '23년 사전행정절차 이행(지방재정 투자심사, 도유림 사용허가 등) ▣ 국가예산 확보 활동 추진('22년 6회, '23년 9회) ▣ '24년 예산 국비 3억원 확보('24.2.) ▣ 호남 동부내륙권 지역 정책간담회('24.6.20.) ▣ '25년 사업예산 확정(360백만원) ▣ 건축설계 공모 및 전시물 제작설치 용역 제안 평가('25.3.~) ▣ '25년 8월 건축설계용역 계약 <ul style="list-style-type: none"> - (주)길건축사사무소이엔지 ('25.8월~'26.1월) ▣ '26년 국비(25억) 예산(안)사전 통보('25.9월) ▣ 가야이음터 조성에 따른 기본 및 실시설계('26.1.~)

관리번호	사업명	공약목표 및 추진상황
59	국립 전북 유소년 스포츠 콤플렉스 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 기본구상 및 타당성 조사용역('23년) ◦ (목표) 유소년 스포츠 콤플렉스 건립 착공('25년) ▣ (남원시) 유소년 스포츠 콤플렉스 기본사업계획 수립('22.10.) ▣ '23년 국가예산 확보(타당성조사 및 설계용역비 5억원) <ul style="list-style-type: none"> - 타당성조사 및 기본계획 수립용역 추진('23.12.~'24.6.) ▣ '24년 국가예산 확보(실시설계용역비 20억원) ▣ 타당성 조사 및 기본계획수립 용역완료('24.8.) ▣ 도·남원시·대한체육회 유소년 스포츠 콤플렉스 업무협약('24.10.) ▣ 설계용역 착수('25.5.) * 착수보고회('25.5.22), 계획설계보고회('25.8.20) ▣ 문화체육관광부 체육국장 방문 사업건의('25.5.)
60	국제 태권도 사관학교 설립	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 타당성 조사('24년), 기본계획 수립('25년), 관련 법률 제·개정('26년) ◦ (목표) 조성공사 및 대학 설립 추진('27년 이후) ▣ '23년 국제 태권도 사관학교 건립을 위한 타당성 조사 용역비 3억원 반영 ▣ 타당성 조사 용역 추진('23.10.~'24.6.) ▣ 타당성 조사용역 문체부 중간보고('24.4) ▣ 기본 및 실시설계용역비 국가예산 반영 건의활동 추진(지속) ▣ 타당성조사 용역 완료(삼일회계법인, '24.6.) ▣ 문화체육관광부 장관(남원방문) 사업 건의('24.10.) ▣ 문화체육관광부 체육협력관·스포츠유산팀 방문 사업 건의('24.11.) ▣ '26년 정부예산(안) 반영(글로벌태권도인재양성센터 타당성조사비 2억원)
65	마리나 리조트 건설	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 마리나항만 사업계획 승인, 사업시행자 및 구역 지정(해수부) ▣ 사업계획 수립 용역('21.5.~'22.11.) <ul style="list-style-type: none"> - 사업계획 승인신청 해수부 사전협의(2회, '23.3., '23.6.) - 마리나항만 수정계획 용역 착수('23.4.) ▣ 민간사업자 제안서 제출(부안군, '23.7.) <ul style="list-style-type: none"> - 민간사업자 제안서 해양수산부 제출('23.8.) ▣ 민간사업자 제안서 승인 철회 요청('24.1.) ▣ 마리나 항만 운영 현황 제출(도→해수부 / '24.4.17.) ▣ 공항 마리나항만 사업계획 보고('24.4.24.) ▣ 공항마리나항만 사업계획서 제출(부안군→해수부, '24.8.) ▣ 해수부 해양환경정책관 건의 활동(부안군, 제안서 승인 / '24.12.4.) ▣ 사업계획서 타당성 검토 재의뢰(해수부→KMI / '25.1.) ▣ 사업제안서 승인 건의(도 → 해수부 / '25. 3. 25.) ▣ 사업제안서 검토결과 청취 및 협의(도, 부안군 ↔ 해수부 / '25. 4. 10.) ▣ 사업제안서 보완사항 설명 및 협의(부안군, 사업자 ↔ 해수부 / '25. 4. 15.) ▣ 사업제안서 타당성 검토결과 통보(해수부 → 도, 부안군, 사업자 / '25. 4. 29.) ▣ 사업제안서 보완 협의 및 제출(부안군, 사업자 → 해수부 / '25. 6.~7.) ▣ 공항 마리나항만 개발사업 추진 관련 소통회의(도, 부안군, 사업자 / '25. 6. 19.) ▣ 제132회 중앙항만정책심의회(마리나분과) 서면심의 의결서 제출 / '25. 6. 30.) ▣ 공항 마리나항만 개발사업 추진상황 보고(사업현장, 국조실 등 / '25. 7. 22.) ▣ 제2차 마리나항만 기본계획 수정계획(25-29)고시(해수부 고시 제2025-124호 / '25. 7. 25.) ▣ 사업제안서 최종 보완 제출(부안군 → 해수부 / '25. 8. 13.) ▣ 사업제안서 승인 건의(도 → 해수부 / '25. 8. 13.) ▣ 사업제안서 검토(해수부 / '25. 8. ~)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
70	새만금 국제공항 조기 착공	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 새만금국제공항 조기 착공('25년) ▣ 대형공사 입찰방법(턴키) 결정('22.9.), 건설공사 입찰 공고('23.3.) ▣ 기본설계서 제출 및 가격입찰('23.8., HJ중공업 등 3개사) <ul style="list-style-type: none"> ※ 새만금 SOC사업 적정성 검토연구 용역시행으로 행정절차 중단('23.11~'24.4.) ▣ 실시설계 적격자 선정 및 실시설계 착수(HJ중공업, '24. 7.) ▣ '24년 예산 집행률 제고를 위한 매립권 양수비(261억원) 신속집행 대응('24.7~) ▣ 환경영향평가 협의(전북환경청→서향청, '24.9.~) <ul style="list-style-type: none"> - 초안 제출('24.9.), 본안 제출 및 보완 요구('25.2./'25.4), 본안 보완서 제출 및 재보완 요구('25.6./'25.8.), 재보완 제출('25.9.) ▣ 새만금국제공항 활성화 협의회 구성('24.10. / 주관 전북자치도) ▣ 새만금국제공항 활성화 협의회 개최('24.11. / 8개 기관 참석) ▣ 사업의 정상 추진을 위한 '25년 국가예산 632억원 확보(12.10.) ▣ 교통영향평가, 재해영향평가 협의(서향청→국토부, 전북도, '24.10.~12.) <ul style="list-style-type: none"> - 교통영향평가 심의위원회 심의(11.27) 재해영향평가 심의위원회 심의(12.5) ▣ '25년 제1차 새만금국제공항 활성화 협의회 개최('25.1. / 6개 기관 참석) ▣ 환경영향평가서 본안 제출 및 신속협의 요청(서울항공청전북자치도→전북환경청, '25.2.) ▣ 매립면허권 양도·양수 협약 체결(서향청→농림부,새공, '25.3.13.) ▣ '25년 제2차 새만금국제공항 활성화 협의회 개최('25.8. / 5개 기관) ▣ 서울행정법원, 새만금국제공항 기본계획 "취소" 선고(1심, '25.9.11.) ▣ 국토부와 새만금국제공항 기본계획 취소소송 대응방안 협의('25.9.12.) <ul style="list-style-type: none"> - 집행정지 및 항소심 보조참가, 소송협의체 구성 등 협의 ▣ 도 새만금국제공항 건설지원 TF 구성 및 1차 회의 개최('25.9.18.) <ul style="list-style-type: none"> - 행정부지사 단장, 5개팀, 9개 실과 참여 ▣ 새만금국제공항 기본계획 취소소송 "항소" 제기(국토부, '25.9.22.) ▣ 건설교통국장, 새만금국제공항 기본계획 취소소송 관련 변호사 자문('25.9.22) ▣ 도 새만금국제공항 건설지원 TF 2차 회의개최('25.9.24.) ▣ 건설교통국장, 전북환경청장 면담('25.9.25.) ▣ 국토부 주관 새만금국제공항 소송협의체 1차 회의 개최('25.9.25.) <ul style="list-style-type: none"> - 국토부, 한국공항공사, 전북자치도, 선임변호사, 용역사 등 참석 ▣ 도 집행정지 및 항소심 응소계획(보조참가) 보고('25.9.26.)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
72	새만금항 인입철도 건설	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 새만금항 인입철도 건설사업 기본 및 실시설계 완료('27년) ▣ 기본계획 수립 추진 ▣ 「새만금 SOC사업 적정성 검토용역」 완료('24.6월) <ul style="list-style-type: none"> ※ 「새만금 SOC사업 적정성 검토용역」 결과에 따라 「신항만 건설 기본계획」(244월)에 인입철도 내용 반영확인 후 「인입철도 기본계획」 수립·고시를 위해 행정절차 지연 ▣ 새만금 SOC사업 관계기관 협의회* 참석·건의('24.8.) <ul style="list-style-type: none"> * 국토교통부, 새만금개발청, 전북자치도 ▣ 제3차 신항만건설 기본계획 수립 관련 관계기관 협의('24.12.) ▣ 새만금항 인입철도 기본계획의 신속한 수립·고시를 위한 건의('24.12.~) ▣ 새만금항 인입철도 기본계획 총사업비 협의('25.8.~)
73	새만금 남북3축 도로 건설	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 예비타당성 조사 통과 ▣ 사전타당성 조사용역비 예산 확보를 위한 건의 활동('23.) ▣ 간선도로망 구축방안 연구용역 시행(새만금청/'24.6.~12.) ▣ 새만금 남북 3축 도로 건설 신속 추진 건의(새만금청, '24.5./7./12.) ▣ 예비타당성조사 신청(새만금청→기재부, '24.11.) ※ 미선정('25.1.) ▣ 새만금 남북 3축 도로 건설 신속 추진 건의(새만금청, '25.1./5.) ▣ 예비타당성조사 면제 신청(새만금청, '25.8.)
83	국도13호선 위험구간 (장수~천천) 개선	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 예비타당성 조사 통과 및 제6차 국도·국지도 5개년 계획('26.~'30.) 반영 ▣ 제6차 국도·국지도 건설계획 수요조사 제출('23.4.~) ▣ 국가계획 반영 건의활동 추진(지속) ▣ 전북특별자치도→ 국회의원 및 국토부 도로국장 면담('24.7.~8.) ▣ 제6차 국도·국지도 건설계획 반영 건의(국회 및 국토부/ '24.8.~12.) ▣ 제6차 국도·국지도 건설계획 일괄예타 신청(국토부→기재부/ '24.12.) ▣ 제6차 국도·국지도 건설계획 일괄예타 대상사업 선정(기재부/ '25.1.) <ul style="list-style-type: none"> - (변경) 비예타 대상사업(500억 미만)으로 조정 추진 ▣ 비예타 대상사업 건설계획 반영 건의(국토부 등) 추진('25.3.~)
87	전주~김천간 동서횡단 철도 건설	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 전주~김천간 철도사업 예비타당성 조사 통과('26년) ▣ 예비타당성 조사대상사업 선정 방문(국토부, 기재부)건의('24.2.~) ▣ 예비타당성조사 신청(국토부→기재부/ '24.11.) ▣ 예비타당성조사 미선정(기재부 재정사업평가위 '25.1.) <ul style="list-style-type: none"> * 미선정 사유 : 5차 철도망 계획에 '신규사업' 반영 후 추진 ▣ 제5차 철도망 구축계획 수립 용역 중간보고('25.2월)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
88	국가식품클러스터 산업선 국가계획 반영	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 제5차('26.~'35.) 국가철도망 구축계획 반영('26년) ▣ 전북권 철도망 구축계획 수립용역 추진('23.7.~) <ul style="list-style-type: none"> - 신규사업반영을 위한 사업추진 논리 마련 등 국가계획 대응 ▣ 제5차 국가철도망 구축계획 신규사업 제출('24.2.) 및 반영 건의 20여회 <ul style="list-style-type: none"> - 전북권 철도망 구축을 위한 학술대회('24.3.27.) - 제5차 국가철도망 구축계획 반영 익산시·완주군 공동건의('24.7.) ▣ 제5차 철도망 구축계획 수립 용역 중간보고('25.2월)
89	부안~고창간 노을대교 조기 착공	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 해양관광권역 활성화 및 지역발전을 위해 신속한 사업 착공 ▣ 입찰방법을 변경(설계·시공 일괄입찰→설계·시공 분리, '23.1.), 기본설계 용역 완료('23.4.~12.), 기재부 총사업비 협의('23.1.~) <ul style="list-style-type: none"> - 해상교량에 따른 특수성으로 총사업비 증액이 필요함을 기재부에 설명 추진 ▣ '24년 예산 1억원 확보('24.1.) ▣ 총사업비 협의 신속 추진 건의('24.3.~) ▣ 전북특별자치도→ 국토부 도로국장 면담('24.7.) ▣ '25년 국가예산 기재부 요구액 200억원 반영('24.8.) ▣ 전략환경영향평가 협의 대책회의 및 사전설명 등('24.9.~10.) ▣ 전략환경영향평가(본안) 협의 완료('24.11.) ▣ 기본설계 총사업비 기재부 협의요청('24.12.) ▣ 기본설계 총사업비 기재부 협의완료('25.1.) ▣ 입찰안내서 국토부 본부 협의요청('25.2.) ▣ 입찰안내서 국토부 본부 협의완료('25.3.) ▣ 입찰안내서 익산청 내부 심의완료('25.4.) ▣ 기본설계 기술제안 입찰의뢰(익산청→조달청, '25.5.) ▣ 기본설계 기술제안 입찰공고(조달청, '25.7.) ▣ 대한건설협회 전북특별자치도회 방문 건의('25.7.,'25.8.) ▣ 사전심사 신청서 제출업체 없음(무응찰, '25.8.) ▣ 기본설계 기술제안 입찰 재공고(조달청, '25.8.) ▣ 사전심사 신청서 제출업체 없음(무응찰, '25.9.)
90	전주~대구간 고속도로 건설	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 전주~대구간 고속도로(무주~성주 구간) 예비타당성 조사 통과 ▣ 무주~성주 구간 사전타당성 조사용역 추진 건의('23.~) <ul style="list-style-type: none"> - 국토교통부 예산협의회 건의, 전북·경북 공동건의 추진 등 ▣ 전주~무주, 무주~성주 고속도로 건설 추진 건의('24.1.~) ▣ 경상북도 방문 공조 방안 협의('24.3.) ▣ 국토교통부 예산협의회 건의('24.4.) ▣ 제3차 고속도로 건설계획 반영 지속 건의('24.~) ▣ 제2차 국가도로망 종합계획 수정 착수(국토부, '25.3.) ▣ 무주~성주~대구 구간 조기 추진 방안 협의('25.6.) ▣ 무주~대구 고속도로 예비타당성조사 대상사업 신청('25.8.)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
91	장애인고용 교육연수원 건립	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 장애인고용 교육연수원 건립 ▣ 예정부지 건축물 철거·해체공사 완료('23.4.~11.) ▣ 건축공사 2동 완료(탈시설종합지원센터, 재활치료센터) <li style="padding-left: 20px;">* 자립생활주택 4동 공사 완료(~'23.12.) ▣ 기본계획 수립 및 공공건축기획 사전검토 심의(~'23.11.) ▣ 설계공모 및 용역 추진('24.3) ▣ 연수원 부지조성을 위한 토지 분할('24.6) ▣ 도·전주시·한국장애인고용공단·도교육청 1차 실무협의('24.6) ▣ 도·전주시·한국장애인고용공단·도교육청 2차 실무협의('24.7) ▣ 자립복지재단 기본재산 도 활용부지 소유권 이전 완료('24.10.) ▣ 도·전주시·한국장애인고용공단·도교육청 3차 실무협의('25.3) ▣ 도·전주시·한국장애인고용공단·도교육청 4차 실무협의('25.6) ▣ 도·한국장애인고용공단 공사일정 관련 업무협의('25.8)
94	시·군 청소년 복합문화센터 건립	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 청소년 복합문화센터 건립(기능 전환) 5개소 <li style="padding-left: 20px;">- ('24년) 2개소, ('25년) 3개소 ▣ 전북 청소년복합문화센터 건립방향 연구, 수요자 요구조사 계획 수립('23.) ▣ 전북 청소년복합문화센터 추진방향 연구용역('23.6.~10.) ▣ 청소년 관계기관 요구조사 및 의견수렴('23.8.~9.) ▣ 전북 청소년복합문화센터 건립 기본계획 수립('23.9.) ▣ 전북 청소년복합문화센터 건립 자문회의(12.15.) ▣ 익산시, 진안군 청소년복합문화센터 설계용역 실시('24.1분기) ▣ '25년 청소년복합문화센터 건립 시군(군산,김제) 선정('24.11.) ▣ 익산 설계용역 완료('24. 12.) ▣ 진안 설계용역 1차 완료 후 변동사항 반영 및 누락사항 검토중(24.12.~) ▣ '25년 청소년 복합문화센터 추가 수요조사('25.2월) ▣ 익산시, 진안군 청소년복합문화센터 완공('25.9월)
97	신혼부부·청년 임대주택 임대보증금 지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 신혼부부·청년 공공임대주택 임대보증금 지원 4,000가구('23년~'26년) <li style="padding-left: 20px;">- 지원금액 : 임대보증금 최대 5,000만원(계약금 자부담 제외) <li style="padding-left: 20px;">- 지원기간 : 최대 10년(신혼부부청년 6년, 1자녀 출산시 8년, 2자녀 이상 출산시 10년) ▣ 시·군 간담회 및 수요조사, 복지부 사회보장제도 신설 협의('22.10.~12.) ▣ 실태조사 및 「전라북도 저소득계층과 청년 및 신혼부부 주거 지원 조례」 개정(23.3) ▣ '24년 미혼청년까지 확대 지원('24.10.) ▣ 시행규칙개정 입법예고 및 사회보장제도 협의('25.2.) <li style="padding-left: 20px;">- 지원금액 확대 : (기존) 최대 2천만원 → (변경) 최대 5천만원 ▣ 신혼부부 및 청년 임대보증금 지원 963가구 <li style="padding-left: 20px;">- '23년 352가구, '24년 414가구, '25년(9월) 224가구 ▣ 민감임대 전세자금 대출이자까지 지원대상 확대 검토('25.9.)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
114	산림치유 인프라(지덕권 친환경 산림고원 조성) 확충	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 예비타당성 조사 대상사업 선정('26년) ▣ 예비타당성 대비 기본구상 수립 연구용역 완료('22.4.~'23.4.) <ul style="list-style-type: none"> - '24년 사전 타당성 용역비 국비 5억원 확보를 위해 지속적 건의 활동 추진 ▣ 지덕권 산지약용식물 특화산업화 방안연구 4억원 확보('23.9.) ▣ 지덕권 산림약용식물 특화산업화 연구 용역 완료 ('24.6.~'25.5.) <ul style="list-style-type: none"> - 연구용역 착수보고회('24.7월), 연구용역 최종보고회('25.5월) ▣ 지덕권 산림약용작물 특화단지 국립 조성 및 운영 건의(~'25.9.) <ul style="list-style-type: none"> - 국립 시설 조성을 위한 토지교환 관련 협의
116	무주군 친환경 에너지타운 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 타당성조사 용역('23년), 기본 및 실시설계 용역('24년), 조성공사 추진('25년~'26년) ▣ 공모 신청('22.6.) 및 환경부 현지실사('22.7.), 공모 선정('22.8.) ▣ 타당성조사 용역 완료('23.1.~9.) ▣ 사업수행능력평가 세부기준안 협의('24.2.~5.) ▣ 사업수행능력평가 세부기준안 지방건설기술심의('24.5.) ▣ 기본 및 실시설계 용역사업자 선정을 위한 사업수행능력평가 공고('24.7.) ▣ 사업수행능력평가 완료 후 적격심사(계약부서) 평가('24.8.) ▣ 기본 및 실시설계 용역 착수('24.9.~'25.12.) ▣ 기본 및 실시설계 용역 착수에 따른 주민설명회 개최('24.10.) ▣ 소규모 환경영향평가 용역 착수('25.2.)
117	만경강 친수공간 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 만경강 친수공간 조성사업 추진을 위해 국가계획(만경강 하천기본계획 등) 반영 ▣ 금강유역 수자원 관리계획 반영('23년, 환경부) ▣ 만경강 하천기본계획 반영 용역 추진 중(전북지방환경청, '23.1.~'25.12)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
119	국립공공보건의료대학원 설립	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 국립공공보건의료대학원 설립(법안 국회 통과) ▣ 국회 상임위 제2법안소위 법안심사('22.4.26.) 공청회 개최('22.12.9.) ▣ '23년도 국비 3.9억원(설계비 등) 확보 ▣ 국회 보건복지위 전체회의 통과('23.12.20.) ▣ 「공공의대법」 민주당 당론으로 채택(24.6.13), 박희승의원 대표 발의(24.7.2) ▣ 국회 상임위 제2법안소위 법안심사('24.8.23./11.20./'25.8.20.) ▣ 이재명 대통령 후보 전북자치도 공공의대 신설 공약 발표('25.5.24.) ▣ 법안 국회 통과를 위한 활동 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 국회 및 관련부처 건의 활동 총46회 ('24.1~'25.9.) - 제22대 전북 및 전북연고 국회의원 간담회('24.6.12.) - 제27차 민생토론회에서 대통령께 공공의대 설립 건의('24.7.18.) - 전북자치도 국회의원 보좌관 예산정책협의회('24.9.5.) - 더불어민주당.전북특별자치도 예산정책협의회('24.9.11.) - 도지사, 국민의힘 지역민생 예산정책협의회('24.9.25.) - 영호남 시도지사-국회의원 상생협력 간담('24.9.30.) - 국민의힘 전북도당 주요 현안 간담회('25.1.2.) - 경제부지사 보건복지부 제2차관 면담('25. 4. 26.) - 공공의대 설립 국정과제 반영 활동('25. 6. 19 ~ 8.12.) - 전북 국회의원 조찬 간담회('25.9.4.) - 더불어민주당.전북자치도 예산정책협의회('25. 9. 16.)
122	공공산후조리원 건립	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 출산·산후조리 취약지역 및 사각지대를 연계하는 산후조리 인프라 구축을 위한 공공산후조리원 건립 ▣ 공공산후조리원 건립·운영 연구용역 추진('22.10.~'23.3.) ▣ 공공산후조리원 건립 부지 남원시 공유재산 승인('22.11.) ▣ 공공산후조리원 설립 추진 방향 검토('23.3.) 및 도 투자심사 완료('23.3.) ▣ 공공산후조리원 건립 부지 매입 확보('23.4.) ▣ 지방소멸대응기금 확보를 위한 신청서 제출 및 대응('23.4.) ▣ 보건복지부 사회보장제도 신설·협약 완료('23.5.) ▣ 「전라북도 공공산후조리원 설치·운영 등에 관한 조례」 제정('23.5.8.) ▣ '24년 지방소멸대응기금 평가 대응('23.7.~9.) 9억원 확보('23.12.) ▣ '24년 지방소멸대응기금 예산 교부('24.3.) ▣ '25년 지방소멸대응기금 신청('24.4.) ▣ 공사착공('24.7.) ▣ '25년 지방소멸대응기금 예산확보(26억, '24.11.) ▣ 건축 골조 공사(26억, '25.1.~) ▣ 위탁운영 협약 체결 및 수탁기관 선정('25.6.)

□ 일부추진 : 5개

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
7	특수목적선 선진화단지 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦(목표) 해수부 항만기본계획 반영(25년), ◦(목표) 예비타당성 조사 통과(26년) ◦(목표) 단지조성, 기업입주기관 및 친환경기술 대응 시험연구센터 실시설계(27년) ◦(목표) 육상 및 해상공사, 친환경기술 대응 연구센터 시스템 발주(28년) ▣ 국가재정사업으로 반영될 수 있도록 중앙부처(해수부, 산업부) 설득 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 중앙부처 등(산업부, 해수부, 해군, 국회) 업무 협의(42회) - 국가선박 성능개량 등 수요예측 연구용역 발주(23.12.) - 국가선박 성능개량 등 수요예측 연구용역 결과 제출 및 설명(23.12~24.3) - 도지사-해수부 장관 면담(24.4), 이원택 국회의원실 방문 건의활동(24.7, 24.9) - 해수부 국정감사 정책질의 시 사업추진 건의(이원택 국회의원)(24.10.) - 현대중 군산조선소 재도약 TF 회의 시 사업추진 건의(25.4.)
13	새만금 SK데이터센터 조속 추진	<ul style="list-style-type: none"> ◦(목표) SK 데이터센터 유치 지원(15회), ◦(목표) SK 창업클러스터 착공(26년) ▣ '22년 데이터센터 유치 지원을 위한 실무협의체 운영(3회) ▣ '23년 데이터센터 유치 지원을 위한 워킹그룹 운영(2회) 및 관련기관 동향 파악 및 포럼 참석 등(23.4.~6.) ▣ 데이터센터 유치 지원을 위한 SK-해저케이블 관계자 업무협의(23.8.) ▣ 데이터센터 지역 분산을 위한 산업부-관계부처 회의 참석(23.9.) ▣ 데이터센터 유치 지원을 위한 SK 관계자 업무협의(24.4.) ▣ 데이터센터 추진 관련 SK새만금청 사업추진 방향 공유 및 협의(24.10.) ▣ 데이터센터 유치 관련 도-새만금청 업무협의(25.5.28.) ▣ SK 협약변경 요청 관련 대응방안 추가 논의(새만금청-도-군산시)(25.6.17.) ▣ 육양국 설치 관련 실무 협의(도-SK이노베이션 등)(25.7.)
46	지리산권 관광특구단지 추진	<ul style="list-style-type: none"> ◦(목표) 지리산권 특별지방자치단체 설치를 위한 규약 승인 및 출범 <ul style="list-style-type: none"> - (특별지자체) 6개 시·군 간 협의를 통해 특별지방자치단체 규약 승인 및 설치 - (관광특구) 지리산권 대상지역(6개 시·군) 관광특구 타당성 조사 완료 및 진흥계획 수립 추진 ▣ 지리산권관광개발조합 방문 협의(22.7.), 지리산권 특별자치단체 설치를 위한 5개 지자체장(남원, 구례, 산청, 함양, 하동) 협약(22.10.) ▣ 특자체 순회 설명회 및 협의(22.10.~12.), 지리산권관광개발조합 추진단 구성 및 사무발굴 등 특자체 출범 준비 <ul style="list-style-type: none"> - 특자체 설립 기본계획 수립용역(23.6~24.12.) ▣ 주관 지자체 선정 및 추진단 구성·사무발굴 추진(26.~)
84	전주 시외버스터미널 현대화 사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦(목표) 노후화된 전주시외버스 터미널의 현대화 사업 건축설계 추진 ▣ 터미널 신축에 따른 재정지원 방안 검토 및 현대화 사업 추진을 위한 도, 전주시, 터미널 사업주 간 간담회 추진(24.12.16./25.4.16)
85	군산 고속·시외버스터미널 현대화 사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦(목표) 고속·시외버스터미널 현대화 사업 기본계획 수립(25년) ▣ 사업시행자 및 민간사업자와 터미널 운영방안에 대한 지속 협의(25.7.23)

□ 폐기 : 1개

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
113	백두대간 산림정원 조성 지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 행정절차 완료('25년) : 환경영향성 평가, 공유재산 심의 ◦ (목표) 기본 및 실시설계 착수('26년) ▣ 대상지 확보를 위한 공유재산(도유림↔군유림) 교환 계획 수립 ▣ 공유재산 일부대상지(산154-93) 임야 교환 완료('24.1.18.) ▣ 기본 및 실시설계 용역 조달계약 요청('24.3.) ▣ 기본 및 실시설계 용역 사업자 선정('24.3~`24.10.) ▣ 육십령 지방정원 기본 및 실시설계용역 추진('24.10.~`25.9.) ▣ 대상지 변경 및 사업중단 검토(25.3.~4), 지방정원 사업 중단 결정(25.5.) - 관광객수 감소 등 지역경제 활성화 불투명, 조성비 증액 및 유지관리로 인한 재정부담, 전국 지방정원 조성에 차별화 어려움 등으로 사업 중단(장수군)

V

향후 관리계획

□ 공약 목표


- (완료도 상향) 매년 이행 완료된 공약의 비율 지속적 상향
- 연도별 완료 가능한 목표를 명확히 설정하여 목표 달성

연도별	2023	2024	2025	2026	2027 이후
달성 목표	20%	50%	80%	90%	100%

□ 관리체계

- (실천계획 수립) 공약의 타당성, 실현 가능성, 자원확보 방안 등 종합검토
- (실천계획 이행) 실천계획에 따라 이행실적 관리(분기별)
- (실천계획 변경) 정책환경 변화 등 불가피한 사유 발생 시 변경
- (외부평가 대응) 평가기관의 평가매뉴얼에 맞춰 평가준비 및 대응(연 1회)

< 공약사업 관리 흐름도 >

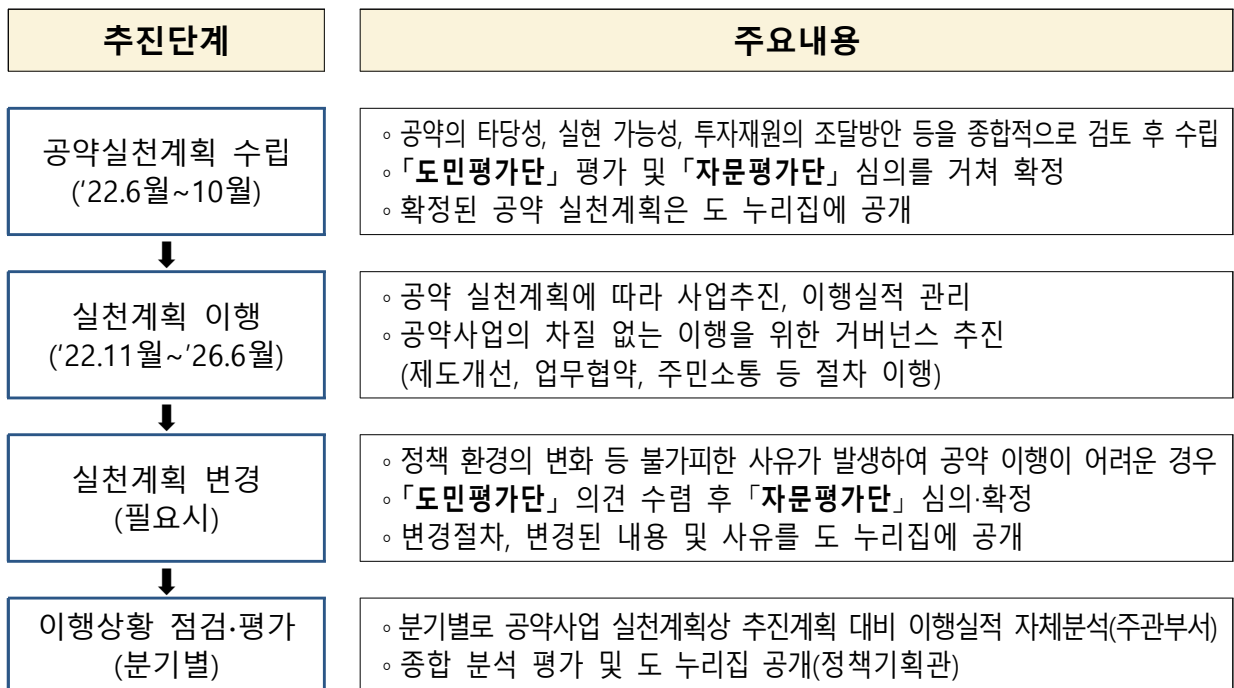

□ 금후계획

- 공약사업 추진상황 점검결과(9월말) 도 누리집 공개 : ’25.11월 중
- ’25년 4분기 공약사업 추진상황 점검 : ’26. 1월

새로운전북 특별한기회
